



Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020.

**CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS**

**9ª MEDIÇÃO – 6ª ETAPA INTERMEDIÁRIA**

**PERÍODO DE 25/09/2020 a 09/10/2020**

A:

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional - SUBCTO

Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

Ref.: “Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”.

Processo Nº 06/300.120/2020 – Contrato Nº 024/2020.

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “**Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **Nota Fiscal nº 0007070/2020**, no valor de **R\$ 1.587.122,75 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos)**, assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **9ª Medição de Serviços - 6ª Etapa Intermediária, executados no período de 25/09/2020 à 09/10/2020**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta.

Insta salientar que os valores ora faturados baseiam-se exclusivamente nos levantamentos, nas memórias de cálculos e boletim de medição elaboradas pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA “P” N.º 034 DE 08 DE MAIO DE 2020, publicada no DORIO de 12 de maio de 2020.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  
[Signature]

DS  
[Signature]

DS  
[Signature]



Nesse tocante, a empresa está procedendo ao faturamento dos quantitativos e valores apurados unilateralmente pela comissão, assim como nas medições anteriores, em que manifestamos a discordância de quantitativos e critérios adotados mas, que por única e exclusivamente devido ao cenário de total insustentabilidade financeira da empresa e do contrato, ressaltando expressamente o seu direito ao recebimento dos quantitativos reais executados e reiterando a sua discordância com alguns critérios adotados, dentre eles a apropriação de itens não medidos e outros medidos aquém do executado ou apurados de divergente da unidade contratual e das diretrizes normativas. Segue em ANEXO 2, demonstrativo das diferenças de apuração entre a medição elaborada pela Comissão e pela Dimensional e, exemplificativamente, algumas observações abaixo:

1. Não conseguimos entender as quantidades medidas dos equipamentos e mão de obra remunerados por disponibilidade, não sendo as quantidades medidas compatíveis com nossas apropriações. Salientamos que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional, que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
2. Na memória de cálculo, constam itens de equipamentos com medição de horas produtivas e improdutivas por estimativa percentual explícita, sendo tal prática, não aderente às diretrizes dos órgãos de controle. Salientamos mais uma vez, que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
3. A memória de cálculo da medição enviada pela Comissão não apresenta a área topográfica medida de fresagem. Uma vez, que a memória da Comissão apresentou informações distintas das enviadas pela Dimensional, principalmente no serviço de fresagem, faz-se necessário o encaminhamento do croqui topográfico com as áreas consideradas, de forma a trazer confiabilidade nos valores medidos. Segue abaixo, quadro comparativo das áreas apropriadas de pavimentação e volumes de fresagem pela Comissão e pela Dimensional:

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  
A

DS  
G

DS  
M

LOGRADOURO	1ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	490,20	787,72	727,14	10.134,38	10.134,38	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	193,90	-	-	-	-	3.995,87	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>684,10</b>	<b>787,72</b>	<b>727,14</b>	<b>10.134,38</b>	<b>10.134,38</b>	<b>3.995,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>684,10</b>	<b>787,72</b>	<b>727,14</b>	<b>10.134,38</b>	<b>10.134,38</b>	<b>3.995,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LOGRADOURO	2ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	707,83	492,93	952,46	14.739,05	14.739,05	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	411,45	754,85	411,45	-	-	8.850,00	12.845,87	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	355,96	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.119,28</b>	<b>1.603,74</b>	<b>1.363,91</b>	<b>14.739,05</b>	<b>14.739,05</b>	<b>8.850,00</b>	<b>12.845,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>1.803,38</b>	<b>2.391,46</b>	<b>2.091,05</b>	<b>24.873,43</b>	<b>24.873,43</b>	<b>12.845,87</b>	<b>12.845,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LOGRADOURO	3ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	556,51	279,78	257,97	10.967,11	10.967,11	4.810,41	4.810,41	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	532,84	85,76	130,43	-	-	15.608,83	15.608,83	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	465,24	40,44	-	-	-	9.304,70	9.304,70	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.554,59</b>	<b>405,98</b>	<b>388,40</b>	<b>10.967,11</b>	<b>10.967,11</b>	<b>29.723,94</b>	<b>29.723,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>3.357,97</b>	<b>2.797,44</b>	<b>2.479,45</b>	<b>35.840,54</b>	<b>35.840,54</b>	<b>42.569,81</b>	<b>42.569,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LOGRADOURO	4ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	14.179,52	14.179,52	24.873,43	24.873,43
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	13,11	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	276,87	261,45	244,92	-	-	-	-	3.983,73	3.983,73
RUA CMDT. RUBENS SILVA	34,93	65,87	34,78	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>324,91</b>	<b>327,31</b>	<b>279,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.179,52</b>	<b>14.179,52</b>	<b>28.857,16</b>	<b>28.857,16</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>3.682,88</b>	<b>3.124,75</b>	<b>2.759,15</b>	<b>35.840,54</b>	<b>35.840,54</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>28.857,16</b>	<b>28.857,16</b>

LOGRADOURO	5ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	293,28	-	-	-	-	1.894,04	1.894,04
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	1.534,68	1.534,68
ESTRADA DO GABINAL	630,95	710,90	626,47	1.053,75	1.053,75	-	-	12.190,60	12.190,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>630,95</b>	<b>710,90</b>	<b>919,75</b>	<b>1.053,75</b>	<b>1.053,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.619,32</b>	<b>15.619,32</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>4.313,83</b>	<b>3.835,65</b>	<b>3.678,90</b>	<b>36.894,29</b>	<b>36.894,29</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>44.476,48</b>	<b>44.476,48</b>

LOGRADOURO	6ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	170,43	118,94	107,16	-	-	-	-	7.843,77	7.843,77
<b>SUBTOTAL</b>	<b>170,43</b>	<b>118,94</b>	<b>107,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.843,77</b>	<b>7.843,77</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>4.484,25</b>	<b>3.954,59</b>	<b>3.786,06</b>	<b>36.894,29</b>	<b>36.894,29</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>52.320,25</b>	<b>52.320,25</b>

LOGRADOURO	7ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>4.484,25</b>	<b>3.954,59</b>	<b>3.786,06</b>	<b>36.894,29</b>	<b>36.894,29</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>52.320,25</b>	<b>52.320,25</b>



LOGRADOURO	8ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. LUCIO COSTA	973,99	-	1.141,30	12.810,94	12.810,94	-	-	6.352,00	6.352,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>973,99</b>	<b>-</b>	<b>1.141,30</b>	<b>12.810,94</b>	<b>12.810,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.352,00</b>	<b>6.352,00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>5.458,24</b>	<b>3.954,59</b>	<b>4.927,36</b>	<b>49.705,23</b>	<b>49.705,23</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>58.672,25</b>	<b>58.672,25</b>

LOGRADOURO	9ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. LUCIO COSTA	648,84	-	497,81	17.295,08	17.295,08	-	-	11.782,93	11.782,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>648,84</b>	<b>-</b>	<b>497,81</b>	<b>17.295,08</b>	<b>17.295,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.782,93</b>	<b>11.782,93</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>6.107,08</b>	<b>3.954,59</b>	<b>5.425,17</b>	<b>67.000,31</b>	<b>67.000,31</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>70.455,18</b>	<b>70.455,18</b>

LOGRADOURO	ACUMULADO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	1.754,54	1.560,43	2.230,84	35.840,54	35.840,54	18.989,93	18.989,93	26.767,47	26.767,47
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	1.138,19	840,61	541,88	-	-	28.454,70	28.454,70	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	478,35	396,40	-	-	-	9.304,70	9.304,70	-	-
RUA TIROL	276,87	261,45	244,92	-	-	-	-	3.983,73	3.983,73
RUA CMDT. RUBENS SILVA	34,93	65,87	34,78	-	-	-	-	1.534,68	1.534,68
ESTRADA DO GABINAL	801,37	829,84	733,63	1.053,75	1.053,75	-	-	20.034,37	20.034,37
AV. LUCIO COSTA	1.622,83	-	1.639,11	30.106,02	30.106,02	-	-	18.134,93	18.134,93
<b>TOTAL</b>	<b>6.107,08</b>	<b>3.954,59</b>	<b>5.425,17</b>	<b>67.000,31</b>	<b>67.000,31</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>70.455,18</b>	<b>70.455,18</b>

## OBSERVAÇÃO:

\*1 O VOLUME DE FRESAGEM DE 3.954,59M³ REFERE-SE AO PESO APURADO PELAS NOTAS DE BALANÇA DA PREFEITURA DIVIDIDO PELO PESO ESPECÍFICO APONTADO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FISCALIZAÇÃO (2,30 T/M³) E APROPRIADAS DIARIAMENTE CONFORME EXECUÇÃO DE CADA LOGRADOURO.

\*2 O VOLUME DE FRESAGEM DE 5.425,17 M³ REFERE-SE AO VOLUME APONTADO NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO ENVIADAS PELA FISCALIZAÇÃO.

- O item de fresagem, cuja unidade do catálogo SCO e da planilha orçamentária é em metros cúbicos, está sendo aferido pela Comissão, por tonelada e transformado em metros cúbicos por um peso específico. Desta forma, destacamos que a forma de aferição deste item, devido à sua unidade de medida e conforme orientações técnicas consolidadas, bem como nenhum estabelecimento diverso no TR, Edital ou Contrato, deve se dar pela área efetivamente executada multiplicada pela espessura de projeto.
- Não identificamos o item de recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão, uma vez que o item de transporte TC 04.05.0700 (/) - *Transporte de carga de qualquer natureza, **exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar(...)***, não remuneram esse custo. Solicitamos a inclusão do item de remuneração das despesas de recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão (código EMOP 05.100.0000) na lista de itens propostos em RERRA.






6. Não foram considerados, assim como, outros reduzidos, diversos itens indiscutivelmente necessários e de custos diretos já efetivamente alocados, relativos a administração local da obra, tais como barraco de obras, mão de obra de auxiliar administrativo, engenheiro de obras, técnico de nível médio (segurança do trabalho) e vigia.

Por fim, encaminhamos em ANEXO 3, cópia da medição de serviços elaborada pela empresa, a qual julga a mais aderente à realidade contratual, com a documentação de suporte que julga pertinente para possibilitar a análise e aferição daquilo que está sendo apurado, da Medição 9ª - Etapa 6ª Intermediária, enviada por e-mail do dia 22/10/2020 à Comissão, bem como todas as informações comprobatórias dos serviços executados conforme relação abaixo:

- Toda documentação relacionada na Portaria “N” se conserva n.º 05 de 23/05/2018, cuja cópia segue em anexo;
- E-mail de encaminhamento da medição
- Boletim de Medição
- Relatório Fotográfico
- Diário de Obras
- Memória de Cálculo
- Projetos de Apropriação de Execução de Obras baseados no Projeto Topográfico (com demarcação das áreas e respectivos volumes dos serviços executados)
- Mapas de Distância Média de Transporte
- Projeto Executivo

Ademais, convidamos a todos a visitarem o site de transparência da obra, desenvolvido e mantido pela Dimensional: [www.pavimentarioap4.com.br](http://www.pavimentarioap4.com.br).

Atenciosamente,



DocuSigned by:  


263ED25CCA66476

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>											
<b>CONSERVAÇÃO</b>											
À Firma: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO N.º 98 SALA 605</b> Reg. CNPJ/.M.F.: <b>00.299.904/0001-60</b> Banco N.º: <b>033</b> Agência: <b>3003</b> Conta: <b>130802510</b> F.R.R.I n.º											
Telefone: <b>(21) 2252-1341</b> Insc. Munic.: <b>0.177.998-2</b>											
Referente aos serviços abaixo especificados a importância de:											
<b>R\$ 1.587.122,76</b>	<b>UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS</b>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA N.º.</th> <th>COPIADOR N.º.</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0007070/2020</td> <td></td> <td>28/10/2020</td> <td>R\$ 1.587.122,76</td> </tr> </tbody> </table>				FATURA N.º.	COPIADOR N.º.	DATA	VALOR	0007070/2020		28/10/2020	R\$ 1.587.122,76
FATURA N.º.	COPIADOR N.º.	DATA	VALOR								
0007070/2020		28/10/2020	R\$ 1.587.122,76								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EMPENHO</th> <th>DOTAÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020/001051</td> <td>15.15.15.452.0071.2778      3.3.90.39.24 F.R.141 D.V. 0</td> <td>R\$ 1.587.122,76</td> </tr> </tbody> </table>				EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR	2020/001051	15.15.15.452.0071.2778      3.3.90.39.24 F.R.141 D.V. 0	R\$ 1.587.122,76		
EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR									
2020/001051	15.15.15.452.0071.2778      3.3.90.39.24 F.R.141 D.V. 0	R\$ 1.587.122,76									
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>											
Fatura de SERVIÇOS referente a <b>09ª Medição, 06ª Etapa Intermediária</b> , para execução de "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO", conforme Contrato n.º 024/2020, Processo n.º 06/300.120/2020, Período de Execução: <b>25/09/2020 a 09/10/2020</b> .											
<b>Data: 28/10/2020</b>		DocuSigned by:  263ED25CCA66476									
Confere e importa a presente fatura em <b>R\$ 1.587.122,76</b>  <b>UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS</b>  Em, ____/____/____  _____ Confere		Atesto que os elementos especificados na presente Fatura se referem aos serviços executados e aceitos.  Em, ____/____/____  _____ Engenheiro Fiscal									
Em, ____/____/____		_____ Diretor Geral									



## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018****B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: 9a Etapa: 6a - INTERMEDIARIA Serviços Executados de 25/09/2020 Até 09/10/2020

Sistema: SISTEMA UNICO  
Subsistema: SUBSISTEMA UNICO  
Planilha: 1

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
1	MT 04.05.0050()	m3	231,0000	28,77	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 14.05.0300()	m3	132,0000	106,89	0,0000	0,0000	0,00
3	TC 04.05.0700()	t.Km	2.965.061,2500	0,49	88.444,0112	445.742,1142	43.337,56
4	TC 09.05.0150()	t	2.033,2500	19,28	0,0000	651,9300	0,00
5	TC 09.05.0700()	t	2.033,2500	15,96	0,0000	2.642,4196	0,00
6	SC 04.05.0850()	m3	33,0000	198,35	0,0000	0,0000	0,00
7	SC 04.10.0050()	un	80,0000	46,37	0,0000	42,0000	0,00
8	SC 04.10.0300()	m3	862,5000	215,50	0,0000	0,0000	0,00
9	SC 09.05.0900()	h	4.440,0000	19,86	185,0000	2.183,0000	3.674,10
10	SC 09.05.1100()	h	4.440,0000	22,32	370,0000	3.903,5000	8.258,40
11	SC 09.05.1200()	h	8.880,0000	21,38	370,0000	1.961,0000	7.910,60
12	SC 09.05.1450()	h	26.640,0000	14,38	1.850,0000	19.795,0000	26.603,00
13	SC 09.10.0100()	h	17.760,0000	14,69	0,0000	0,0000	0,00
14	SC 09.10.0150()	h	2.220,0000	17,87	0,0000	1.295,0000	0,00
15	SC 14.05.0400()	m3	3.588,7500	59,90	0,0000	935,8972	0,00
16	SC 14.05.0425()	m3	2.093,8500	104,50	0,0000	935,8972	0,00
17	SC 14.10.0050()	m2	800,0000	755,29	67,5000	631,5000	50.982,07
18	SC 34.05.0040()	un	1.700,0000	160,84	0,0000	102,0000	0,00
19	SC 34.05.0050()	un	800,0000	220,04	0,0000	56,0000	0,00
20	DR 34.05.0250()	un	340,0000	416,22	0,0000	42,0000	0,00
21	BP 09.05.0050()	t	25.803,0000	279,99	2.032,1600	8.341,8900	568.984,47
22	BP 09.05.0100()	t	15.510,0000	374,18	0,0000	7.376,9600	0,00
23	BP 09.05.0300()	t	41.313,0000	3,46	2.032,1600	15.718,8500	7.031,27
24	BP 09.05.0400()	m2	544.500,0000	2,31	32.328,0100	207.164,0900	74.677,70
25	BP 09.05.0600()	m2	60.000,0000	9,65	0,0000	0,0000	0,00
26	BP 09.05.0700()	m2	132.000,0000	53,64	11.782,9300	70.455,1800	632.036,36
27	BP 14.05.0060()	m3	27.150,0000	137,11	497,8086	5.425,1909	68.254,53
28	BP 19.30.0050()	m	1.650,0000	48,28	0,0000	8,8400	0,00
29	ET 04.05.0400()	m3	99,0000	239,04	0,0000	10,8600	0,00
30	ET 04.20.0050()	m3	25,0000	102,83	0,0000	10,8600	0,00
31	ET 04.20.0200()	m3	74,0000	52,55	0,0000	0,0000	0,00
32	ET 04.25.0403()	m3	99,0000	41,69	0,0000	10,8600	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto



## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018**  
**B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: 9a Etapa: 6a - INTERMEDIARIA Serviços Executados de 25/09/2020 Até 09/10/2020

Sistema: SISTEMA UNICO

Subsistema: SUBSISTEMA UNICO

Planilha: 1

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
33	EQ 04.05.0062()	un.mes	24,0000	8.744,69	1,0000	11,8000	8.744,69
34	EQ 04.05.0312()	un.mes	24,0000	8.784,89	1,0000	11,8000	8.784,89
35	EQ 14.05.0380()	h	3.108,0000	84,64	259,0000	2.602,9500	21.921,76
36	EQ 14.05.0386()	h	1.332,0000	32,87	111,0000	1.115,5500	3.648,57
37	EQ 44.05.0059()	h.dam	4.440,0000	0,09	370,0000	3.903,5000	33,30
38	EQ 44.05.0100()	h	3.108,0000	64,07	259,0000	2.732,4500	16.594,13
39	EQ 44.05.0106()	h	1.332,0000	5,65	111,0000	1.171,0500	627,15
40	EQ 44.05.0600()	h	3.108,0000	1,79	129,5000	1.528,1000	231,80
41	EQ 44.05.0606()	h	1.332,0000	1,19	55,5000	654,9000	66,04
42	ST 74.05.0300()	m2	22.275,0000	34,42	0,0000	1,2990	0,00
43	ST 74.05.0450()	m2	3.174,3100	63,77	0,0000	0,0000	0,00
44	AD 14.10.0050()	t	1.898,4000	38,86	0,0000	1.026,8930	0,00
45	AD 14.10.0300()	t.Km	21.696,0000	1,62	0,0000	22.967,2727	0,00
46	AD 14.15.0401()	un.mes	24,0000	5.396,73	2,0000	24,3000	10.793,46
47	AD 14.15.0750()	un.mes	12,0000	4.248,99	0,0000	0,0000	0,00
48	AD 19.25.0210()	un	200,0000	612,93	0,0000	115,0000	0,00
49	AD 19.25.0310()	m2	16,8000	415,07	0,0000	8,4000	0,00
50	AD 24.05.0200()	un.mes	600,0000	55,33	50,0000	395,0000	2.766,50
51	AD 24.05.0250()	un.mes	2.400,0000	51,07	50,0000	355,0000	2.553,50
52	AD 24.05.0300()	un.mes	1.200,0000	38,99	50,0000	115,0000	1.949,50
53	AD 24.05.0450()	m	2.399,9900	0,73	0,0000	0,0000	0,00
54	AD 39.05.0086()	h	4.440,0000	17,53	370,0000	3.200,5000	6.486,10
55	AD 39.05.0116()	h	4.440,0000	27,49	370,0000	4.902,5000	10.171,30
56	AD 39.05.0134()	h	1.110,0000	185,76	0,0000	1.443,0000	0,00
57	IE 00.02.7107()	t	6.010,1300	59,61	0,0000	0,0000	0,00
58	IE 00.02.7108()	t	969,3800	59,27	0,0000	0,0000	0,00
59	IE 00.02.7109()	t	6.979,5000	72,15	0,0000	0,0000	0,00
60	IE 00.02.7110()	t	572,9000	3.273,93	0,0000	0,0000	0,00

Soma: 1.587.122,75

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto





## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018**  
**B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)



Medição: 9a Etapa: 6a - INTERMEDIARIA Serviços Executados de 25/09/2020 Até 09/10/2020


INTERMEDIARIA	Valor global previsto incluindo esta etapa	Total: R\$1.587.122,75
---------------	--	------------------------

R\$13.023.935,78	Valor global medido incluindo esta medição
------------------	--

Importa a presente Folha de Medição em: R\$ 1.587.122,75 (UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

\_\_\_\_\_  
Confere\_\_\_\_\_  
Fiscal\_\_\_\_\_  
Fiscal\_\_\_\_\_  
Fiscal\_\_\_\_\_  
Visto

 <p>20201028u00299904000160</p>	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota <b>00007070</b>		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>28/10/2020 15:34:11</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Código de Verificação <b>CX7A-EA4L</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b>		Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b>		
			Inscrição Estadual: ---		
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>				
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>		Tel.: <b>21 2252-1341</b>		
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>				
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>42.498.733/0001-48</b>		Inscrição Municipal: <b>9.999.902-0</b>		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ</b>					
Endereço: <b>RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO - CEP: 22260-006</b>			Tel.: ----		
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>	E-mail: ----		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fatura de SERVIÇOS referente à 9ª Medição, 6ª Etapa e Intermediária, para execução de "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. e PROGRAMA PAVIMENTA RIO", conforme Contrato n°. 024/2020, Processo n°. 06/300.120/2020, Período de Execução: 25/09/2020 a 09/10/2020.					
Mão de Obra.....R\$ 555.492,96					
Valor dos materiais incorporados a obra .....R\$ 793.561,37					
Custos Materiais não incorporados, equipamentos					
Impostos e taxas, não tem mão de obra ..... R\$ 238.068,42					
Isenta de retenção de INSS, conforme Art, 149, II, da instrução Normativa RFB n.º 971 de 13/11/2009.					
Matricula CEI n.º 90.003.50761/79					
Valor Total da Nota R\$ 1.587.122,75 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.587.122,75</b>					
Serviço Prestado <b>07.02.98 - execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, não enquadrável nos códigos anteriores</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>793.561,37</b>	<b>0,00</b>	<b>793.561,38</b>	<b>3,00%</b>	<b>23.806,84</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00007069, emitida em 28/10/2020.					
- CEI / Código da Obra: CO00.211					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.563.315,91					





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 2020/001051

PROCESSO Nº  
0006/300120/2020

DATA FL.

RUBRICA

ESPÉCIE DE EMPENHO Global	DATA PUBLICAÇÃO 13/04/2020	PROGRAMA DE TRABALHO 15.15.15.452.0071.2778	NAT. DESPESA 3.3.90.39.24	F.R. 141	D.V. 0
ÓRGÃO MUNICIPAL Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação			CNPJ 042.498.733/0001-48		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação					
NOME DO FAVORECIDO DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CNPJ/CPF/MATRÍCULA 000.299.904/0001-60		
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 CENTRO		INSCR. ESTADUAL 0...	INSCR. MUNICIPAL 1779982		
CIDADE RIO DE JANEIRO	U.F. RJ	CEP 20.050-002	BANCO 353	AGÊNCIA 3003	CONTA CORRENTE 130802510

TIPO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO- CONFORME LEI 10520 ARTIGO 1 INCISO CAPUT

VALOR DESTA EMPENHO  
R\$ 5.408.520,73 CINCO MILHÕES E QUATROCENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

OBSERVAÇÕES:  
RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP-4 - PROGRAMA PAVIMENTA RIO.

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2020.

CONFERE

VISTO

*Carlos Eduardo Lopes da Silva*  
Matrícula 11/210.634-2

*LEANDRO LUIZ MAIA ROCHA*  
Gerente II  
IHC/SUBG/CCL/GPC  
Matr. 11/226.710-2

Processo n.º: <b>06/300.120/2020</b>	
Data da autuação:	fls.:
Rubrica	



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação e Técnico-Operacional  
 Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação



**COMUNICADO DE INÍCIO IHC/SUBCTO/CGEC/CPI/Fiscalização N.º 009**

**Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2020.**


**DOS FISCAIS:** JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR, matrícula n.º 11/241.313-6, CREA-RJ n.º 181591/D, SUSANA VIANA BITTENCOURT, matrícula n.º 11/268.112-0, CREA-RJ 2009110807 e MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA, matrícula: n.º 11/119.129-5, CREA-RJ 881062287/D.


**À EMPRESA:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.


**Prezados Senhores:**

Levamos ao conhecimento de V. S.<sup>a</sup>, que essa Empresa está autorizada a dar o início dos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, a partir de **28/04/2020**, nas condições do projeto básico aprovado, objeto do processo n.º **06/300.120/2020**, referente ao Contrato n.º **024/2020**.

Atenciosamente,

  
 JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR  
 matrícula n.º 11/241.313-6  
 CREA-RJ n.º 181591/D

  
 SUSANA VIANA BITTENCOURT  
 matrícula n.º 11/268.112-0  
 CREA-RJ 2009110807

  
 MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA  
 matrícula n.º 11/119.129-5  
 CREA-RJ 881062287/D

RECEBIDO



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação e Técnico-Operacional  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação



Contrato 024/2020 de 28/04/2020		Processo 0006/300.120/2020	Empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.					
Obra		"SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO"						
VALORES RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO (R\$)								
CONTRATO SERVIÇO R\$ 36.091.144,98		EMPENHADO SERVIÇO R\$ 10.826.778,73	A EMPENHAR SERVIÇO R\$ 25.264.366,25	BDI (%) = 18,00	lo = 2019/12			
<b>C R O N O G R A M A</b>								
ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	DURAÇÃO (DIAS)	DURAÇÃO ACUMULADO	PERCENTAGENS		FATURAMENTO		OBSERVAÇÕES
				SIMPLES	ACUMULADA	SIMPLES	ACUMULADO	
1a	28/04/2020 a 27/05/2020	30		5,000000	5,000000	1.804.557,25	1.804.557,25	
2a	28/05/2020 a 26/06/2020	30		15,000000	20,000000	5.413.671,75	7.218.229,00	
3a	27/06/2020 a 26/07/2020	30		20,000000	40,000000	7.218.229,00	14.436.458,00	
4a	27/07/2020 a 25/08/2020	30		20,000000	60,000000	7.218.229,00	21.654.687,00	
5a	26/08/2020 a 24/09/2020	30		20,000000	80,000000	7.218.229,00	28.872.916,00	
6a	25/09/2020 a 24/10/2020	30		20,000000	100,000000	7.218.228,98	36.091.144,98	

Processo.	Fls..
Data de Autuação:	Rubrica:

**JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR**  
matrícula n.º 11/241.313-6  
CREA-RJ n.º 181591/D

**SUSANA VIANA BITTENCOURT**  
matrícula n.º 11/268.112-0  
CREA-RJ 2009110807

**MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA**  
matrícula: n.º 11/119.129-5  
CREA-RJ/881062287/D

RECEBIDO



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

---


**ORGÃO:** COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020  
**EMPRESA:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020

**OBRA:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTÁRIO

**FISCAIS:** João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 9ª  
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 6ª - Interm.  
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 9

---


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO**

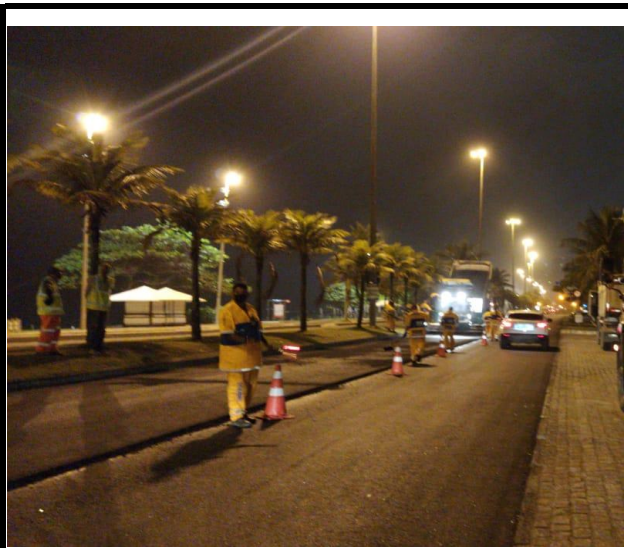


AV. LUCIO COSTA  
SINALIZAÇÃO DE OBRA



AV. LUCIO COSTA  
FRESAGEM

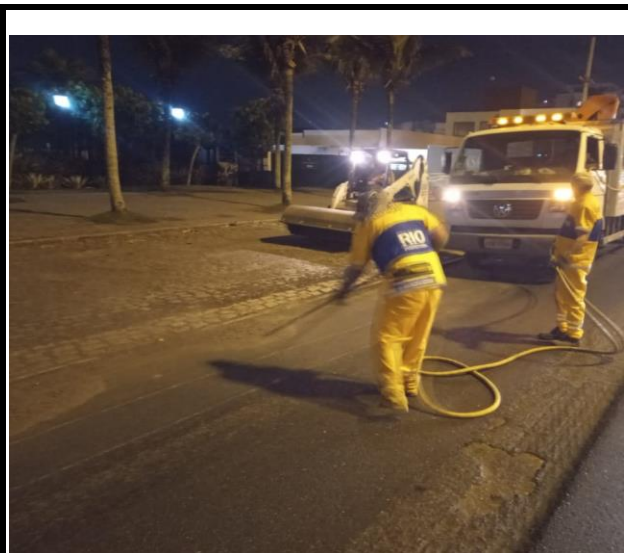

AV. LUCIO COSTA  
EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA)

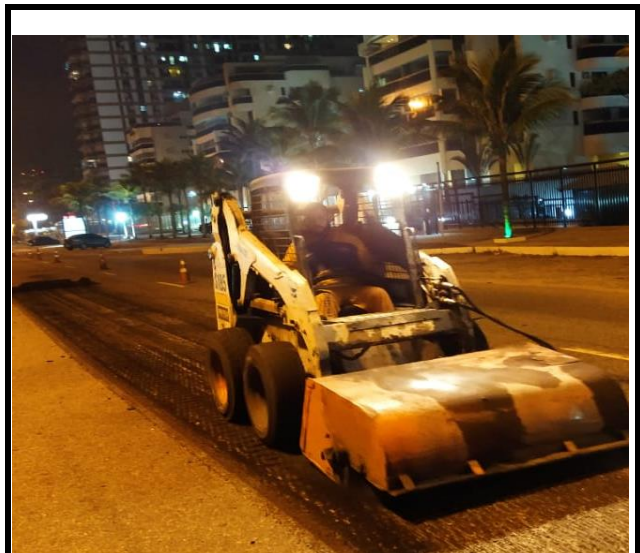


AV. LUCIO COSTA  
EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA)




**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

**ORGÃO:** COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020  
**EMPRESA:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020  
**OBRA:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTÁRIO  
**FISCAIS:** João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 9ª  
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 6ª - Interm.  
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 9

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO**

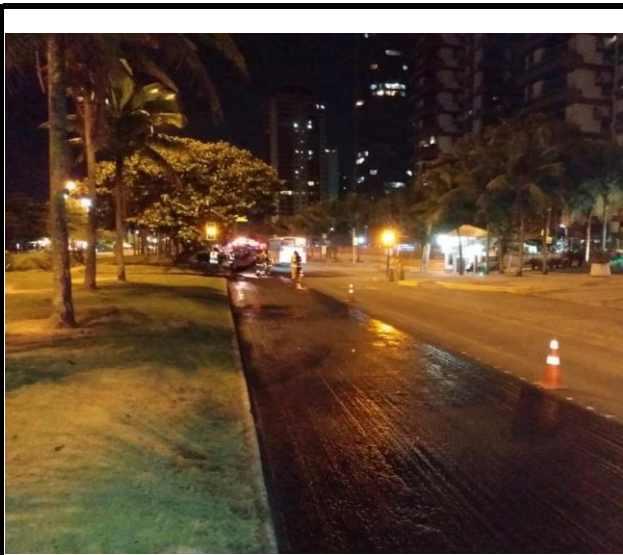


AV. LUCIO COSTA  
PINTURA DE LIGAÇÃO (1ª CAMADA)

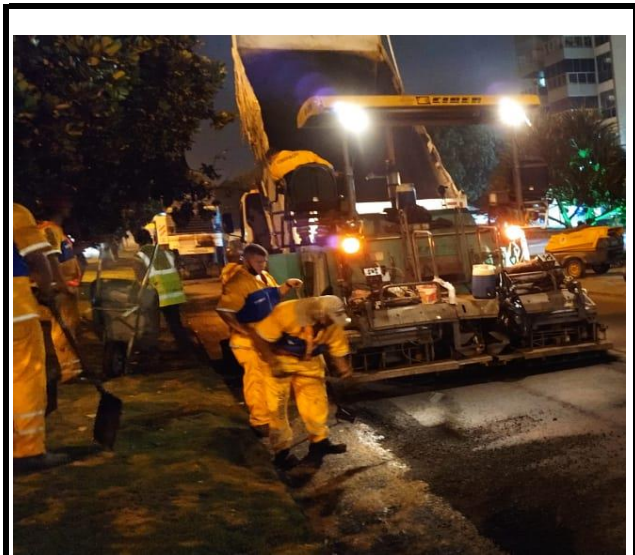

AV. LUCIO COSTA  
ESPALHAMENTO DE ASFALTO (1ª CAMADA)



AV. LUCIO COSTA  
COMPACTAÇÃO (1ª CAMADA)

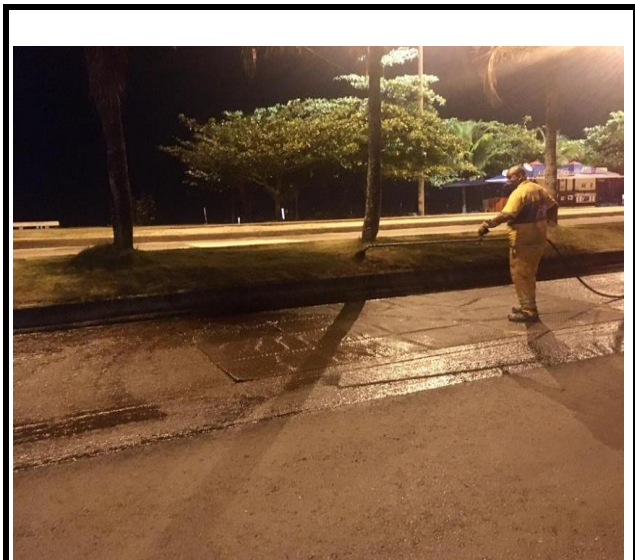

AV. LUCIO COSTA  
PINTURA DE LIGAÇÃO (2ª CAMADA)



**PREFEITURA  
CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

---

**ORGÃO:** COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020  
**EMPRESA:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020

**OBRA:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTÁRIO


**FISCAIS:** João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 9ª  
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 6ª - Interm.  
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 9

---


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO**




AV. LUCIO COSTA  
ESPALHAMENTO DE ASFALTO (2ª CAMADA)

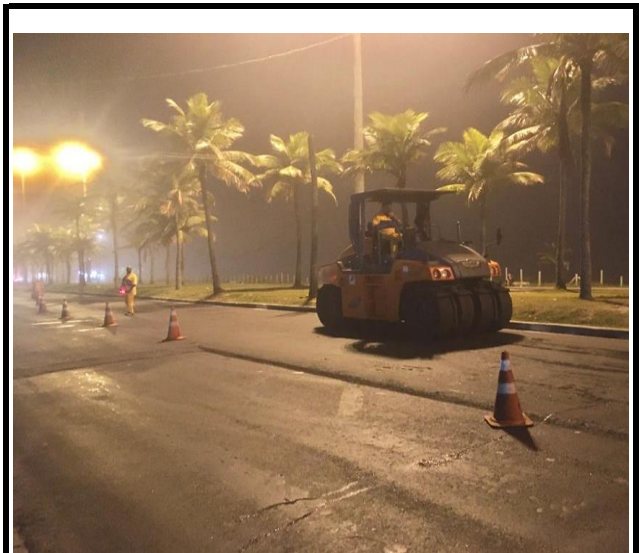

AV. LUCIO COSTA  
COMPACTAÇÃO (2ª CAMADA)

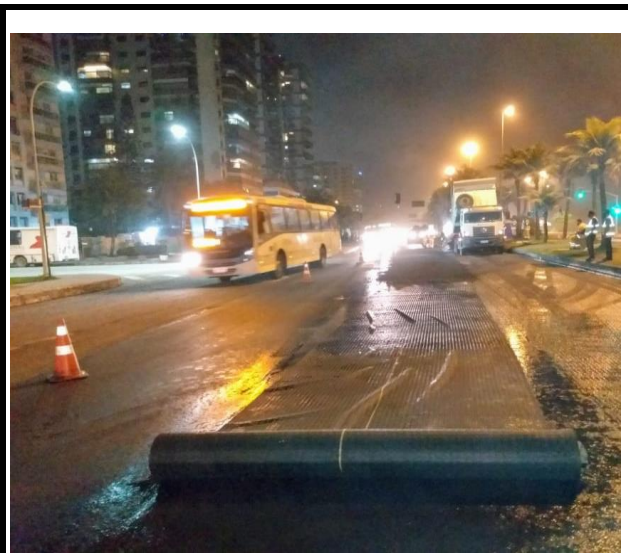

AV. LUCIO COSTA  
APLICAÇÃO DE GEOGRELHA

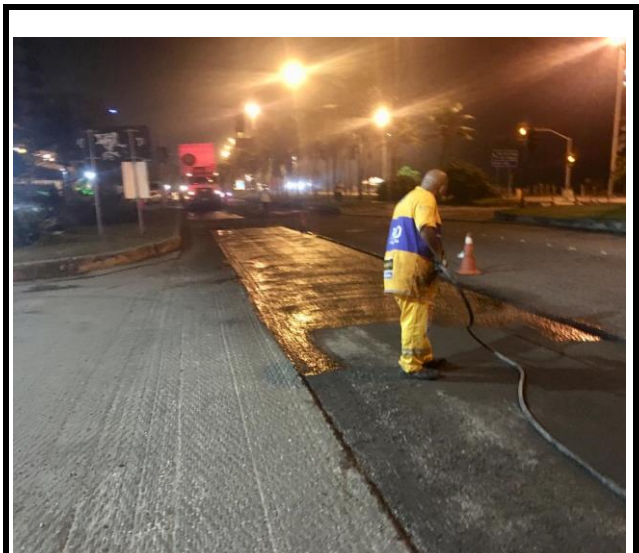

AV. LUCIO COSTA  
REMENDO





Rio de Janeiro, 27 de OUTUBRO de 2020.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO**  
**SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL**  
**COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO**  
**RIO DE JANEIRO - RJ**

**REF.: "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO".**  
**PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.**


**Assunto: DECLARAÇÃO DECRETO N.º 43.189 DE 18/05/2017**  
**REF.: 09ª MEDIÇÃO – 06ª ETAPAINTERMEDIÁRIA**  
**PERÍODO DE 25/09/2020 a 09/10/2020**

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60**, na qualidade de executora da **"SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO" PROCESSO INSTRTUTIVO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020**, vem, através desta, declarar que diversos equipamentos, de pequeno, médio e grande porte, utilizados no contrato em epígrafe são próprios, bem como materiais não incorporados à obra. Importa informar, adicionalmente, que foram aplicados na obra, eventualmente, materiais incorporados que faziam parte do estoque da empresa.

Sendo o que cabia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo, desde já, no aguardo das vossas providências.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  


263ED25CCA66476...  
**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

DS  
EM

DS  


**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  




DIM.FAT 00.211.007/2020. (07ª MED 04ª NORMAL)

Rio de Janeiro, 26 de OUTUBRO de 2020.

À  
**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E**  
**CONSERVAÇÃO – SMIHC**

Att.: **Sr. Sebastião Bruno**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: **Sr. João Adolpho da Silva Júnior**  
**Sra. Susana Viana Bittencourt**  
**Sr. Maurício Gonçalves de Alencastro Graça**  
 Comissão de Fiscalização

**Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo nº 06/300.120/2020**

Ass.: 09ª Medição – 06ª Etapa Intermediária - Período de 25/09/2020 a 09/10/2020  
 Envio da totalidade dos documentos contratualmente exigíveis para fins de Pagamento

Ilmo. Sr. Secretário,

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:

Ao passo que o cumprimos, **a Dimensional, através da presente missiva, encaminha a totalidade da documentação judicial, legal e contratualmente exigida para fins aceitação e atestação das medições de serviços, bem como, o conseqüente pagamento dos valores discriminados na 09ª Medição de Serviços – 06ª Etapa Intermediária, ora acostada.**

Ademais, apenas para fins de registro, informa-se que não há que se cogitar acerca da exigência, no presente Contrato, como documentação integrante das medições de serviços, àqueles listados no artigo 1º do Decreto Municipal nº 43.189/2017, referentes às “*notas fiscais relativas ao material de construção utilizado e as ferramentas e equipamentos alugados*”.

Isso, devido à falta de expressa previsão contratual e editalícia, o que impede a Contratante e o Corpo Fiscal da obra de condicionar a aceitação e atestação das Medições de Serviços, ou a liquidação e o pagamento dos valores devidos, ao fornecimento destes documentos, em estrita conformidade aos princípios norteadores

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
 Integridade e Contra a Corrupção



DS  
 EM

DS

DS

DS



das contratações administrativas, v.g., legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, pacta sunt servanda, segurança jurídica, moralidade, dentre outros.

Compete ainda aduzir que, no âmbito do Contrato nº 024/2020, tal exigência somente tornar-se-ia legítima, válida e obrigatória de cumprimento e atendimento, na hipótese de ambas as Partes (Contratante e Contratada) consentirem e formalizarem esta alteração contratual através de um Termo Aditivo, uma vez que o artigo 65, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.666/93, veda a alteração unilateral de cláusula relacionada a condições de pagamento.

Inclusive, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme decisões proferidas, em Segundo Grau de Jurisdição, no âmbito de um processo judicial que trata, especificamente, sobre a validade da exigência contida no Decreto nº 43.189/2017. As decisões não apenas determinaram a suspensão dos efeitos do Decreto nº 43.189/2017, mas também fizeram constar importantes registros acerca da impossibilidade de sua observância e aplicação em contratos cujas cláusulas verificam-se silentes e/ou omissas quanto à exigência de apresentação das referidas Notas Fiscais. Como se evidencia abaixo:

- Decisão Monocrática, proferida em 12.12.2017, em sede de Agravo de Instrumento (Proc. 0071286-43.2017.8.19.0000), concedendo a Liminar para a suspensão dos efeitos do Decreto nº 43.189/2017:

Pelo que consta dos autos, o decreto impugnado impôs obrigações às empresas contratadas pela administração, que não foram previstas no contrato celebrado, alterando-o unilateralmente.

À luz do art. 65 da Lei 8.666/63, inciso I, a alteração unilateral do contrato pela administração é possível em duas hipóteses:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS

DS

DS  
M



No caso em tela, as obrigações impostas no decreto mencionado não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses, que autorizam a alteração unilateral do contrato, visto que dispõe sobre a medição de obras e serviços, exigindo como requisito para liquidação das despesas a apresentação de notas fiscais relativas ao material de construção utilizado e as ferramentas e equipamentos alugados, de tal forma que comprovem as especificações.

Segundo consta do contrato (cláusula quarta) o pagamento dos serviços prestados ocorrerá conforme o cronograma físico-financeiro, e obedecido o sistema de medição previsto no item 14 do Edital.

Desta forma, pela leitura do contrato firmado entre as partes, não se vislumbra, como condição para pagamento da etapa

concluída, a apresentação de notas fiscais dos materiais e equipamentos<sup>29</sup> utilizados na execução do serviço, mas tão somente da medição.

- Decisão Colegiada, proferida em 31.07.2018, mantendo a decisão em sede de liminar e dando provimento ao Agravo de Instrumento (Proc. 0071286-43.2017.8.19.0000):

A redação do Decreto Municipal em tela, embora possa ser negada, tem a finalidade de contrariar o edital relativo às obras ou serviços ou mesmo alterar o contrato que o compõe. A prova disso, dentre as demais disposições, está no artigo 3º que condiciona o pagamento das faturas (liquidação das despesas) ao cumprimento do dito decreto, cuja redação é:

"Art. 3º - A Controladoria do Município deverá adotar providências para condicionar a liquidação das despesas ao cumprimento deste Decreto."

Implica esta condição em indistigável modificação do contrato e respectivo edital, em face da referida condicionante, que altera, no mínimo, o prazo contratual de pagamento da fatura, que, conforme documento do arquivo 74, do Anexo, na cláusula quatro, §1º, será no prazo de "até 30 dias, a contar da data da apresentação da fatura devidamente formalizada" que é produzida mediante etapas, fiscalizadas e controladas pelo contratante segundo o cronograma físico-financeiro.

Demais, o mesmo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, no inciso II, ao dizer que os contratos podem ser alterados, estabelece condições bem claras a respeito. E o que interessa ao caso é a relativa ao pagamento, que DEVE SER FORMALIZADO POR ACORDO DAS PARTES.

(...)

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  
[Signature]

DS  
[Signature]

DS  
[Signature]



Com efeito, se não há obrigação contratual de apresentar nota fiscal para verificação de adequada aplicação dos materiais informados, (artigo 2º, do Decreto nº 43.189/17), inexistente qualquer possibilidade da obra ou serviço não serem aceitos pela Administração, mesmo porque o controle e fiscalização, como dito antes, é realizado por etapas segundo o cronograma físico e financeiro.

- Decisão Monocrática, proferida em 24.10.2019, que concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta pela AEERJ (Proc. 0068485-86.2019.8.19.0000):

Como ficou consignado no agravo de instrumento acima citado, as obrigações impostas pelo ato normativo impugnado não se alinham com os casos previstos no inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.

Por outro lado, o pagamento da obra/serviço licitado deve ocorrer conforme o programa de pagamento, obedecido o sistema de medição previsto no instrumento convocatório e no contrato administrativo.


Fica evidente que o decreto impugnado alterou unilateralmente a forma de pagamento prevista no contrato e no edital, sem que fossem demonstradas as hipóteses do inciso I do art. 65 da Lei 8.666/93.

Assim, vislumbro na hipótese a probabilidade de provimento do apelo, motivo pelo qual atribuo ao recurso o efeito suspensivo pretendido.

Diante do exposto, **a Dimensional encaminha à Pasta Secretarial a totalidade dos documentos exigíveis para fins de pagamento da 09ª Medição – 05ª Etapa Intermediária, ressaltando que não há que se cogitar sobre à obrigatoria apresentação dos documentos previstos no artigo 1º, do Decreto nº 43.189/2017, haja vista que o Contrato e Edital são silente e omissos quanto a esta obrigação.**

Por fim, a Dimensional aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
 263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



Data da consulta: 09/07/2020 14:21:32

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.299.904/0001-60**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**PORTARIA TR/CRV Nº 4.181  
EM 11 DE MAIO DE 2020.**

AUTORIZA A INTERDIÇÃO AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS EM VIAS DO BAIRRO SÃO CONRADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE DRENAGEM.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGULAMENTAÇÃO E INFRAÇÕES VIÁRIAS - TR/CRV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º c/c o Art. 24, inciso II e no Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro,

CONSIDERANDO a solicitação encaminhada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), de 8 de maio de 2020,

CONSIDERANDO o pedido da CET-Rio, constante do Ofício da CETRIO/PRE/CGO/CTAE/2ª CRAE Sul nº 009/2020, de 11 de maio de 2020,

CONSIDERANDO o parecer técnico da CET/DOP/CRAE,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a interdição ao trânsito de veículos, em uma faixa de rolamento, na saída do Túnel Zuzu Angel, sentido Barra da Tijuca, junto ao bordo direito da via.

Art. 2º A realização das interdições poderá ser suspensa pelas equipes operacionais da CET-Rio, caso seja identificada a necessidade de utilização integral das vias envolvidas em função das condições do trânsito ou climáticas.

Art. 3º Esta autorização só será válida se forem cumpridos os dispositivos contidos nos artigos 94 e 95 do Código de Trânsito Brasileiro, ficando o infrator pela inobservância dos aludidos dispositivos sujeito a multa conforme previsto no C.T.B., independente das cominações cíveis e penais cabíveis.

Art. 4º A presente Portaria, terá validade para o dia 13 de maio de 2020, das 23h às 4h do dia subsequente, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA TR/CRV Nº 4.182  
EM 11 DE MAIO DE 2020.**

AUTORIZA A INTERDIÇÃO AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PROÍBE O ESTACIONAMENTO EM VIA DO BAIRRO LEBLON PARA A REALIZAÇÃO DE PODA DE ÁRVORES.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGULAMENTAÇÃO E INFRAÇÕES VIÁRIAS - TR/CRV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º c/c o Art. 24, inciso II e no Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro,

CONSIDERANDO o constante no e-mail encaminhado pela COMLURB,

CONSIDERANDO o parecer técnico da CET/PRE/CTRT/AP-2.1,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a interdição ao trânsito de veículos na Rua Cupertino Durão, no trecho compreendido entre a Avenida Delfim Moreira e a Avenida General San Martin.

Parágrafo único. A interdição de que trata este artigo não se aplica aos veículos de moradores e aos destinados a socorro e emergência previstos no Art. 29, incisos VII e VIII do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º Proibir o estacionamento de veículos na Rua Cupertino Durão, no trecho compreendido entre a Avenida Delfim Moreira e a Avenida General San Martin, em ambos os lados.

Art. 3º Esta autorização só será válida se forem cumpridos os dispositivos contidos nos artigos 94 e 95 do Código de Trânsito Brasileiro, ficando o infrator pela inobservância dos aludidos dispositivos sujeito a multa conforme previsto no C.T.B., independente das cominações cíveis e penais cabíveis.

Art. 4º A presente Portaria terá validade para o dia 13 de maio de 2020, das 7h às 17h, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA TR/CRV Nº 4.183  
EM 11 DE MAIO DE 2020.**

PROÍBE O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NAS VIAS LOCALIZADAS JUNTO À ORLA DA PRAIA DOS BAIRROS COPACABANA, IPANEMA, LEBLON, SÃO CONRADO, URCA, BARRA DA TIJUCA E RECREIO DOS BANDEIRANTES COMO MEDIDA ADICIONAL DE CONTENÇÃO DO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGULAMENTAÇÃO E INFRAÇÕES VIÁRIAS - TR/CRV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º c/c o Art. 24, inciso II e no Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro,

CONSIDERANDO o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID - 19, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o parecer da CET-RIO/PRE/CTRT AP 2.1 e CTRT AP 4,

RESOLVE:

Art. 1º Proibir o estacionamento de veículos, em toda a extensão e em ambos os sentidos, inclusive nas baías, nas seguintes vias:

I - Avenida Atlântica;

II - Avenida Vieira Souto;

III - Avenida Delfim Moreira;

V - Avenida Niemeyer;

IV - Avenida Prefeito Mendes de Moraes;

VI - Praça General Tibúrcio, junto à Praia Vermelha.

VII - Avenida João Luís Alves;

VIII - Avenida Portugal;

IX - Avenida do Pepê;

X - Avenida Lúcio Costa;

XI - Estrada do Pontal e transversais imediatas;

XII - Av. Paulo Tapajós.

Parágrafo Único. A proibição de que trata esta Portaria não se aplica:

I - Aos veículos de moradores residentes nas vias descritas no Art. 1º, que deverão afixar comprovante de residência junto ao para-brisas, com a descrição do endereço de forma visível;

II - Aos veículos de hóspedes de hotéis localizados nas vias descritas no artigo 1º, que deverão afixar comprovante de estadia junto ao para-brisas, de forma visível;

III - Aos veículos de idosos e de pessoas com deficiência física, desde que estacionados nas vagas regulamentadas, portando cartão de identificação conforme regulamentação existente;

IV - Veículos autorizados pela autoridade de trânsito municipal.

Art. 2º. Suspender a cobrança de estacionamento nas vias descritas no Art. 1º, onde exista estacionamento pago regulamentado pelo Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com implantação da sinalização necessária, revogadas disposições em contrário.

**CET-RIO**

Companhia de Engenharia de Tráfego  
Rua Dona Mariana, nº48 - Botafogo - Tel.: 2535-6100/ 2535-6101

**DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE  
EXPEDIENTE DE 11/05/2020**

**PROCESSO Nº 03/200.764/2020** - Aprovo o Projeto Básico/Termo de Referência, inserto no p.p., e, em conformidade com o art. 1º da Lei nº 10.520/02, com a Lei nº 13.303/2016 e com o Decreto nº 44.698/2018, autorizo a abertura de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, referente à Prestação de serviços especializados de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, com vistas à elaboração, implementação, acompanhamento e coordenação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), do Laudo de Insalubridade e Periculosidade, da Análise Ergonômica e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), pelo período de 12 (doze) meses.

**PROCESSO Nº 03/201.332/2018** - Tendo em vista o informado pela Comissão designada pela Portaria "P" no 016 CET-RIO, de 16/01/2020, às fls. 334, ACEITO, em caráter Definitivo, os serviços de copeiragem nas dependências da CET-Rio, objeto do Contrato no 019/2018, a cargo da empresa DIAMANTE SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., com base na alínea "b", do inciso I, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE  
EXPEDIENTE DE 28/04/2020**

**PROCESSO Nº 03/200.632/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.671/2020** - DEFERIDO

**PROCESSO Nº 03/200.673/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.675/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.664/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.663/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.666/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.223/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.242/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.567/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.549/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 01/06/000.013/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 01/06/000.008/2020** - DEFERIDO

**EXPEDIENTE DE 29/04/2020**

**PROCESSO Nº 03/200.230/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.428/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.656/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.660/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.754/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.755/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.636/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.640/2020** - DEFERIDO  
**PROCESSO Nº 03/200.646/2020** - DEFERIDO

**SECRETARIA DE URBANISMO**

Secretária: Fernanda Maria da Silva Fernandez Tejada

**SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
COORDENADORIA GERAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
DESPACHO DO COORDENADOR  
EXPEDIENTE DE 11/05/2020**

02/001395/2015 - MARCUS QUARESMA FERRAZ

**Indeferido o que requer** considerando que o Laudo foi elaborado de acordo com o parecer PG/PADM/URB/027/2018/FLC, de 25/09/2018, e súmula da jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nº 384, no processo nº 02/263.240/2015(memorando circular CGLF nº 5/2018, sendo este parecer mais recente e atualizado do que o apresentado neste recurso; o exposto no §10º do art. 8º da L.C. 198/2019, onde é permitida a cobrança do fechamento da varanda que não atenda integralmente à L>C> 145/2014 regulamentada pelo decreto 39.345/2014.

02/265376/2015 - PAULO ROBERTO LACERDA

**Indeferido o que requer**

02/05/000689/2019 - MARLENE TINOCO DE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS

**Indeferido o que requer**

**COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO  
E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA 5 - CAMPO GRANDE  
DESPACHO DO COORDENADOR  
EXPEDIENTE DE 11/05/2020**

02/05/000901/2019 - U/SUBU/CGLF/CLU-5

**Aprovo o laudo de vistoria administrativa 25/0004/2020**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,  
HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Secretário: Sebastião Bruno

**SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL  
PORTARIA "P" Nº 034 DE 08 DE MAIO DE 2020.**

**O SUBSECRETÁRIO DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,**

**RESOLVE:**

Designar com eficácia a partir de 28/04/2020 os servidores, JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR, matrícula n.º 11/241.313-6, CREA-RJ n.º 181591/D, SUSANA VIANA BITTENCOURT, matrícula n.º 11/268.112-0, CREA-RJ 2009110807 e MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA, matrícula: n.º 11/119.129-5, CREA-RJ 881062287/D, para juntos comporem a comissão de fiscalização dos "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTA RIO", objeto do processo n.º 06/300.120/2020, referente ao contrato n.º 024/2020, assinado em 28/04/2020, a cargo da firma prestadora de serviços DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

**COMISSÃO COORDENADORA DE OBRAS E REPAROS  
EM VIAS PÚBLICAS - IHC/COR-VIAS**

Despacho do Presidente da Comissão Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Públicas - IHC/COR-VIAS, baseado no que foi analisado pelos relatores na Seção Plenária de 05/05/2020:

## PUBLICAÇÕES A PEDIDO

### CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)

**CANOVA QUEBRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, CNPJ 08.543594/0001-99, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC, através do processo nº 14/200.222/2015, a renovação da Licença Municipal de Instalação (LMI) nº 001623/2015 para construção de grupamento residencial multifamiliar situado na Avenida Rosaura Estellita, 155 - Barra da Tijuca, RJ.

### RENOVAÇÃO DE LICENÇA

**POSTO E GARAGEM 902 LTDA**, sob CNPJ 34.320.515/0001-90, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade SMAC, através do processo nº 14/201.174/2013, a renovação de sua licença LMO nº 002659/2020 para ATIVIDADE POSTO DE REVENDA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS, SITUADO AV. PARARANAPUAN Nº 902 - FREGUESIA - ILHA DO GOVERNADOR-RJ-CEP 21910-002.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### \*EXTRATO DE CONTRATO

**PROCESSO:** 04/410.391/2019  
**CONTRATO Nº** 010/2020-SMF  
**ASSINATURA:** 04.03.2020  
**PARTES:** Município do Rio de Janeiro/SMF e a Financeira Alfa S/A. - Crédito, Financiamento e Investimentos.  
**OBJETO:** Desconto em folha de pagamento de servidores municipais ativos e inativos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações, nas modalidades de Empréstimo Pessoal Consignado e/ou Cartão de Crédito Consignado em favor da Contratada.  
**PRAZO:** 02(dois) anos a contar da data de sua assinatura.  
**DISP. LEGAL:** Reger-se à pelas normas constantes da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883/94, em especial pelo disposto no seu artigo 25, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública - Lei nº 207/80, e suas alterações, recepcionado pela Lei Complementar nº 01, de 13 de setembro de 1990, bem como pelo Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro(RGCAF), aprovado pelo Decreto Municipal nº 3221/81 e suas alterações.

\*Omitido no D.O.Rio de 24.03.20

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### \*EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**PROCESSO:** 04/410.391/2019  
**TERMO ADITIVO Nº** 11/2020 ao Contrato Nº 10/2020 -SMF  
**ASSINATURA:** 04.03.2020  
**PARTES:** Município do Rio de Janeiro/SMF e a Financeira Alfa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.  
**OBJETO:** Prorrogar a vigência, retificação da Clausula Primeira e Quarta do Contrato.

\*Omitido no D.O.Rio de 24.03.20

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

**Processo Instrutivo:** 09/002.822/2017  
**Contrato nº:** 40/2020  
**Data da Assinatura:** 18/02/2020  
**Partes:** PCRJ / SMS e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI

**Objeto:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e monta cargas.

**Prazo:** 24 (vinte e quatro) meses de 16/05/2020 até 15/05/2021

**Valor Total:** R\$ 643.318,56

**Programa de Trabalho:** 18.01.10.302.0306.2009

**Natura de Despesa:** 3.3.90.39.48

**Nota de Empenho nº:** 2020/000238 no valor de R\$ 1,00 (um real)

**Fundamento:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-SMS Nº 580/2018, e o decidido no Processo nº 09/002.822/2017

### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CCPC

#### EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

**PROCESSO INSTRUTIVO Nº:** 12/000.631/2020  
**TERMO DE COMPROMISSO Nº:** 731/2020  
**DATA DA ASSINATURA:** 15/12/19  
**PARTES:** PCRJ/SMC/RKF RIO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA/ANTARES EDUCACIONAL S A  
**OBJETO:** PROJETO "BIGBEAT FESTIVAL"  
**CÓDIGO DO PROJETO:** WEC429/01/2019  
**VALOR:** R\$ 160.000,00  
**FUNDAMENTO:** LEI 5.553/2013

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

#### HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**Processo:** 06/500.218/2020  
**Instrumento:** Contrato nº 25/2020  
**Data da assinatura:** 06/05/2020  
**Partes:** MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMIHC E IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI, COM A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE COMO INTERVENIENTE.  
**Objeto:** OBRAS EMERGENCIAIS DO TELHADO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA  
**Valor:** R\$ 289.709,13  
**Prazo:** 60 dias  
**Programa de Trabalho:** 18.01.10.302.0306.1063  
**Natureza da despesa:** 4.4.90.51.02  
**Nota de empenho:** 2020/000730  
**Valor do Empenho:** R\$ 289.709,13  
**Fundamento:** Lei 8.666/93 e suas alterações

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

#### HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**PROCESSO INSTRUTIVO:** 06/300.120/2020  
**CONTRATO Nº** 024/2020  
**DATA DA ASSINATURA:** 28/04/2020  
**PARTES:** Município do Rio de Janeiro/SMIHC e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
**OBJETO:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 - Programa Pavimentação Rio.  
**VALOR:** R\$36.091.144,98  
**PRAZO:** 180 dias  
**PLANO DE TRABALHO:** 15.15.15.452.0071.2778  
**NATUREZA DE DESPESA:** 3.3.90.39.24  
**NOTA DE EMPENHO:** 2020/000449 no valor de R\$7.611.054,46 e 2020/000450 no valor d R\$3.215.724,27  
**FUNDAMENTO:** Lei nº 10.520/2002 e suas alterações

### MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**Processo Instrutivo:** 07/100.171/2018  
**Instrumento:** 4º Termo Aditivo nº 06/2020 ao Contrato nº 07/2018  
**Data da Assinatura:** 03/04/2020  
**Partes:** MultiRio -Empresa Municipal de Multimeios Ltda. e T&S Locação de Mão de Obra em Geral EIRELI

**Objeto:** Prorrogação por 12 (doze) meses, de 05/04/2020 a 04/04/2021 e reajuste pelo IPCA-E de aproximadamente 2.6967%.

**Valor:** R\$ 41.297,40

**Nota de Empenho:** 2019/000171, no valor de R\$ 31.337,11

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.37.09

**Programa de Trabalho:** 16.51.12.361.0381.4161.

**Fundamento:** Artigo 57, inciso II e 65 da Lei nº 8666/93.

(\* Omitido do D.O.Rio do dia 30/04/2020)

### TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**Processo Instrutivo:** Nº 40/100.143/2020.  
**Identificação do Instrumento:** 2º Termo Aditivo nº 11/2020.  
**Data da assinatura:** 30/04/2020.  
**Partes:** TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e P C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME.  
**Objeto:** Prorrogação de prazo do Contrato nº 17/2018, serviços de motomensagem.  
**Prazo:** 12 meses, de 02/05/2020 a 01/05/2021.  
**Valor:** R\$ 162.000,00  
**Empenho:** n.º 173 de 30/04/2020, no valor de R\$ 107.550,00.  
**Programa de Trabalho:** 2101.01.032.0004.2051.  
**Natureza da Despesa:** 33.90.39.13.  
**Fundamento do Instrumento:** Artigo 57 da Lei Fed. nº 8.666/93 e autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente na peça P049 do processo instrutivo, publicada no D.O. RIO nº 35 de 30/04/2020.

### TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**Processo Instrutivo:** Nº 40/100.256/2019.  
**Identificação do Instrumento:** 4º Termo Aditivo nº 05/2020.  
**Data da assinatura:** 12/03/2020.  
**Partes:** TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e TELEFÔNICA BRASIL S.A.  
**Objeto:** Prorrogação de prazo do Contrato nº 05/2015, serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conectividade sem fio para acesso à Internet (modens USB).  
**Prazo:** 02 (dois) meses, de 13/03/2020 a 12/05/2020.  
**Valor:** R\$ 17.171,74  
**Empenho:** n.º 142 de 11/03/2020, no valor de R\$ 17.171,74.  
**Programa de Trabalho:** 2101.01.032.0004.2051.  
**Natureza da Despesa:** 33.90.39.26  
**Fundamento do Instrumento:** Artigo 57, parágrafo 4º, da Lei nº 8.666/93 e autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente à peça P112 do processo instrutivo, publicada no D.O. RIO nº 241 de 11/03/2020.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

**Processo Instrutivo nº:** 09/004.898/18  
**Contrato nº:** 047/2020  
**Data da Assinatura:** 06/04/2020  
**Partes:** PCRJ / SMS e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO / INSTITUTO DE PSIQUIATRIA.  
**Objeto:** Constitui objeto do presente Termo, formalizar a contratação dos serviços de saúde destinados a garantia da integralidade e acesso à saúde dos usuários SUS do Município do Rio de Janeiro, conforme especificações no Documento descritivo..  
**Vigência:** O presente contrato vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura.  
**Valor Anual:** R\$ 6.751.988,32  
**Fundamento:** Art. 8º, IV, do Anexo 2, do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 02 de 28/09/2017 e Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e sua alterações, bem como o decidido no Processo nº.09/004.898/18



Elimine os focos do *Aedes aegypti* na sua casa e ajude a evitar a dengue, zika e chikungunya.

#FaçaSuaParte

**AQUI MOSQUITO  
NÃO SE CRIA**





02/12/000014/2019 - CARLOS ALBERTO MULLER  
**Passe-se Alvará**

02/12/000119/2019 - VALENTE EMPREENDIMENTOS 31 SPE LTDA  
**Passe-se Alvará**

02/270007/2017 - CYRELA TOLTECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  
**Passe-se Alvará**

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

### SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIARIA GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS

ERRATA D.O. Nº 41 DE 08/05/2020, PÁGINA 49 Onde se lê: **06/700684/2020 - OFÍCIO IHC/SUBH/CGTI/CRUG/**  
**GRL Nº 91/2020 leia-se: 06/700684/2020 - OFÍCIO IHC/SUBH /CGTI/CRUG/GRL Nº 91/2020**

### SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL COMUNICAÇÃO DE INÍCIO Nº 005 DE 27 DE MARÇO DE 2020

**FIRMA:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

**TÍTULO:** "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTA RIO"

**VALOR:** R\$ 36.091.144,98 (trinta e seis milhões noventa e um mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

**INÍCIO:** 28/04/2020

**TÉRMINO:** 24/10/2020

**PROCESSO:** 06/300.120/2020

### FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RIO-ÁGUAS DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO EXPEDIENTE DE 07/05/2020 CONVOCAÇÃO Nº 030/2020

Ao: CONSÓRCIO JARDIM MARAVILHA

**Processo nº 06/600.977/2013 - Contrato nº 033/2014**

Prezados Senhores, a Fiscalização do contrato em questão, no uso de suas atribuições, vem por meio deste solicitar que o **CONSÓRCIO JARDIM MARAVILHA**, seja **CONVOCADO**, para no prazo de 72 horas a partir da publicação desta, comparecer na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, sediada na Rua Voluntários da Pátria 169 - 2º andar - Botafogo, para ciência e providências do contido no ofício nº 644/2020 de 30 de abril de 2020 da Procuradoria Geral do Município.

### FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RIO-ÁGUAS DIRETORIA DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO COMPARECER PARA CIÊNCIA EXPEDIENTE DE 08/05/2020

26/700.471/2019 - JACKSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO.

Agendar data e horário para comparecimento através do e-mail abaixo.  
rioaguas.dan@gmail.com

### EXPEDIENTE DE 11/05/2020

06/600.445/2020 - AVANÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Agendar data e horário para comparecimento através do e-mail abaixo.  
rioaguas.dan@gmail.com

### NOTIFICAÇÃO Nº 292/2020

REF.: Processo 06/600.438/2020 e Ofício OP/SUBPDEC 1087/2020

SENHORES PROPRIETÁRIOS, RESPONSÁVEIS OU OCUPANTES da FMP do trecho do Rio Viegas situado entre a Rua Doutor Augusto Figueiredo e a Rua Coronel Tamarindo, próximo à Rua Coronel Tamarindo número 3100 - Bangu: Tendo em vista o que dispõem os Art. 73 a 75 do RPT aprovado pelo Decreto "E" nº 3.800/70 (Código de Obras da Cidade do Rio de Janeiro) e Art. 05 do Decreto RIO Nº 44670 DE 25 DE JUNHO DE 2018, ficam **NOTIFICADOS** os proprietários, responsáveis ou ocupantes das construções irregulares sobre a F.M.P. (Faixa Marginal de Proteção) do Viegas no trecho citado acima, a qual está compreendida na área abrangida pelo polígono definido pelas coordenadas SAD 69 do quadro abaixo: De que as edificações que estão na FMP estão situadas em área de alto risco de desabamento e enchente, onde não são permitidas construções. E fiquem cientes de que: A construção que foi erguida totalmente ou em parte sobre a FMP do Rio Viegas deverá ser demolida pelo responsável, devendo ser removido todo o entulho, de modo que não haja carreamento de material para o leito do rio. Decorrido os prazos de processo administrativo, relativo à questão, o Poder Público poderá demolir a construção irregular e cobrar as despesas do infrator; Fica determinado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento desta para apresentação de recurso.

Para o interessado visualizar a notificação na íntegra deverá ser acessado o link abaixo.

Link: <http://www.rio.rj.gov.br/web/rio-aguas/licenciamento-de-projetos-particulares-de-drenagem>

## SECRETARIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

### CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDEPI-RIO ATA DA 27ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO.

No dia 28 de abril de 2020 foi realizada a 27ª Assembleia Extraordinária do COMDEPI, com vistas ao uso de R\$15.000,00 (quinze mil reais) do recurso do Fundo Municipal do Idoso (FMI) a ser destinado as Instituições públicas e sem fins lucrativos que possuem convênio com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), material de higiene e material de limpeza para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) públicas e sem fins lucrativos cadastradas no COMDEPI. A proposta teve votação unânime pela maioria dos conselheiros quais sejam: Fernando Binello, Caroline Mafra, Eliana Chagas, Dayse Noval, Sandra Marques, Tiago Almeida, Maxuell Simões, Rosa Vaz e Silvia Barreto.

### CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDEPI-RIO ATA DA 28ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO

### CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO.

No dia 04 de maio de 2020 foi realizada a 28ª Assembleia Extraordinária do COMDEPI-RIO, com vistas a deliberar sobre o uso de seiscentos mil reais (R\$600.000,00) de recurso do Fundo Municipal do Idoso (FMI) a serem destinados para: 1) compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), material de higiene e material de limpeza para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) cadastradas no COMDEPI e 2) Aquisição de cestas básicas a serem entregues aos idosos dos projetos da SEMESQVE, por um período de três meses, que de acordo com os gestores dos mesmos, estão necessitando desta ajuda. A proposta inicial era utilizar o uso do recurso para financiar a todas as Instituições inscritas no COMDEPI, sem distinção da natureza (privadas com ou sem fins lucrativos). Porém a decisão da maioria dos conselheiros foi de contemplar somente as públicas ou sem fins lucrativos, entendendo que, neste momento, são as que mais estão sendo penalizadas com a pandemia por não terem recursos financeiros para arcar com a compra em larga escala dos produtos mencionados acima, bem como os novos preços praticados no mercado. 4 votos contra a nova proposta: Dayse Noval, Sandra Marques, Maxwell Simões, Caroline Mafra; 3 votos a Favor: Fernando Binello, Sílvia, Tiago Almeida. Sendo assim, a proposta deliberada foi: Liberação de 600.000,00 (seiscentos mil reais) para ILPIs públicas e sem fins lucrativos, para compra de EPIs, material de consumo e material de higiene para 32 Instituições (exceto os Projetos e ILPIs privadas que totalizam 101 inscrições) e a compra de 2.743 (duas mil setecentos e quarenta e três cestas) por três meses. Republicado por incorreção no DO Rio de 08/05/2020

## PUBLICAÇÕES A PEDIDO

### RENOVAÇÃO DE LICENÇA

**O POSTO DE GASOLINA SOLAR DE CAMPO GRANDE LTDA** - CNPJ: 09.401.042/0001-09, torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/200.729/2010, a renovação de sua Licença Municipal de Operação - LMO nº 1303/2014 para POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, situado à Rua Barcelos Domingos, 123 - Campo Grande - Rio de Janeiro CEP: 23.080-020.

### REQUERIMENTO DE LICENÇA

A MAGACHO LOPES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.- CNPJ: 21.674.564/0001-80 torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC, através do processo nº 26/510.318/2018, a Licença Municipal de Operação para operar posto de abastecimento e serviços com sistema de GNV situado na Av. das Américas, nº 7.380 - quadra B, do PAL 29430 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL

**Processo Instrutivo nº 07/05/000459/2017.**

**3ª Termo Aditivo nº 13/2020 ao Contrato nº. 02/2017.**

**Data da assinatura:** 22/03/2020.

**Partes:** PCRJ/SME/5ªCRE e TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA.

**Objeto:** Locação de veículo do tipo ônibus adaptado com motorista e 02 (dois) monitores por veículo.

**Prazo:** 22/03/2020 até 21/03/2021.

**Valor Total:** R\$ 690.056,16

**Programa de Trabalho:** 16.06.12.361.0315.2081

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.13

**Nota de Empenho:** 2020/075 no valor R\$ 115.009,36

**Fundamento:** Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 07/002628/2020

Contrato nº 35/2020

Partes: PCRJ/SME e TRANNOGUEIRA COMÉRCIO E MERCADO EIRELI

Data de assinatura: 08/04/2020

Objeto: Aquisição de álcool gel, para atendimento às 11 (onze) Coordenadorias Regionais de Educação.

Prazo: 08/04/2020 até 07/10/2020

Valor Total: R\$ 8.424.000,00 (oito milhões quatrocentos e vinte e quatro mil reais).

Programas de Trabalho: 16.01.12.361.0315.2213

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.02

Nota de Empenho: 2020/000868

Fundamento: Artigos 4-B e 4-H da Lei 13.979/2020, Decreto Municipal 47.263/2020 e Lei 8.666/93.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**Processo:** 07/007.448/2018

**Instrumento:** 2º Termo Aditivo nº 049/2020 ao Contrato SMIH nº 151/2019.

**Data da assinatura:** 06/05/2020

**Partes:** MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMHC E ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP, COM A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO URBE COMO INTERVENIENTE.

**Objeto:** Modificação das especificações do projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

**Fundamento:** artigo 65, inciso I, alínea "a" c /c §1º e §2º da Lei nº 8.666/93 e no artigo 482, II, "a" e "b" do RGCAF.

### RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A. = RETIFICAÇÃO =

**PROCESSO INSTRUTIVO nº:** Onde se Lê: 01/221.056/2020

**Leia-se:** 01/221.056/2017

**INSTRUMENTO:** Termo Aditivo nº 001/2020 ao T.C. nº 151/2017

**PARTES:** RIOTUR e a DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA

\*\*\* Retificado por ter saído com incorreção no D.O. do dia 30/04/2020, Pág. 71, Col.03

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**Processo:** 26/340.421/2016

**Instrumento:** 08º Termo Aditivo Nº 050/2020 ao Contrato Nº 68/2016

**Data da assinatura:** 11/05/2020

**Partes:** MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMHC E EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.

**Objeto:** prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias, a contar de 06/04/2020 até 04/07/2020, e readequação do cronograma físico-financeiro.

**Fundamento:** Art. 57, § 1º, inciso III c/c Art. 65, inciso II, alínea "c", ambos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.





# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.003.50761/79	<b>Nome da obra</b> 00.211 - Pavimentação Rio AP'4	<b>Data do cadastramento</b> 27/05/2020 17:32	<b>Origem do cadastramento</b> e-CAC
<b>Data do início da obra</b> 28/04/2020	<b>CNAE</b> 4211101 Construção de rodovias e ferrovias		

### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 28/04/2020
--------------------------	---------------------------

### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> RIO DE JANEIRO	<b>UF</b> RJ	<b>CEP</b> 22.713-470
<b>Bairro</b> DIVERSOS	<b>Logradouro</b> OUTROS Diversos logradouros na Área da A.P. 4	<b>Número</b> SN	<b>Complemento</b> SN

### Responsável

<b>Nome</b> DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 00.299.904/0001-60	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 28/04/2020	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO

### Obra por Contrato

<b>Unidade de Medida</b> Outra	<b>Medida</b> 360.000,00	<b>Número do Contrato</b> 024/2020
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------




## DECLARAÇÃO

RIO DE JANEIRO 26 DE OUTUBRO DE 2020.

Declaramos para os devidos fins e de acordo com o Art. 28, parágrafo 1º, da Instrução Normativa nº 18 – INSS de 11/05/2000, que a Empresa Dimensional Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, possui escrituração contábil e os valores ora apresentados referentes às contribuições, encontram-se devidamente contabilizados.

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Dimensional Engenharia Ltda  
Gloria Benevides  
Diretora

  
\_\_\_\_\_  
Leonardo Patrício Giraldez  
Contador CRC/RJ 01696270-0  
CPF: 034.103.151-22

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  


DS  


DS  


A

MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encaminhamos o endosso nº 0000001 da apólice de seguro nº 061902020890407750014901, cuja autenticidade, integridade e validade jurídica deste documento em forma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP nº. 2.200-2, de 24/08/2001.

Aproveitamos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tornar nosso cliente.

Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nos à sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

TÍTULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 061902020890407750014901 - ENDOSSO Nº 0000001.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

    
Assinado digitalmente por:  
Luis Felipe Smith de Vasconcellos   
✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado

    
Assinado digitalmente por:  
Valmir Marques Rodrigues   
✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

Luis Felipe Smith De Vasconcellos Nº de Série do Certificado : 3C0CB0F3A2ED1217C937667C6C6B4D8A Data e Hora Atual May 26 2020 3:

Valmir Marques Rodrigues Nº de Série do Certificado : 5A6F9170AC75E56CAB7164542FAE532F Data e Hora Atual May 26 2020 3:14PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº. 061902020890407750014901 - ENDOSSO Nº 0000001.

CONTROLE INTERNO Nº. 67513

DATA DA PUBLICAÇÃO:May 26 2020 3:14PM

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901		Endosso nº 0000001		Proposta Nº 30077783	
Grupo RISCOS FINANCEIROS		Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO		Modalidade CONSTRUÇÃO			
<b>DADOS DO SEGURADO</b>							
Nome/Razão Social MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚB				CNPJ/CPF 42.498.733/0001-48			
Endereço RUA MAIA DE LACERDA		Número 167		Complemento 2º ANDAR			
Cep: 20250001		Bairro ESTÁCIO		Cidade RIO DE JANEIRO		UF RJ	
<b>DADOS DO TOMADOR</b>							
Nome/Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60			
Endereço R SETÉ DE SETEMBRO		Número 98		Complemento			
Cep: 20050002		Bairro CENTRO		Cidade RIO DE JANEIRO		UF RJ	
<p>A Tokio Marine Seguradora S.A, a seguir denominada SEGURADORA, tendo em vista as declarações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo TOMADOR acima identificado, proposta esta que, servindo de base para emissão desta apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o SEGURADO, sob os termos das condições gerais e/ou especiais e demais cláusulas expressamente convencionadas, insertas na presente ou em seus anexos, as obrigações assumidas pelo TOMADOR, até o limite dos valores da garantia a seguir especificados.</p>							
<p><b>GARANTIAS :</b>  TOTAL DO VALOR DA GARANTIA : R\$ 721.823,00  VIGÊNCIA : DAS 24h00 DO DIA : 13/04/2020 ATÉ AS 24h00 DO DIA : 13/12/2021  Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes anexos :  1) Demonstrativo de Prêmio. 2) Condições Particulares. 3) Condições Especiais. 4) Condições Gerais.</p>							
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b>  - A garantia dada por este seguro extinguir-se-á quando o término da vigência expressa nesta apólice, salvo se houver prorrogação por meio de endosso.  - Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP <a href="http://www.susep.gov.br">www.susep.gov.br</a>;  - Processo SUSEP nº. 15414.900306/2014-87  - As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão ser consultadas no endereço eletrônico <a href="http://www.susep.gov.br">www.susep.gov.br</a>, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta apólice / endosso.  * SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.  - Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800 21 8484 (de segunda a sexta, das 09h30 às 17h00).</p>							
<b>CORRETOR</b>							
Nome/Razão Social CONSET ADMINISTRACAO E CORRETA				Código Interno 004770		Registro Susep 10.0347906	

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP	Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
--	--	-----------------------	-------------------------

Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO
-----------------------------	--	--------------------------

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, aos 26 dias do mês de Maio de 2020.

Seguradora Tokio Marine Seguradora S.A  
Endereço Rua Sampaio Viana, 44 Sobre Loja  
CNPJ : 33.164.021/0001-00  
Capital Vinculado R\$ 96.000.000,00  
Capital Subscrito R\$ 96.000.000,00



  
Assinado digitalmente por:  
Luis Felipe Smith de Vasconcellos

✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado



  
Assinado digitalmente por:  
Valmir Marques Rodrigues

✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

Luis Felipe Smith De Vasconcellos Nº de Série do Certificado : 3C0CB0F3A2ED1217C937667C6C6B4D8A Data e Hora Atual May 26 2020 3:14P

Valmir Marques Rodrigues Nº de Série do Certificado : 5A6F9170AC75E56CAB7164542FAE532F Data e Hora Atual May 26 2020 3:14PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

#### DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Premio Líquido	R\$ 0,00
Adicional de fracionamento	R\$ 0,00
Custo de Emissão	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Correção Monetária	R\$ 0,00

Prêmio Total R\$ 0,00

Condições de Pagamento: à vista

Taxa de Juros: 0.000%

Número de Prestações: 1

1ª Prestação R\$ R\$ 0,00

Demais Prestações R\$ R\$

Forma de Cobrança: Boleto sem Registro

Vencimentos: 19/05/2020



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

## CONDIÇÕES PARTICULARES

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

A Tokio Marine Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana nº 44 - Paraíso, inscrita no C.N.P.J sob o nº 33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, com sede na RUA MAIA DE LACERDA nº 167 - ESTÁCIO - RIO DE JANEIRO - RJ inscrito no C.N.P.J sob o nº 42.498.733/0001-48, as obrigações assumidas pela(o) DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, com sede na R SETE DE SETEMBRO nº 98 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ, inscrito no C.N.P.J sob o nº 00.299.904/0001-60, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados.

Modalidade: CONSTRUÇÃO  
Valor da Garantia: R\$ 721.823,00

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte OBJETO: Declara-se para os devidos fins e feitos que fica alterada a razão social do segurado da presente apólice conforme especificado abaixo:

Onde se lê: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Leia-se: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais condições da apólice.

## OBSERVAÇÕES

- Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br);

- Processo SUSEP nº. 15414.900306/2014-87



Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

## CLÁUSULA PARTICULAR DE RISCOS EXCLUÍDOS

1. Não estão amparados por este seguro:

- a. Riscos ocorridos anteriormente à data de início de vigência expressa na apólice ou originários de modalidades de Seguro Garantia distintas da modalidade contratada pelo presente seguro;
- b. Atos terroristas ou de sabotagem, rebeliões, tumultos;
- c. Obrigações trabalhistas, ou de seguridade social, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, exceto quando contratada cobertura específica;
- d. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;
- e. Danos morais;
- f. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais;
- g. Riscos de natureza política;
- h. Danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial;
- i. Riscos hidrológicos e/ou geológicos;
- j. Indenizações que envolvam empregados do tomador ou de terceiros;
- k. Riscos de energia nuclear;
- l. Obrigações fiscais, tributos e despesas comerciais;
- m. Multas e penalidades, exceto para contratos regidos pela Lei 8666/93.

2. Também não estão cobertos por este seguro os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Caso o segurado seja uma pessoa jurídica o presente item também se aplica aos seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficiários e seus respectivos representantes.

3. A Seguradora não concederá cobertura nem será responsável pelo pagamento de qualquer reclamação de indenização decorrente de riscos cobertos por outros ramos de seguros, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes, infidelidade de empregados, vida em grupo, acidentes pessoais, compreensivo empresarial, riscos de engenharia, danos acordados, etc.

4. Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pelo presente seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, representante, titulares ou funcionários;

5. Atos de hostilidade ou de guerra (contra inimigo estrangeiro ou guerra civil), rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade civil ou militar, de fato ou de direito, bem como todas as demais ações praticadas fora do Estado de Direito;

6. Fissão ou fusão nuclear, bem como contaminação radioativa;

7. Qualquer seguro ou indenização decorrente direta ou indiretamente de qualquer sinistro ou dano (incluindo danos indiretos) relativos à propriedade, posse, operação, controle, abastecimento ou prestação de serviços em:

- a. Reatores nucleares, os prédios que os contêm, bem como todos os bens existentes nestes prédios;
- b. Edificações e bens acessórios existentes no local de uma instalação de reator nuclear;
- c. Instalações para produção de elementos combustíveis, para depósito de material físsil, para reprocessamento, recuperação, separação química, armazenamento ou eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos nucleares;
- d. Qualquer outra instalação ou dependência definida como instalação nuclear pela legislação local ou demais normas governamentais;
- e. Garantias sem importância segurada definida.

8. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901		Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO		Modalidade CONSTRUÇÃO		
<b>MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDIÇÕES ESPECIAIS</b>					
<p>1. Objeto</p> <p>1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.</p> <p>1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.</p> <p>1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a cobertura adicional de ações trabalhistas e previdenciárias.</p> <p>2. Definições</p> <p>Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:</p> <p>I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.</p> <p>3. Vigência</p> <p>3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:</p> <p>I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras.</p> <p>II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.</p> <p>3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1, não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da Seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.</p> <p>4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro</p> <p>4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a expectativa de sinistro.</p> <p>4.2. Reclamação: a expectativa de sinistro será convertida em reclamação, mediante comunicação pelo segurado à Seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a reclamação do sinistro.</p> <p>4.2.1. Para a reclamação do sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1 das condições gerais:</p> <p>a) cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;</p> <p>b) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;</p> <p>c) cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;</p> <p>d) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;</p>					



NOSSA TRANSPARÊNCIA. SUA CONFIANÇA

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

4.2.2. A não formalização da reclamação do sinistro tornará sem efeito a expectativa do sinistro.

4.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1 e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação.

#### 5. Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

**SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO  
CONDIÇÕES GERAIS**

**1. Objeto**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I - processos administrativos;

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

**2. Definições**

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as condições gerais e/ou condições especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A Seguradora terá o prazo de quinze dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de quinze dias previsto no item 3.3 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3 será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até quinze dias, a partir da data de aceitação da proposta.

### 4. Valor da Garantia

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.

**CONDIÇÕES GERAIS**

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

**5. Prêmio do Seguro**

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de cinco dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

**6. Vigência**

6.1. Para as modalidades do seguro garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas condições especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas condições especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

**7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro**

7.1. A expectativa, reclamação e caracterização do sinistro serão especificadas para cada modalidade nas condições especiais, quando couberem.

7.2. A Seguradora descreverá nas condições especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da reclamação de sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A reclamação de sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da cláusula 17 destas condições gerais.

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

- I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
- II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de trinta dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1, o prazo de trinta dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de trinta dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

#### 9. Atualização de Valores

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da cláusula 8 destas condições gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

#### 10. Sub-Rogação

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

**CONDIÇÕES GERAIS**

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

#### 11. Perda de Direitos

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

IV – atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – o segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – se o segurado agravar intencionalmente o risco.

#### 12. Concorrência de Garantias

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

#### 13. Concorrência de Apólices

É vedada a utilização de mais de um seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

#### 14. Extinção da Garantia

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3 destas condições gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n.º 8.666/1993, e sua extinção se



## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n.º 8.666/93.

## 15. Rescisão Contratual

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido.

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada  
sobre a vigência original  
para obtenção de prazo em dias % Do Prêmio

15/365	13
30/365	20
45/365	27
60/365	30
75/365	37
90/365	40
105/365	46
120/365	50
135/365	56
150/365	60
165/365	66
180/365	70
195/365	73
210/365	75
225/365	78
240/365	80
255/365	83
270/365	85
285/365	88
300/365	90
315/365	93
330/365	95
345/365	98
365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

## 16. Controvérsias

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

#### 17. Prescrição

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 18. Foro

As questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

#### 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas condições especiais e/ou particulares da apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

#### CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO PARA SITUAÇÕES NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE SANÇÃO, EMBARGO, PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO

1. Essa apólice exclui cobertura para pessoas, países e/ou situações que estejam enquadradas na sanção, embargo, proibição ou restrição previstas nas resoluções da Organização das Nações Unidas e também por sanção, embargo, proibição ou restrição comercial ou econômica da União Europeia, Reino Unido ou Estados Unidos da América, ainda que tal restrição tenha sido incluída nas listas após a contratação do seguro, conforme as listas abaixo:

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

2. Considera-se a data da ocorrência do sinistro como o fato gerador para determinar o risco excluído sob o efeito desta cláusula.



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

2.1. Se o segurado passar a integrar em uma ou mais listas citadas no item 1 desta cláusula, após a data de ocorrência do sinistro, fica estabelecido que:

- perderá o direito a indenização se for caracterizada o ato doloso do segurado ou do seu representante e nexos causal com o evento gerador do sinistro; ou
- terá o direito à indenização suspenso até que haja a superação do embargo ou sanção pelo órgão internacional que impôs ou eventual solução judicial;

3. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/09/2020 - 09:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/09/2020 - 09:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/09/2020

Nº Controle: 314.172.377.245.204.527 | Autenticação Bancária: 024.103.778

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**Código de barras: **8585000000-2 13930180200-0 90764420000-0 02999040001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **000299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **08/2020**Data de validade: **07/09/2020**Data de débito: **04/09/2020**Valor do pagamento: **R\$ 13,93**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

LK7wCbyE VJpEZUcG dkt5NHSA rSHpa2au q2w#QwBz zdsAqyCo HXBjzzb@ LRP4SX3k  
6m8Yqxsm c7ZnoVE1 SN\*AsD42 2hIfUMab G5sgjt07 bnyXuB\*W SMAy#IBv cxRsDoiv  
L9ZtxLi5 lE@2IIHf scDTECTO hofQChFy kVXFvWaa #7ITMACV 00500420 00030013

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 777.917,24	06-QTDE TRABALHADORES 261	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62.233,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62.233,37
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 777.917,24	06-QTDE TRABALHADORES 261	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62.233,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62.233,37
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/09/2020

Nº Controle: 314.172.377.245.204.527 | Autenticação Bancária: 024.103.821

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**Código de barras: **85860000622-3 33370180200-1 90764420080-9 02999040001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **800299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **08/2020**Data de validade: **07/09/2020**Data de débito: **04/09/2020**Valor do pagamento: **R\$ 62.233,37**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

DOPk43AW RqB8LA6? \*R5ZDAy2 Ko@hEi50 uBwtXatP EvCUsooX aCzNI#zf Zx2V\*krR  
aoSI24eV j3fomyEr t5I5Zpru ?r4CF@lL XJSPGAIC 8QXT#vwm Yy5v9uVa btc@V@Pz  
UGP3gjZQ 3Ku3ahQt BBT1DgM7 jF9sA3?2 r3DbZyrL TjAU2wH? 00500420 002200.2

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.299.904/0001-60</b>	Razão Social <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2020</b>	Data de Vencimento <b>18/09/2020</b>	Número do Documento <b>07.16.20262.0288220-3</b>	Pagar este documento até <b>18/09/2020</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000002880319</b>			Valor Total do Documento <b>319.662,20</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	59.104,18			59.104,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.684,44			2.684,44
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	67.221,23			67.221,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.460,63			5.460,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	432,27			432,27
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.740,10			1.740,10
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.126,96			1.126,96
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	9.711,11			9.711,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.402,65			8.402,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	672,21			672,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	3.361,06			3.361,06
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	5.041,59			5.041,59
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.016,63			2.016,63
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

SENDA (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 11

18/09/2020 13:07:56

85870003196 3 62200385202 3 62071620262 2 02882203493 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870003196 3 62200385202 3 62071620262 2 02882203493 0



CNPJ 00.299.904/0001-60  
 Número: 07.16.20262.0288220-3  
 Pagar até: 18/09/2020  
 Valor: 319.662,20





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.211.15056/70	24,27			24,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.211.15056/70	3,50			3,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.211.15056/70	3,03			3,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.211.15056/70	0,24			0,24
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.211.15056/70	1,21			1,21
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.211.15056/70	1,82			1,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.211.15056/70	0,72			0,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.216.94404/71	4,36			4,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.216.94404/71	0,62			0,62
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.216.94404/71	0,54			0,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.216.94404/71	0,04			0,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.216.94404/71	0,21			0,21
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI	0,32			0,32



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.216.94404/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	0,13			0,13
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.216.94404/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.687,56			2.687,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.218.63534/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	388,25			388,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.218.63534/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	335,94			335,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.218.63534/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	26,87			26,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.218.63534/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	134,37			134,37
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.218.63534/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	201,56			201,56
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.218.63534/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	80,62			80,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.218.63534/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	47,03			47,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.221.89412/79				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6,79			6,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.221.89412/79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5,87			5,87
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.221.89412/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	0,47			0,47
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.221.89412/79				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2,35			2,35



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.221.89412/79				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.221.89412/79	3,52			3,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.221.89412/79	1,41			1,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.224.48239/75	6.699,24			6.699,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.224.48239/75	967,80			967,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.224.48239/75	837,40			837,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.224.48239/75	66,99			66,99
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.224.48239/75	334,96			334,96
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.224.48239/75	502,44			502,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.224.48239/75	200,97			200,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.227.25318/74	11.374,65			11.374,65
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:51.227.25318/74	842,75			842,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:51.227.25318/74 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	241,56			241,56



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.643,23			1.643,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.227.25318/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.421,83			1.421,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.227.25318/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	113,74			113,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.227.25318/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	568,73			568,73
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.227.25318/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	853,09			853,09
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.227.25318/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	341,23			341,23
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.227.25318/74				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.841,46			1.841,46
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.232.08100/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	266,02			266,02
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.232.08100/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	230,18			230,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.232.08100/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,41			18,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.232.08100/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	92,07			92,07
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.232.08100/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	138,10			138,10
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.232.08100/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	55,24			55,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.232.08100/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.272,39			2.272,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.234.46065/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	328,28			328,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.234.46065/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	284,04			284,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.234.46065/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,72			22,72
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.234.46065/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	113,61			113,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.234.46065/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	170,42			170,42
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.234.46065/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	68,17			68,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.234.46065/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	671,67			671,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.234.49577/77				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	97,03			97,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.234.49577/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	83,95			83,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.234.49577/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,71			6,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.234.49577/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	33,58			33,58
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.234.49577/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI	50,37			50,37



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.49577/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.49577/77	20,15			20,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.244.31185/78	6.630,52			6.630,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:30.709.687/0001-08	415,80			415,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.244.31185/78	957,87			957,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.244.31185/78	828,81			828,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.244.31185/78	66,30			66,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.244.31185/78	331,52			331,52
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.244.31185/78	497,28			497,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.244.31185/78	198,91			198,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04590/73	853,22			853,22
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:90.000.04590/73 CNPJ Prestador:04.860.886/0001-02	105,60			105,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04590/73	123,26			123,26



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	106,65			106,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,53			8,53
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	42,66			42,66
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	63,99			63,99
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	25,59			25,59
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	721,83			721,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04592/78				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	70,40			70,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:90.000.04592/78 CNPJ Prestador:04.860.886/0001-02				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	104,28			104,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04592/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	90,22			90,22
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04592/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,21			7,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04592/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	36,09			36,09
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	54,13			54,13
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	21,65			21,65
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.002.72193/72	11.457,52			11.457,52
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.002.72193/72	164,55			164,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:90.002.72193/72 CNPJ Prestador:03.399.352/0001-50	372,40			372,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:90.002.72193/72 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	857,94			857,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.002.72193/72	1.655,21			1.655,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.002.72193/72	1.432,19			1.432,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.002.72193/72	114,57			114,57
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.002.72193/72	572,87			572,87
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.002.72193/72	859,31			859,31
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.002.72193/72	343,72			343,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.50761/79	39.054,81			39.054,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.50761/79	5.642,05			5.642,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.881,85			4.881,85





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.50761/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.50761/79	390,54			390,54
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.50761/79	1.952,74			1.952,74
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.50761/79	2.929,11			2.929,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.50761/79	1.171,64			1.171,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.61150/76	18.877,76			18.877,76
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.003.61150/76	516,61			516,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:90.003.61150/76 CNPJ Prestador:02.020.732/0001-79	1.036,93			1.036,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.61150/76	2.727,17			2.727,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.61150/76	2.359,72			2.359,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.61150/76	188,77			188,77
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.61150/76	943,88			943,88
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.61150/76	1.415,83			1.415,83



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	566,33			566,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.61150/76				
	<b>Totais</b>	<b>319.662,20</b>			<b>319.662,20</b>



Data da Transação: 18/09/2020  
 Nº Controle: 885.481.920.457.547.787  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 3428 Conta de Débito: 28521-8

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858700031963 622003852023 620716202622 028822034930  
 Data do Pagamento: 18/09/2020  
 Número do Documento: 0716202620288220-3  
 Valor Total: R\$ 319.662,20  
 Autenticação Bancária: 035.526.318

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 3428, na data de pagamento.

### Autenticação

u9yA74E4 8@YQMh84 BRY\*2vm@ lhsgzG1k Vogj7rnY pu3J7#AE ?XRToS8Y jZJM57VR  
 Hrkg8NjR Tuc9Cqzb yTKoOFuT ET2bx#Xq S4fpxoPq Yq@fygNj FeEuy\*PS DNq69Q?m  
 sl2Uae9l @nxkMRV3 FHE5Nv50 ixndW\*K# dIlav8tr OO6UUQAs 00531820 001.009.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160 ,

Seu arquivo LuBMbGLCuZY00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/09/2020 às 10:21:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D878D0989A84F679..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** FILIPE SA BARRETO CARCELER:05798750752  
**Inscrição Transmissor:** 057.987.507-52

**Responsável:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 00.299.904/0001-60  
**Competência:** 08/2020  
**NRA:** LuBMbGLCuZY00005  
**Base de Processamento:** RJ - Rio de Janeiro  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** VANESSA NEVES  
**Telefone:** 002122521341

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0010

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda N° ARQUIVO: LuBMbGLCuZY0000-5  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 Pavimenta Rio AP4 N° CONTROLE: L6pHVO1u1590000-0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341 CNAE: 4222701  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	16.822,27	0,00	0,00	0,00	16.822,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	39.064,58	0,00	0,00	0,00	39.064,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.625,29	0,00	0,00	0,00	5.625,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.220,42	0,00	0,00	0,00	61.220,42
OUTRAS ENTIDADES	11.328,72	0,00	0,00	0,00	11.328,72
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.328,72	0,00	0,00	0,00	11.328,72
TOTAL A RECOLHER	72.549,14	0,00	0,00	0,00	72.549,14

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0039/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRIÇÃO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
VALDIR DOS SANTOS	0,00	0,00	108.06552.57-0 0,00	15/01/2014 0,00	01	0,00	23/08/2016 P1	0,00
LOHAN ANTUNES EDUARDO DA SILVA	2.908,56	0,00	133.98920.58-5 0,00	19/12/2012 270,65	01	05 232,68	01/08/2020 N3	03121 0,00
GUILHERME DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	161.84644.43-3 0,00	12/06/2014 0,00	01	0,00	04/08/2014 P1	0,00
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS	5.592,93	0,00	107.85252.52-2 0,00	14/10/2009 641,94	01	05 447,44		04101 0,00
ALEXANDRE DA CONCEICAO MARQUES	1.424,30	0,00	180.87178.29-2 0,00	09/03/2017 112,50	01	05 113,94		07170 0,00
ALEXSSANDE SILVA BARRETO DE FREITAS	1.879,06	0,00	212.15970.06-6 0,00	20/07/2015 153,43	01	05 150,32		05174 0,00
ANTONIO HENRIQUE NETO	1.920,47	0,00	124.69458.09-0 0,00	17/03/2020 157,16	01	05 153,64		07170 0,00
CARLOS ANTONIO DA FONSECA	2.157,58	0,00	123.33915.29-5 0,00	06/07/2012 180,53	01	05 172,61		07152 0,00
CELSO ALVES DA COSTA	3.079,68	0,00	124.37726.32-4 0,00	16/03/2020 291,18	01	05 246,38		07151 0,00
DENIS BEZERRA DA SILVA	4.757,99	0,00	128.72130.18-9 0,00	16/06/2014 525,05	01	05 380,64		04142 0,00
FABRICIO AURELIO DA SILVA BARROS	1.078,79	0,00	127.33024.54-1 0,00	21/03/2018 81,41	01	05 86,31		07152 0,00
FERNANDO JOSE AZEVEDO DOS SANTOS	10.115,06	0,00	128.93463.60-8 0,00	08/04/2008 713,08	01	05 809,21		02141 0,00
GILBERTO AUGUSTO FERRO COSTA ASSUMPCAO	10.115,06	0,00	124.34299.44-1 0,00	04/05/2009 713,08	01	05 809,21		02149 0,00
GIVANILDO SANTOS ANDRADE	3.328,84	0,00	128.17881.76-3 0,00	14/03/2016 324,97	01	05 266,31		04142 0,00
IVANILZA NUNES DOS SANTOS	1.543,64	0,00	127.22128.56-1 0,00	13/07/2011 123,24	01	05 123,50		05142 0,00
JOAO SANTOS GONCALVES BARBOSA	1.748,28	0,00	206.55546.13-2 0,00	17/03/2020 141,66	01	05 139,86		07170 0,00
JOSE RENATO MAIA TAVARES	10.115,06	0,00	123.71399.71-1 0,00	24/04/2012 713,08	01	05 809,21		02142 0,00
LUIZ CLAUDIO FERRARI CAMPOS	1.698,64	0,00	125.37720.80-8 0,00	11/03/2020 137,19	01	05 135,90		07170 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUIZ HENRIQUE COSTA DA SILVA	1.927,04	0,00	163.80689.12-6 0,00	17/03/2020 157,75	01	05 154,16		07170 0,00
MARCELO VIDAL DE NEGREIROS	2.157,58	0,00	124.05670.04-8 0,00	01/11/2002 180,53	01	05 172,61		07152 0,00
MARCIO DA SILVA DE SOUZA	1.743,98	0,00	228.20071.70-7 0,00	17/03/2020 141,27	01	05 139,51		07170 0,00
MARCOS VINICIUS SINGELLO PATROCINIO	2.844,56	0,00	136.24918.76-0 0,00	28/04/2016 262,97	01	05 227,56		03121 0,00
OSVALDO PECANHA SOBRINHO	12.049,34	0,00	122.79476.13-6 0,00	04/09/2009 713,08	01	05 963,95		02142 0,00
PEDRO IVO BASILIO ALVES	1.408,76	0,00	131.97016.52-0 0,00	01/06/2011 111,10	01	05 112,70		03516 0,00
RAFAEL DA ANUNCIACAO BARROS	3.693,29	0,00	129.97012.56-4 0,00	15/09/2014 375,99	01	05 295,46		03121 0,00
REINALDO RANGEL SOARES	1.895,45	0,00	107.90328.55-8 0,00	02/02/2009 154,91	01	05 151,64		05174 0,00
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA	3.350,35	0,00	129.29353.54-8 0,00	19/03/2020 327,98	01	05 268,03		03011 0,00
ROGERIO MARTINS	2.173,82	0,00	107.32770.01-4 0,00	16/03/2020 182,48	01	05 173,91		07825 0,00
ROMILDO HERMINIO DOS SANTOS	781,35	0,00	124.49836.54-5 0,00	11/02/2014 58,60	01	05 62,51		07170 0,00
SAMUEL JOSE ACIOLI	4.653,38	0,00	123.49206.84-1 0,00	10/08/2009 510,40	01	05 372,28		07102 0,00
SANDRO LEANDRO BATISTA DE MATTOS	2.171,49	0,00	129.17033.09-8 0,00	16/03/2020 182,20	01	05 173,72		07825 0,00
VINICIUS MARTINGIL PEREIRA	4.344,89	0,00	131.99557.54-5 0,00	14/09/2009 467,21	01	05 347,59		03516 0,00
MARCELO MARCOS DE FARIAS BRITTO	1,86	0,00	125.63691.60-7 0,01	25/03/2020 0,13	04	05 0,15	14/08/2020 J	07111 0,00
CARLOS HENRIQUE DE CASTILHO DA COSTA	0,17	0,00	133.29643.54-3 0,01	13/05/2020 0,01	04	05 0,01	04/08/2020 J	07151 0,00
CRISTIANO CIMINI GUALBERTO	1,86	0,00	164.95333.18-9 0,01	25/03/2020 0,13	04	05 0,14	24/08/2020 J	07111 0,00
ADAUTO LEAL DA SILVA	1.087,57	0,00	122.10053.51-1 0,00	17/08/2020 82,20	04	05 87,01		07825 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0041/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ADAUTO LEAL DA SILVA JUNIOR	738,65	0,00	160.03343.19-3 0,00	21/08/2020 55,39	04	05 59,09	07825 0,00
ADENILSON SILVA REIS CANDIDO	1.914,89	0,00	133.74430.56-1 0,00	27/04/2020 156,66	04	05 153,19	07170 0,00
ADJAILTON ALVES DA SILVA	482,30	0,00	152.30841.50-1 0,00	09/07/2020 36,17	04	05 38,58	07170 0,00
ALEXANDRE NOBREGA DO VALE	482,30	0,00	133.35471.56-2 0,00	09/07/2020 36,17	04	05 38,58	07170 0,00
AMAURI SEVERINO DE MENEZES	2.627,17	0,00	121.95737.82-6 0,00	25/06/2020 236,88	04	05 210,18	07152 0,00
ARIVALDO REIS FERREIRA	579,16	0,00	121.84422.75-6 0,00	18/08/2020 43,43	04	05 46,34	07825 0,00
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	1.993,39	0,00	207.15142.73-3 0,00	13/07/2020 163,72	04	05 159,47	07170 0,00
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS	2.790,85	0,00	201.29724.93-3 0,00	20/04/2020 256,53	04	05 223,26	07151 0,00
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA CARVALHO	1.731,14	0,00	212.89841.24-3 0,00	27/04/2020 140,12	04	05 138,49	07170 0,00
CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.352,26	0,00	127.29614.56-9 0,00	01/04/2020 203,89	04	05 188,19	07825 0,00
DAVID BATISTA NARDOTO CARVALHO	3.089,82	0,00	130.43848.54-2 0,00	21/07/2020 292,40	04	05 247,18	03011 0,00
DEVAYR PEDRO LUCIANO	2.155,57	0,00	122.92730.70-9 0,00	20/04/2020 180,29	04	05 172,45	05174 0,00
FABIO HENRIQUE FERNANDES	2.374,98	0,00	126.77106.14-2 0,00	27/04/2020 206,62	04	05 190,00	07821 0,00
FILIPE SALES DA COSTA	946,68	0,00	133.32674.60-8 0,00	09/07/2020 71,00	04	05 75,73	07170 0,00
GLAUCIO DIAS GUIMARAES MANCO	1.749,69	0,00	204.69303.81-0 0,00	27/04/2020 141,79	04	05 139,97	07170 0,00
HIGOR SOUZA MUNIZ	1.948,02	0,00	134.02792.58-2 0,00	22/04/2020 159,64	04	05 155,84	07170 0,00
HUGO RICARDO LEITE VIEIRA	2.209,91	0,00	165.58655.33-1 0,00	27/04/2020 186,81	04	05 176,79	07170 0,00
JESUS AFONSO DOS SANTOS	1.441,94	0,00	124.92162.39-9 0,00	09/07/2020 114,09	04	05 115,36	07170 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRIÇÃO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
JORGE LUIZ DE BARROS TORTURA	2.232,09	0,00	124.34438.15-8 0,00	06/05/2020 189,47	04	05 178,57	07825 0,00
JUAREZ ALMEIDA GONCALVES JUNIOR	4.494,83	0,00	131.61107.62-3 0,00	11/05/2020 488,21	04	05 359,58	04110 0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS DA SILVA	3.223,21	0,00	133.38530.62-4 0,00	09/07/2020 310,18	04	05 257,85	07152 0,00
JULIO CESAR VIEIRA DE PAULA	2.259,65	0,00	130.29223.58-1 0,00	27/04/2020 192,78	04	05 180,77	07825 0,00
MAGNO SANTOS DA SILVA	2.722,93	0,00	128.75298.56-0 0,00	27/04/2020 248,37	04	05 217,84	07151 0,00
MARCELO REIS LUIZ	312,60	0,00	182.21324.50-2 0,00	25/08/2020 23,44	04	05 25,00	07825 0,00
MARCIO SANTOS	1.014,94	0,00	125.37992.52-2 0,00	17/08/2020 76,12	04	05 81,20	07825 0,00
MARCOS SOARES DO NASCIMENTO	2.553,62	0,00	108.67010.13-1 0,00	27/04/2020 228,06	04	05 204,29	07825 0,00
OSVALDO MANOEL RODRIGUES DA SILVA	2.263,45	0,00	123.57248.21-3 0,00	27/05/2020 193,24	04	05 181,08	07825 0,00
RAFAEL MARTINS DA SILVA	1.888,61	0,00	166.53205.23-2 0,00	27/04/2020 154,29	04	05 151,08	07170 0,00
RAFAEL ROMAO ROSA	1.901,38	0,00	156.32854.27-6 0,00	06/05/2020 155,44	04	05 152,11	05174 0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA PINTO	6.354,57	0,00	165.58384.05-2 0,00	15/06/2020 713,08	04	05 508,36	07102 0,00
RONALDO ALVES DA COSTA	1.907,86	0,00	125.05511.73-1 0,00	27/04/2020 156,02	04	05 152,63	07170 0,00
SAMUEL MARCOS ALVES	1.699,12	0,00	207.16160.26-3 0,00	22/04/2020 137,24	04	05 135,92	07170 0,00
THIAGO LUCINDO FERREIRA	2.393,78	0,00	133.42835.56-6 0,00	19/05/2020 208,88	04	05 191,50	08181 0,00
VANDERLEI DAS NEVES ROGERIO	1.013,08	0,00	170.09013.28-2 0,00	17/08/2020 75,98	04	05 81,04	07825 0,00
VICTOR HUGO MARQUES DA SILVA	2.606,40	0,00	207.62428.25-7 0,00	29/04/2020 234,39	04	05 208,51	07825 0,00
WALDECI LUIS PIANNATA	361,73	0,00	166.35293.19-2 0,00	09/07/2020 27,12	04	05 28,93	07170 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0043/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA:00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
WALLACE ARMANDO DE CAMPOS PESSOA	3.112,07	0,00	133.60928.54-6 0,00	28/05/2020 295,07	04	05 248,96	07825 0,00
WALLACE MARTINS BISPO SANTOS	2.572,15	0,00	128.34763.89-7 0,00	27/05/2020 230,28	04	05 205,78	07825 0,00
WANDERSON SILVA PINTO	2.631,04	0,00	126.89561.56-7 0,00	23/07/2020 237,35	04	05 210,49	04142 0,00
WEVERSON DA SILVA LUIZ	2.316,91	0,00	166.89308.29-5 0,00	20/04/2020 199,65	04	05 185,35	05174 0,00
WILLIANS GONCALVES MARTINS	2.127,45	0,00	134.03055.27-1 0,00	22/04/2020 176,92	04	05 170,19	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

195.322,87 0,00 0,03 16.822,27 15.625,82 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
 HORA: 09:02:27  
 PÁG : 0044/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
 858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LuBMbGLCuZY0000-5  
 COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
 TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: L6pHVO1u1590000-0 INSCRICAO: 900035076179  
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	108.659,22	0,00	108.659,22	0,00
04	45	86.663,65	0,00	86.663,65	0,03
TOTAIS:	75	195.322,87	0,00	195.322,87	0,03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG: 0045/0053

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LuBMbGLCuZY0000-5  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: L6pHVO1u1590000-0 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021 2252 1341 CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	72.549,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.822,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	291,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	3	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

## RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016

858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° ARQUIVO: LuBMbGLCuZY0000-5  
 N° CONTROLE: 06aQwkBdW140000-6  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88 COD REC: 155 COMP: 08/2020

TOMADOR/OBRA : 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRIÇÃO: 900035076179 N° CONTROLE: L6pHVO1u1590000-0  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 ESTRADA DA LIGACAO SN DIVERSOS LOGRADOUROS JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO 22713470 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	195.322,87	REM SEM 13° SALÁRIO	195.322,87
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	15.625,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	75

## TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	195.322,87	REM SEM 13° SALÁRIO	195.322,87
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	16.822,27	DEPÓSITO	15.625,82
VAL DEVIDO PREV SOC	72.549,14	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	75

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/09/2020  
 HORA: 09:02:27  
 PÁG : 001/002

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60	0079	2100 507
31.807,32	77.967,41	18.270,63	97,24	0,00	127.948,12 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512244823975	0079	2208 507
3.047,61	7.288,80	1.847,68	0,00	0,00	12.184,09 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512272531874	0079	2208 507
4.312,68	12.389,09	2.953,80	97,24	0,00	19.558,33 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512320810072	0079	2208 507
733,71	2.055,57	521,08	0,00	0,00	3.310,36 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512344957777	0079	2208 507
329,10	768,39	194,78	0,00	0,00	1.292,27 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578	0079	2208 507
2.343,28	6.584,57	1.669,16	48,62	0,00	10.548,39 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/09/2020  
 HORA: 09:02:27  
 PÁG : 002/002

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073		0079	2208	507
223,88	576,29	146,08	0,00	0,00	0,00	946,25	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278		0079	2208	507
259,72	644,64	163,41	0,00	0,00	0,00	1.067,77	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900027219372		0079	2208	507
5.121,13	12.472,91	3.124,73	145,86	0,00	0,00	20.572,91	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900035076179		0079	2208	507
16.822,27	44.689,87	11.328,72	291,72	0,00	0,00	72.549,14	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900036115076		0079	2208	507
8.427,06	22.112,76	5.474,55	0,00	0,00	0,00	36.014,37	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/09/2020

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 09:02:27

PÁG : 001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 08/2020

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	261	1
REMUNERAÇÃO	777.917,24	696,87
DEPÓSITO	62.233,37	13,93
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	62.233,37	13,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008056	Adauto Leal da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,39	2,32		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.087,57
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,34	5,62		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		718,40		B110 - Base IRRF Salário	1.087,57
0268 Descanso Semanal Remunerado			155,37		B120 - Dedução IRRF Salário	82,19
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		70,53		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	82,19
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		23,51		B400 - Base FGTS Salário	1.087,57
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		70,53		B410 - FGTS Salário 8%	87,01
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	40:43	29,23		B900 - Remuneração Total Mês	718,40
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	1:52	12,06		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				82,20		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>1.087,57</b>	<b>110,55</b>	- Admitido em 17/08/2020	
<b>Líquido</b>			<b>977,02</b>			
<b>008062 Adauto Leal da Silva Junior</b>						
008062	Adauto Leal da Silva Junior	200:00	Motorista de Caminhão I	21/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,03	7,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	738,65
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,59	2,29		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		466,96		B110 - Base IRRF Salário	738,65
0268 Descanso Semanal Remunerado			105,52		B120 - Dedução IRRF Salário	55,39
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		46,21		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	55,39
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		15,40		B400 - Base FGTS Salário	738,65
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		46,21		B410 - FGTS Salário 8%	59,09
0400 Salário Família		1	48,62		B900 - Remuneração Total Mês	466,96
1010 H. E. 50%	P	1:00	13,47		B905 - Salário Hora	8,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	25:34	11,91		B920 - Base Salário Família	166,17
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	5:37	23,56			
5010 INSS				55,39		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>787,27</b>	<b>83,74</b>	- Admitido em 21/08/2020	
<b>Líquido</b>			<b>703,53</b>			
<b>007998 Adenilson Silva Reis Candido</b>						
007998	Adenilson Silva Reis Candido	200:00	Servente	27/04/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4	23,62		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.914,89
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	6,75		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.914,89
0268 Descanso Semanal Remunerado			273,56		B120 - Dedução IRRF Salário	156,65
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		117,28		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	156,65
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,09		B400 - Base FGTS Salário	1.914,89
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,28		B410 - FGTS Salário 8%	153,19
1020 H. E. 70%	P	9:16	110,59		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:46	35,12		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	1:01	12,24		B920 - Base Salário Família	461,97
5010 INSS				156,66		
<b>Totais</b>			<b>1.914,89</b>	<b>156,66</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.758,23</b>			
<b>008043 Adjailton Alves da Silva</b>						
008043	Adjailton Alves da Silva	220:00	Servente	09/07/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		336,96		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	482,30
0268 Descanso Semanal Remunerado			68,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		32,76		B110 - Base IRRF Salário	482,30
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		10,92		B120 - Dedução IRRF Salário	36,17
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		32,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	36,17
5010 INSS				36,17	B400 - Base FGTS Salário	482,30
					B410 - FGTS Salário 8%	38,58
					B900 - Remuneração Total Mês	336,96
					B905 - Salário Hora	7,02

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>482,30</b>	<b>36,17</b>			
<b>Líquido</b>		<b>446,13</b>				
<b>007867</b>	<b>Adriano Oliveira da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>25/02/2019</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	8,63
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>000513</b>	<b>Airton Goncalves dos Santos</b>	<b>220:00</b>	<b>Encarregado Administrativo III</b>	<b>14/10/2009</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	5.592,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.592,93
5010 INSS				641,94	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				46,52	B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant)	189,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				393,50	B110 - Base IRRF Salário	3.355,76
5310 Adiantamento Salarial				1.843,67	B120 - Dedução IRRF Salário	641,94
5700 Vale Transporte				55,93	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	641,94
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	1.242,88
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	96,17
					B400 - Base FGTS Salário	5.592,93
					B410 - FGTS Salário 8%	447,43
					B900 - Remuneração Total Mês	5.592,93
					B903 - Salário Mês	5.592,93
<b>Totais</b>		<b>5.592,93</b>	<b>2.981,56</b>			
<b>Líquido</b>		<b>2.611,37</b>				
<b>E00086</b>	<b>Alecio Guimaraes</b>	<b>150:00</b>	<b>Estagiário</b>	<b>19/05/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0080 Bolsa Auxílio		30	1.600,00		B110 - Base IRRF Salário	1.215,19
1870 Adicional Noturno (Bolsa Auxílio)	I	23:55	255,19		B900 - Remuneração Total Mês	1.600,00
5310 Adiantamento Salarial				640,00	B903 - Salário Mês	1.600,00
<b>Totais</b>		<b>1.855,19</b>	<b>640,00</b>			
<b>Líquido</b>		<b>1.215,19</b>				
<b>007324</b>	<b>Alexandre da Conceicao Marques</b>	<b>165:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/03/2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.172,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.424,30
0190 DSR s/ Salário Variável		5,44	40,69		B110 - Base IRRF Salário	955,49
1010 H. E. 50%	P	10:20	110,05		B120 - Dedução IRRF Salário	112,50
1020 H. E. 70%	P	6:00	72,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	112,50
1040 H. E. 100%	P	2:03	29,11		B400 - Base FGTS Salário	1.424,30
3936 Ajuda Compensatória Mensal 8 %	A		87,90		B410 - FGTS Salário 8%	113,94
5010 INSS				112,50	B900 - Remuneração Total Mês	1.172,03
5310 Adiantamento Salarial				468,81	B903 - Salário Mês	1.172,03
5700 Vale Transporte				11,72		
<b>Totais</b>		<b>1.512,20</b>	<b>593,03</b>			
<b>Líquido</b>		<b>919,17</b>				
<b>008036</b>	<b>Alexandre Nobrega do Vale</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/07/2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0261 Intermitente Horas	I		336,96		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	482,30
0268 Descanso Semanal Remunerado			68,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		32,76		B110 - Base IRRF Salário	482,30
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		10,92		B120 - Dedução IRRF Salário	36,17
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		32,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	36,17
0400 Salário Família		1	48,62		B400 - Base FGTS Salário	482,30
5010 INSS				36,17	B410 - FGTS Salário 8%	38,58
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35	B900 - Remuneração Total Mês	336,96
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	76,44

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>530,92</b>	<b>64,52</b>			
<b>Líquido</b>			<b>466,40</b>			
<b>006213</b>	<b>Alexssande Silva Barreto de Freitas</b>	<b>180:00</b>	<b>Vigia</b>	<b>20/07/2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.879,06
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,34	41,20		B110 - Base IRRF Salário	1.229,62
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	118:46	214,26		B120 - Dedução IRRF Salário	153,43
5010 INSS				153,43	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,43
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.879,06
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	150,32
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>		<b>1.879,06</b>	<b>819,11</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.059,95</b>			
<b>008027</b>	<b>Amauri Severino de Menezes</b>	<b>200:00</b>	<b>Pedreiro</b>	<b>25/06/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		4,33	36,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.627,17
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	9,17		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.597,68		B110 - Base IRRF Salário	2.627,17
0268 Descanso Semanal Remunerado			375,31		B120 - Dedução IRRF Salário	236,88
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		159,26		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	236,88
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		53,09		B400 - Base FGTS Salário	2.627,17
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		159,26		B410 - FGTS Salário 8%	210,17
1020 H. E. 70%	P	10:35	171,10		B900 - Remuneração Total Mês	1.597,68
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:51	47,70		B905 - Salário Hora	9,51
1064 H. E. Not. 70%	P	1:07	18,20			
5010 INSS				236,88		
5110 IRRF				22,25		
<b>Totais</b>		<b>2.627,17</b>	<b>259,13</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.368,04</b>			
<b>007951</b>	<b>Antonio Henrique Neto</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>17/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.920,47
0190 DSR s/ Salário Variável		4,57	34,74		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,42	25,92		B110 - Base IRRF Salário	1.302,71
1040 H. E. 100%	P	12:00	168,48		B120 - Dedução IRRF Salário	157,16
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	95:59	134,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	157,16
1064 H. E. Not. 70%	P	0:51	12,17		B400 - Base FGTS Salário	1.920,47
5010 INSS				157,16	B410 - FGTS Salário 8%	153,64
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				14,45	B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>		<b>1.920,47</b>	<b>789,37</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.131,10</b>			
<b>008059</b>	<b>Arivaldo Reis Ferreira</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>18/08/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,55	1,82		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	579,16
0261 Intermitente Horas	I		395,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			82,74		B110 - Base IRRF Salário	579,16
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		38,57		B120 - Dedução IRRF Salário	43,43
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		12,86		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	43,43
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		38,57		B400 - Base FGTS Salário	579,16
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	23:56	9,48		B410 - FGTS Salário 8%	46,33
5010 INSS				43,43	B900 - Remuneração Total Mês	395,12
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35	B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>		<b>579,16</b>	<b>71,78</b>	<b>- Admitido em 18/08/2020</b>		
<b>Líquido</b>			<b>507,38</b>			

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007969	Artur Alberto Paula Da Silva	200:00	Operador de Rolo Compactador	25/03/2020	2	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
1510 Insuficiência de Saldo			26,90		B905 - Salário Hora	10,28
7010 Insuficiência de Saldo				26,90		
<b>Totais</b>			<b>26,90</b>	<b>26,90</b>		
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
008049	Bruno de Oliveira Silva	200:00	Servente	13/07/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		6,56	40,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.993,39
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.993,39
0268 Descanso Semanal Remunerado			284,77		B120 - Dedução IRRF Salário	163,72
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		118,18		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	163,72
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,39		B400 - Base FGTS Salário	1.993,39
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		118,18		B410 - FGTS Salário 8%	159,47
1020 H. E. 70%	P	17:49	212,62		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
5010 INSS				163,72	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>1.993,39</b>	<b>163,72</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.829,67</b>		
008054	Bruno Humelino Machado	200:00	Operador de Rolo Compactador	17/08/2020	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
1510 Insuficiência de Saldo			309,95		B905 - Salário Hora	10,28
5700 Vale Transporte				281,60		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>309,95</b>	<b>309,95</b>	- Admitido em 17/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
007972	Bruno Miranda dos Santos	200:00	Operador de Máquinas Pesadas I	20/04/2020	2	3
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,47	32,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.790,85
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	9,99		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		1.727,04		B110 - Base IRRF Salário	2.790,85
0268 Descanso Semanal Remunerado			398,69		B120 - Dedução IRRF Salário	256,52
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		171,58		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	256,52
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		57,19		B400 - Base FGTS Salário	2.790,85
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		171,58		B410 - FGTS Salário 8%	223,27
1020 H. E. 70%	P	9:30	166,02		B900 - Remuneração Total Mês	1.727,04
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	30:03	51,93		B905 - Salário Hora	10,28
1064 H. E. Not. 70%	P	0:14	4,11		B920 - Base Salário Família	665,12
5010 INSS				256,53		
<b>Totais</b>			<b>2.790,85</b>	<b>256,53</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.534,32</b>		
008004	Caio Marcio Joia da Silva	180:00	Vigia	06/05/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,38
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
001991	Carlos Antonio da Fonseca	220:00	Pedreiro	06/07/2012	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.157,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
5010 INSS				180,53	B110 - Base IRRF Salário	1.294,55
5310 Adiantamento Salarial				863,03	B120 - Dedução IRRF Salário	180,53
5700 Vale Transporte				21,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,53
					B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
					B903 - Salário Mês	2.157,58

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>2.157,58</b>	<b>1.065,14</b>			
<b>Líquido</b>		<b>1.092,44</b>				
<b>007997</b>	<b>Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,09	18,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.731,14
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	6,59		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	1.731,14
0268 Descanso Semanal Remunerado			247,31		B120 - Dedução IRRF Salário	140,12
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		112,89		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	140,12
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		37,63		B400 - Base FGTS Salário	1.731,14
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		112,89		B410 - FGTS Salário 8%	138,49
1020 H. E. 70%	P	7:13	86,12		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:46	34,29		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:43	8,42		B920 - Base Salário Família	417,01
5010 INSS				140,12		
5624 Faltas (H)	P	8:00		46,08		
5625 DSR s/ Faltas	P	1		38,38		
<b>Totais</b>		<b>1.815,60</b>	<b>224,58</b>			
<b>Líquido</b>		<b>1.591,02</b>				
<b>007960</b>	<b>Carlos Eduardo Santos do Carmo</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Espargidor</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	10,28
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>008010</b>	<b>Carlos Henrique de Castilho da Costa</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Rolo Compactador</b>	<b>13/05/2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0261 Intermitente Horas	I		0,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	0,17
3090 Rescisão Negativa			41,25		B102 - Dependentes IRRF 13°	379,18
5010 INSS				0,01	B110 - Base IRRF Salário	0,17
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		41,41	B120 - Dedução IRRF Salário	0,01
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	0,01
					B400 - Base FGTS Salário	0,17
					B410 - FGTS Salário 8%	0,01
					B960 - Média - Aviso Prévio	41,24
<b>Totais</b>		<b>41,42</b>	<b>41,42</b>	<b>- Desligado em 04/08/2020 (A Pedido (Espontâneo))</b>		
<b>Líquido</b>		<b>0,00</b>				
<b>007948</b>	<b>Celso Alves da Costa</b>	<b>220:00</b>	<b>Operador de Fresadora II</b>	<b>16/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.800,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.079,68
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,33	45,11		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:08	234,57		B110 - Base IRRF Salário	1.959,68
5010 INSS				291,18	B120 - Dedução IRRF Salário	291,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				26,72	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	291,18
5310 Adiantamento Salarial				1.093,28	B400 - Base FGTS Salário	3.079,68
5700 Vale Transporte				25,29	B410 - FGTS Salário 8%	246,37
					B900 - Remuneração Total Mês	2.800,00
					B903 - Salário Mês	2.800,00
					B920 - Base Salário Família	3.079,68
<b>Totais</b>		<b>3.079,68</b>	<b>1.436,47</b>			
<b>Líquido</b>		<b>1.643,21</b>				

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007961	Cristiano Cimini Gualberto	200:00	Rastilheiro	25/03/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		1,59		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1,86
0268 Descanso Semanal Remunerado			0,27		B102 - Dependentes IRRF 13°	568,77
3090 Rescisão Negativa			29,02		B110 - Base IRRF Salário	1,86
5010 INSS				0,13	B120 - Dedução IRRF Salário	0,13
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		30,75	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	0,13
					B400 - Base FGTS Salário	1,86
					B410 - FGTS Salário 8%	0,15
					B960 - Média - Aviso Prévio	29,16
<b>Totais</b>			<b>30,88</b>	<b>30,88</b>	- Desligado em 24/08/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>			<b>0,00</b>			
007967	Cristiano Nascimento Da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	01/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,03	21,36		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.352,26
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,35	25,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.400,88		B110 - Base IRRF Salário	2.352,26
0268 Descanso Semanal Remunerado			336,04		B120 - Dedução IRRF Salário	203,89
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		140,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	203,89
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		46,73		B400 - Base FGTS Salário	2.352,26
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		140,20		B410 - FGTS Salário 8%	188,18
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	93:19	130,64		B900 - Remuneração Total Mês	1.400,88
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	8:49	111,09		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				203,89		
<b>Totais</b>			<b>2.352,26</b>	<b>203,89</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.148,37</b>			
008050	David Batista Nardoto Carvalho	220:00	Laboratorista I	21/07/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,41	66,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.089,82
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,35	27,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		1.672,00		B110 - Base IRRF Salário	3.089,82
0268 Descanso Semanal Remunerado			441,40		B120 - Dedução IRRF Salário	292,40
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		170,59		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	292,40
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		56,86		B400 - Base FGTS Salário	3.089,82
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		170,59		B410 - FGTS Salário 8%	247,19
1020 H. E. 70%	P	1:00	17,77		B900 - Remuneração Total Mês	1.672,00
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	93:15	141,74		B905 - Salário Hora	10,45
1064 H. E. Not. 70%	P	21:00	325,58		B920 - Base Salário Família	976,42
5010 INSS				292,40		
5110 IRRF				24,35		
<b>Totais</b>			<b>3.089,82</b>	<b>316,75</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.773,07</b>			
004387	Denis Bezerra da Silva	220:00	Apontador	16/06/2014	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.757,99
0190 DSR s/ Salário Variável		33,16	371,34		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	78:15	1.484,56		B110 - Base IRRF Salário	3.775,71
1040 H. E. 100%	P	20:00	446,40		B120 - Dedução IRRF Salário	525,05
5010 INSS				525,05	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	525,05
5110 IRRF				75,92	B400 - Base FGTS Salário	4.757,99
5120 IRRF s/ Adiantamento				178,09	B410 - FGTS Salário 8%	380,64
5310 Adiantamento Salarial				804,19	B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
5700 Vale Transporte				24,56	B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	4.757,99
<b>Totais</b>			<b>4.757,99</b>	<b>1.607,81</b>		
<b>Líquido</b>			<b>3.150,18</b>			

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007975	Devayr Pedro Luciano	180:00	Vigia	20/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,37	34,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.155,57
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			307,94		B110 - Base IRRF Salário	2.155,57
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		132,08		B120 - Dedução IRRF Salário	180,29
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		44,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,29
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		132,08		B400 - Base FGTS Salário	2.155,57
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	119:55	177,00		B410 - FGTS Salário 8%	172,45
5010 INSS				180,29	B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	519,23
<b>Totais</b>			<b>2.155,57</b>	<b>180,29</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.975,28</b>		
<b>008001 Fabio Henrique Fernandes</b>						
				200:00	Sinaleiro	27/04/2020 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,59	15,21		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.374,98
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,07	8,61		B110 - Base IRRF Salário	2.374,98
0261 Intermitente Horas	I		1.535,04		B120 - Dedução IRRF Salário	206,62
0268 Descanso Semanal Remunerado			339,28		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	206,62
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		151,29		B400 - Base FGTS Salário	2.374,98
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,43		B410 - FGTS Salário 8%	190,00
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		151,29		B900 - Remuneração Total Mês	1.535,04
1020 H. E. 70%	P	6:02	75,69		B905 - Salário Hora	7,38
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:08	44,75			
1064 H. E. Not. 70%	P	0:13	3,39			
5010 INSS				206,62		
5110 IRRF				19,83		
<b>Totais</b>			<b>2.374,98</b>	<b>226,45</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.148,53</b>		
<b>007735 Fabricio Aurelio da Silva Barros</b>						
				110:00	Pedreiro	21/03/2018 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.019,13		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.078,79
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada	I	6:05	59,66		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
3936 Ajuda Compensatória Mensal 30 %	A		323,64		B110 - Base IRRF Salário	647,27
5010 INSS				81,41	B120 - Dedução IRRF Salário	81,40
5310 Adiantamento Salarial				431,52	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	81,40
5700 Vale Transporte				10,79	B400 - Base FGTS Salário	1.078,79
					B410 - FGTS Salário 8%	86,30
					B900 - Remuneração Total Mês	1.078,79
					B903 - Salário Mês	1.078,79
<b>Totais</b>			<b>1.402,43</b>	<b>523,72</b>		
<b>Líquido</b>				<b>878,71</b>		
<b>000058 Fernando Jose Azevedo dos Santos</b>						
				220:00	Arquiteto	08/04/2008 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilometragem	I		3.534,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
5110 IRRF				551,39	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.534,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.664,04
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
					B920 - Base Salário Família	10.115,06

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>13.649,06</b>	<b>8.844,49</b>			
<b>Líquido</b>			<b>4.804,57</b>			
<b>008037</b>	<b>Filipe Sales da Costa</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/07/2020</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,41	10,85		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	946,68
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,59	2,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		589,68		B110 - Base IRRF Salário	946,68
0268 Descanso Semanal Remunerado			135,24		B120 - Dedução IRRF Salário	71,00
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		58,51		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	71,00
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		19,50		B400 - Base FGTS Salário	946,68
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		58,51		B410 - FGTS Salário 8%	75,73
0400 Salário Família		2	97,24		B900 - Remuneração Total Mês	589,68
1020 H. E. 70%	P	2:24	28,64		B905 - Salário Hora	7,02
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	25:33	15,07		B920 - Base Salário Família	221,76
1064 H. E. Not. 70%	P	4:37	27,78			
5010 INSS				71,00		
<b>Totais</b>		<b>1.043,92</b>	<b>71,00</b>			
<b>Líquido</b>			<b>972,92</b>			
<b>007989</b>	<b>Francisco Joaquim Pereira</b>	<b>200:00</b>	<b>Encarregado de Pavimentação I</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	17,27
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>007982</b>	<b>Geroncio de Jesus Cardial</b>	<b>200:00</b>	<b>Rastilheiro</b>	<b>22/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>000249</b>	<b>Gilberto Augusto Ferro Costa Assumpcao</b>	<b>220:00</b>	<b>Engenheiro de Segurança do Trabalho</b>	<b>04/05/2009</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.828,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5110 IRRF				499,25	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,66	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5310 Adiantamento Salarial				2.933,36	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.828,50	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.611,91
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>		<b>13.943,56</b>	<b>9.086,85</b>			
<b>Líquido</b>			<b>4.856,71</b>			



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
006807	Givanildo Santos Andrade	220:00	Apontador	14/03/2016	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.328,84
0190 DSR s/ Salário Variável		12,37	140,83		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	38:36	732,32		B110 - Base IRRF Salário	2.346,56
5010 INSS				324,97	B120 - Dedução IRRF Salário	324,96
5120 IRRF s/ Adiantamento				67,54	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	324,96
5310 Adiantamento Salarial				914,74	B400 - Base FGTS Salário	3.328,84
5700 Vale Transporte				24,56	B410 - FGTS Salário 8%	266,31
					B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
					B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	3.328,84
<b>Totais</b>			<b>3.328,84</b>	<b>1.331,81</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.997,03</b>		
<b>007996 Glauco Dias Guimaraes Manco</b>						
				200:00	Servente	27/04/2020 2 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,04	5,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.749,69
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,23	18,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.095,12		B110 - Base IRRF Salário	1.749,69
0268 Descanso Semanal Remunerado			249,96		B120 - Dedução IRRF Salário	141,78
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		108,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,78
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		36,19		B400 - Base FGTS Salário	1.749,69
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		108,57		B410 - FGTS Salário 8%	139,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	87:53	96,32		B900 - Remuneração Total Mês	1.095,12
1064 H. E. Not. 70%	P	2:44	30,56		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				141,79	B920 - Base Salário Família	404,61
<b>Totais</b>			<b>1.749,69</b>	<b>141,79</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.607,90</b>		
<b>004350 Guilherme Dias de Oliveira</b>						
				220:00	Servente	12/06/2014 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>					- Afastado desde: 04/08/2014 Motivo: Auxílio Doença	
<b>Líquido</b>						
<b>007977 Higor Souza Muniz</b>						
				200:00	Servente	22/04/2020 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,46	28,15		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.948,02
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,08	6,66		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.948,02
0268 Descanso Semanal Remunerado			278,29		B120 - Dedução IRRF Salário	159,63
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		117,66		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,63
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,22		B400 - Base FGTS Salário	1.948,02
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,66		B410 - FGTS Salário 8%	155,84
1020 H. E. 70%	P	12:16	146,39		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:21	34,63		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				159,64	B920 - Base Salário Família	490,37
<b>Totais</b>			<b>1.948,02</b>	<b>159,64</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.788,38</b>		

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007994	Hugo Ricardo Leite Vieira	200:00	Servente	27/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,20	40,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.209,91
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	7,42		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B110 - Base IRRF Salário	2.209,91
0268 Descanso Semanal Remunerado			315,70		B120 - Dedução IRRF Salário	186,81
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,74		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	186,81
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,25		B400 - Base FGTS Salário	2.209,91
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,74		B410 - FGTS Salário 8%	176,79
1020 H. E. 70%	P	7:39	91,30		B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
1040 H. E. 100%	P	8:01	112,55		B905 - Salário Hora	7,02
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:52	38,59			
1064 H. E. Not. 70%	P	0:41	9,01			
5010 INSS				186,81		
<b>Totais</b>			<b>2.209,91</b>	<b>186,81</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.023,10</b>		
<b>008055 Hurciel de Sousa Barbosa</b>						
		200:00	Operador de Bob Cat	17/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510 Insuficiência de Saldo			370,70		B905 - Salário Hora	10,28
5700 Vale Transporte				370,70		
<b>Totais</b>			<b>370,70</b>	<b>370,70</b>	- Admitido em 17/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>001339 Ivanilza Nunes dos Santos</b>						
		220:00	Auxiliar de Serviços Gerais	13/07/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.543,64		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.543,64
5010 INSS				123,24	B110 - Base IRRF Salário	926,18
5310 Adiantamento Salarial				617,46	B120 - Dedução IRRF Salário	123,24
5700 Vale Transporte				15,44	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,24
					B400 - Base FGTS Salário	1.543,64
					B410 - FGTS Salário 8%	123,49
					B900 - Remuneração Total Mês	1.543,64
					B903 - Salário Mês	1.543,64
<b>Totais</b>			<b>1.543,64</b>	<b>756,14</b>		
<b>Líquido</b>				<b>787,50</b>		
<b>008038 Jesus Afonso dos Santos</b>						
		200:00	Servente	09/07/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,30	15,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.441,94
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	5,15		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		898,56		B110 - Base IRRF Salário	1.441,94
0268 Descanso Semanal Remunerado			205,99		B120 - Dedução IRRF Salário	114,09
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		89,16		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	114,09
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		29,72		B400 - Base FGTS Salário	1.441,94
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		89,16		B410 - FGTS Salário 8%	115,36
1020 H. E. 70%	P	6:24	76,38		B900 - Remuneração Total Mês	898,56
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:48	26,76		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:35	5,34			
5010 INSS				114,09		
<b>Totais</b>			<b>1.441,94</b>	<b>114,09</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.327,85</b>		

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007950	João Santos Gonçalves Barbosa	220:00	Servente	17/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.748,28
0190 DSR s/ Salário Variável		0,46	5,33		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,56	27,56		B110 - Base IRRF Salário	1.130,52
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	102:04	143,30		B120 - Dedução IRRF Salário	141,66
1064 H. E. Not. 70%	P	1:56	27,69		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,66
5010 INSS				141,66	B400 - Base FGTS Salário	1.748,28
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B410 - FGTS Salário 8%	139,86
5700 Vale Transporte				14,45	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.748,28</b>	<b>773,87</b>		
<b>Líquido</b>				<b>974,41</b>		
<b>008007 Jorge Luiz de Barros Tortura</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	06/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,07	0,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.232,09
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,10	22,72		B110 - Base IRRF Salário	2.232,09
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B120 - Dedução IRRF Salário	189,47
0268 Descanso Semanal Remunerado			318,87		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	189,47
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		141,71		B400 - Base FGTS Salário	2.232,09
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		47,24		B410 - FGTS Salário 8%	178,57
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		141,71		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	82:17	118,16		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:19	4,09			
5010 INSS				189,47		
5110 IRRF				10,40		
<b>Totais</b>			<b>2.232,09</b>	<b>199,87</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.032,22</b>		
<b>001902 Jose Renato Maia Tavares</b>						
		220:00	Engenheiro Civil	24/04/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.828,50		B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5010 INSS				713,08	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5110 IRRF				603,53	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.716,18
5350 Adiantamento de Folha	G			3.828,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>13.943,56</b>	<b>9.191,13</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.752,43</b>		
<b>008009 Juarez Almeida Goncalves Junior</b>						
		200:00	Assistente Administrativo I	11/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		14,16	151,31		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.494,83
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,08	43,84		B110 - Base IRRF Salário	4.494,83
0261 Intermitente Horas	I		2.122,16		B120 - Dedução IRRF Salário	488,20
0268 Descanso Semanal Remunerado			642,12		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	488,20
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		223,13		B400 - Base FGTS Salário	4.494,83
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		74,38		B410 - FGTS Salário 8%	359,59
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		223,13		B900 - Remuneração Total Mês	2.122,16
1020 H. E. 70%	P	2:05	45,83		B905 - Salário Hora	12,94
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	107:26	227,97			
1064 H. E. Not. 70%	P	34:14	740,96			
5010 INSS				488,21		
5110 IRRF				265,36		
<b>Totais</b>			<b>4.494,83</b>	<b>753,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.741,26</b>		

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008039	Julio Cesar dos Santos da Silva	200:00	Pedreiro	09/07/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		13,27	110,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.223,21
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,59	8,04		B110 - Base IRRF Salário	3.223,21
0261 Intermitente Horas	I		1.635,72		B120 - Dedução IRRF Salário	310,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			460,46		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	310,18
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		169,20		B400 - Base FGTS Salário	3.223,21
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		56,40		B410 - FGTS Salário 8%	257,86
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		169,20		B900 - Remuneração Total Mês	1.635,72
1020 H. E. 70%	P	21:11	342,47		B905 - Salário Hora	9,51
1040 H. E. 100%	P	8:02	152,79			
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	25:34	41,83			
1064 H. E. Not. 70%	P	4:37	77,04			
5010 INSS				310,18		
5110 IRRF				82,15		
<b>Totais</b>			<b>3.223,21</b>	<b>392,33</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.830,88</b>		
007985	Julio Cesar Vieira de Paula	200:00	Motorista de Caminhão Espargidor	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,23	9,73		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.259,65
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,29	24,35		B110 - Base IRRF Salário	2.259,65
0261 Intermitente Horas	I		1.400,88		B120 - Dedução IRRF Salário	192,78
0268 Descanso Semanal Remunerado			322,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	192,78
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		139,13		B400 - Base FGTS Salário	2.259,65
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		46,38		B410 - FGTS Salário 8%	180,77
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		139,13		B900 - Remuneração Total Mês	1.400,88
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	90:27	126,63		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	4:01	50,61			
5010 INSS				192,78		
5110 IRRF				12,22		
<b>Totais</b>			<b>2.259,65</b>	<b>205,00</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.054,65</b>		
008053	Lohan Antunes Eduardo da Silva	220:00	Técnico em Edificações	19/12/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.908,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.908,56
5010 INSS				270,65	B110 - Base IRRF Salário	1.745,14
5120 IRRF s/ Adiantamento				55,04	B120 - Dedução IRRF Salário	270,65
5310 Adiantamento Salarial				1.108,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,65
					B400 - Base FGTS Salário	2.908,56
					B410 - FGTS Salário 8%	232,68
					B900 - Remuneração Total Mês	2.908,56
					B903 - Salário Mês	2.908,56
<b>Totais</b>			<b>2.908,56</b>	<b>1.434,07</b>	- Entrada por Transferencia 01/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>1.474,49</b>		
008000	Luiz Alberto Lemos Correa	200:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	10,28
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007936	Luiz Claudio Ferrari Campos	220:00	Servente	11/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.698,64
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,33	24,88		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:08	129,36		B110 - Base IRRF Salário	1.080,88
5010 INSS				137,19	B120 - Dedução IRRF Salário	137,19
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	137,19
5700 Vale Transporte				14,45	B400 - Base FGTS Salário	1.698,64
					B410 - FGTS Salário 8%	135,89
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.698,64</b>	<b>769,40</b>		
<b>Líquido</b>				<b>929,24</b>		
<b>007954 Luiz Henrique Costa da Silva</b>						
		220:00	Servente	17/03/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.927,04
0190 DSR s/ Salário Variável		4,54	34,34		B110 - Base IRRF Salário	1.309,28
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,54	27,38		B120 - Dedução IRRF Salário	157,75
1040 H. E. 100%	P	11:00	154,44		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	157,75
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	101:24	142,37		B400 - Base FGTS Salário	1.927,04
1064 H. E. Not. 70%	P	1:41	24,11		B410 - FGTS Salário 8%	154,16
5010 INSS				157,75	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B903 - Salário Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				14,45		
<b>Totais</b>			<b>1.927,04</b>	<b>789,96</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.137,08</b>		
<b>007988 Magno Santos da Silva</b>						
		200:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,13	0,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	253,02
0261 Intermitente Horas	I		164,48		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0268 Descanso Semanal Remunerado			36,15		B110 - Base IRRF Salário	253,02
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		21,97		B120 - Dedução IRRF Salário	18,97
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		7,33		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	18,97
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		21,97		B400 - Base FGTS Salário	253,02
0400 Salário Família		2	97,24		B410 - FGTS Salário 8%	20,24
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	5:43	0,94		B900 - Remuneração Total Mês	164,48
5010 INSS				18,97	B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	52,39
<b>Totais</b>			<b>350,26</b>	<b>18,97</b>		
<b>Líquido</b>				<b>331,29</b>		
<b>007965 Marcelo Marcos de Farias Britto</b>						
		200:00	Rastilheiro	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		1,59		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1,86
0268 Descanso Semanal Remunerado			0,27		B102 - Dependentes IRRF 13º	189,59
3090 Rescisão Negativa			31,58		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
5010 INSS				0,13	B110 - Base IRRF Salário	1,86
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		33,31	B120 - Dedução IRRF Salário	0,13
					B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.817,25
					B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	147,87
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	0,13
					B400 - Base FGTS Salário	1,86
					B410 - FGTS Salário 8%	0,15
					B960 - Média - Aviso Prévio	31,72
<b>Totais</b>			<b>33,44</b>	<b>33,44</b>	- Desligado em 14/08/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008063	Marcelo Reis Luiz	200:00	Motorista de Caminhão I	25/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,31	0,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	312,60
0261 Intermitente Horas	I		215,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			44,66		B110 - Base IRRF Salário	312,60
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		21,00		B120 - Dedução IRRF Salário	23,44
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		7,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	23,44
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		21,00		B400 - Base FGTS Salário	312,60
0400 Salário Família		1	48,62		B410 - FGTS Salário 8%	25,01
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	13:18	2,87		B900 - Remuneração Total Mês	215,52
5010 INSS				23,44	B905 - Salário Hora	8,98
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35	B920 - Base Salário Família	52,42
<b>Totais</b>			<b>361,22</b>	<b>51,79</b>	- Admitido em 25/08/2020	
<b>Líquido</b>			<b>309,43</b>			
<b>000011 Marcelo Vidal de Negreiros</b>						
		220:00	Pedreiro	01/11/2002	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.157,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
5010 INSS				180,53	B110 - Base IRRF Salário	1.294,55
5310 Adiantamento Salarial				863,03	B120 - Dedução IRRF Salário	180,53
5700 Vale Transporte				21,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,53
					B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
					B903 - Salário Mês	2.157,58
<b>Totais</b>			<b>2.157,58</b>	<b>1.065,14</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.092,44</b>			
<b>007949 Marcio da Silva de Souza</b>						
		220:00	Servente	17/03/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.743,98
0190 DSR s/ Salário Variável		0,46	5,37		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,49	26,82		B110 - Base IRRF Salário	1.126,22
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	99:20	139,46		B120 - Dedução IRRF Salário	141,27
1064 H. E. Not. 70%	P	1:57	27,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,27
5010 INSS				141,27	B400 - Base FGTS Salário	1.743,98
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B410 - FGTS Salário 8%	139,52
5700 Vale Transporte				14,45	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.743,98
<b>Totais</b>			<b>1.743,98</b>	<b>773,48</b>		
<b>Líquido</b>			<b>970,50</b>			
<b>007995 Marcio Ribeiro Bento</b>						
		200:00	Servente	27/04/2020	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>008057 Marcio Santos</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,19	1,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.014,94
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,11	4,02		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		682,48		B110 - Base IRRF Salário	1.014,94
0268 Descanso Semanal Remunerado			144,99		B120 - Dedução IRRF Salário	76,12
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		66,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	76,12
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		22,26		B400 - Base FGTS Salário	1.014,94
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		66,79		B410 - FGTS Salário 8%	81,20
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	30:39	20,90		B900 - Remuneração Total Mês	682,48
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:55	5,63		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				76,12		

# Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.014,94</b>	<b>76,12</b>	- Admitido em 17/08/2020		
<b>Líquido</b>			<b>938,82</b>			
<b>007984</b>	<b>Marcos Soares do Nascimento</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		5,49	43,87		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.553,62
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,11	8,93		B110 - Base IRRF Salário	2.553,62
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B120 - Dedução IRRF Salário	228,06
0268 Descanso Semanal Remunerado			364,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	228,06
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		151,22		B400 - Base FGTS Salário	2.553,62
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,41		B410 - FGTS Salário 8%	204,29
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		151,22		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1010 H. E. 50%	P	12:18	165,68		B905 - Salário Hora	8,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	30:47	46,42			
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	4:36	62,43			
5010 INSS				228,06		
5110 IRRF				31,62		
<b>Totais</b>		<b>2.553,62</b>	<b>259,68</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.293,94</b>			
<b>007048</b>	<b>Marcos Vinicius Singello Patrocinio</b>	<b>220:00</b>	<b>Auxiliar de Engenharia</b>	<b>28/04/2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.844,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.844,56
5010 INSS				262,97	B110 - Base IRRF Salário	1.706,74
5120 IRRF s/ Adiantamento				50,82	B120 - Dedução IRRF Salário	262,97
5310 Adiantamento Salarial				1.087,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	262,97
					B400 - Base FGTS Salário	2.844,56
					B410 - FGTS Salário 8%	227,56
					B900 - Remuneração Total Mês	2.844,56
					B903 - Salário Mês	2.844,56
<b>Totais</b>		<b>2.844,56</b>	<b>1.400,79</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.443,77</b>			
<b>007973</b>	<b>Matheus Cordeiro Soares Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>20/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>007978</b>	<b>Matheus Gomes Mariano</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>22/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>008013</b>	<b>Oswaldo Manoel Rodrigues Da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>27/05/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		0,38	4,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.263,45
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,13	23,15		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.263,45
0268 Descanso Semanal Remunerado			323,35		B120 - Dedução IRRF Salário	193,24
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		142,08		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	193,24
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,36		B400 - Base FGTS Salário	2.263,45
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		142,08		B410 - FGTS Salário 8%	181,08
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	83:50	120,38		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	1:50	23,69		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				193,24		
<b>Totais</b>		<b>2.263,45</b>	<b>193,24</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.070,21</b>			

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
000469	Oswaldo Pecanha Sobrinho	220:00	Engenheiro Civil	04/09/2009	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		23	8.571,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	12.049,34
0200 Férias		7	2.608,62		B020 - Base INSS Salário (Ant)	3.478,16
0210 1/3 s/ Férias			869,54		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	345,87
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		4.227,50		B110 - Base IRRF Salário	5.142,71
5005 INSS Férias				345,87	B120 - Dedução IRRF Salário	367,21
5010 INSS				367,21	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.136,35
5110 IRRF				443,90	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5120 IRRF s/ Adiantamento				942,83	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.722,04
5130 IRRF s/ Férias				115,04	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	367,21
5310 Adiantamento Salarial				2.485,64	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	345,89
5330 Adiantamento Férias				3.017,25	B210 - Base IRRF Férias	3.478,16
5350 Adiantamento de Folha	G			4.227,50	B220 - Dedução IRRF Férias	345,89
					B400 - Base FGTS Salário	12.049,34
					B410 - FGTS Salário 8%	963,95
					B900 - Remuneração Total Mês	11.179,80
					B903 - Salário Mês	11.179,80
		<b>Totais</b>	<b>16.276,84</b>	<b>11.945,24</b>	- Em Férias de: 03/08/2020 até 09/08/2020	
		<b>Líquido</b>		<b>4.331,60</b>		
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	110:00	Técnico em Segurança no Trabalho	01/06/2011	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.408,76		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.408,76
3936 Ajuda Compensatória Mensal 36 %	A		507,15		B110 - Base IRRF Salário	845,26
5010 INSS				111,10	B120 - Dedução IRRF Salário	111,10
5310 Adiantamento Salarial				563,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	111,10
5700 Vale Transporte				13,63	B400 - Base FGTS Salário	1.408,76
					B410 - FGTS Salário 8%	112,70
					B900 - Remuneração Total Mês	1.408,76
					B903 - Salário Mês	1.408,76
		<b>Totais</b>	<b>1.915,91</b>	<b>688,23</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>1.227,68</b>		
004950	Rafael Da Anunciacao Barros	220:00	Auxiliar de Engenharia	15/09/2014	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		18	1.955,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.693,29
0200 Férias		12	1.259,49		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.679,32
0201 Diferença de Férias			44,08		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	135,45
0210 1/3 s/ Férias			419,83		B110 - Base IRRF Salário	1.173,12
0211 Diferença 1/3 de Férias			14,69		B120 - Dedução IRRF Salário	240,54
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		218,50		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	3.222,16
5005 INSS Férias				135,45	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	376,92
5010 INSS				240,54	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	71,99
5120 IRRF s/ Adiantamento				42,17	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	240,54
5310 Adiantamento Salarial				739,91	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	135,45
5330 Adiantamento Férias				1.543,87	B210 - Base IRRF Férias	1.738,09
5350 Adiantamento de Folha	G			218,50	B220 - Dedução IRRF Férias	135,45
					B400 - Base FGTS Salário	3.693,29
					B410 - FGTS Salário 8%	295,46
					B900 - Remuneração Total Mês	3.258,67
					B903 - Salário Mês	3.258,67
		<b>Totais</b>	<b>3.911,79</b>	<b>2.920,44</b>	- Em Férias de: 03/08/2020 até 14/08/2020	
		<b>Líquido</b>		<b>991,35</b>		
008040	Rafael das Neves Alves	200:00	Servente	09/07/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
1510 Insuficiência de Saldo			708,75		B905 - Salário Hora	7,02
5700 Vale Transporte				680,40		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
		<b>Totais</b>	<b>708,75</b>	<b>708,75</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>0,00</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007999	Rafael Martins da Silva	200:00	Servente	27/04/2020	2	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,25	20,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.888,61
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	6,76		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.888,61
0268 Descanso Semanal Remunerado			269,80		B120 - Dedução IRRF Salário	154,29
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		116,97		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,29
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		38,99		B400 - Base FGTS Salário	1.888,61
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		116,97		B410 - FGTS Salário 8%	151,09
1020 H. E. 70%	P	8:00	95,47		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:48	35,16		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:45	9,03		B920 - Base Salário Família	439,45
5010 INSS				154,29		
<b>Totais</b>			<b>1.888,61</b>	<b>154,29</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.734,32</b>		
<b>008005 Rafael Romao Rosa</b>						
				180:00	Vigia	06/05/2020 2 3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.901,38
0268 Descanso Semanal Remunerado			271,63		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,15		B110 - Base IRRF Salário	1.901,38
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,05		B120 - Dedução IRRF Salário	155,44
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,44
5010 INSS				155,44	B400 - Base FGTS Salário	1.901,38
					B410 - FGTS Salário 8%	152,11
					B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	301,35
<b>Totais</b>			<b>1.901,38</b>	<b>155,44</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.745,94</b>		
<b>008060 Regis Antonio Julio de Souza</b>						
				200:00	Apropriador	19/08/2020 0 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510 Insuficiência de Saldo			277,65		B905 - Salário Hora	10,28
5700 Vale Transporte				249,30		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>277,65</b>	<b>277,65</b>	- Admitido em 19/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>000178 Reinaldo Rangel Soares</b>						
				180:00	Vigia	02/02/2009 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.895,45
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,52	43,85		B110 - Base IRRF Salário	1.246,01
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	126:23	228,00		B120 - Dedução IRRF Salário	154,90
5010 INSS				154,91	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,90
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.895,45
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	151,64
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>			<b>1.895,45</b>	<b>820,59</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.074,86</b>		

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007958	Renato Oliveira de Azevedo Silva	220:00	Laboratorista II	19/03/2020	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.546,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.350,35
0190 DSR s/ Salário Variável		7,12	83,34		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4	46,33		B110 - Base IRRF Salário	2.331,80
1020 H. E. 70%	P	17:50	350,76		B120 - Dedução IRRF Salário	327,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	104:07	240,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	327,98
1064 H. E. Not. 70%	P	3:30	82,61		B400 - Base FGTS Salário	3.350,35
5010 INSS				327,98	B410 - FGTS Salário 8%	268,03
5120 IRRF s/ Adiantamento				146,98	B900 - Remuneração Total Mês	2.546,38
5310 Adiantamento Salarial				871,57	B903 - Salário Mês	2.546,38
5700 Vale Transporte				24,64	B920 - Base Salário Família	3.350,35
<b>Totais</b>			<b>3.350,35</b>	<b>1.371,17</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.979,18</b>		
008002	Renato Pereira	200:00	Operador de Acabadora I	29/04/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	11,36
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
007991	Roberto Carlos de Oliveira	200:00	Rastilheiro	27/04/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
007966	Roberto Cordeiro	200:00	Encarregado de Pavimentação I	25/03/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	17,27
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
008018	Rodrigo de Oliveira Pinto	200:00	Encarregado de Obras II	15/06/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		9,38	166,84		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.354,57
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,11	20,47		B110 - Base IRRF Salário	6.354,57
0261 Intermitente Horas	I		3.462,36		B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
0268 Descanso Semanal Remunerado			907,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
0324 Férias Proporcional (Intermitente)	I		352,75		B400 - Base FGTS Salário	6.354,57
0329 1/3 s/ Férias Proporcional (Intermitente)	I		117,58		B410 - FGTS Salário 8%	508,37
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		352,75		B900 - Remuneração Total Mês	3.462,36
1020 H. E. 70%	P	15:59	546,97		B905 - Salário Hora	20,13
1040 H. E. 100%	P	6:02	242,90			
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	30:45	106,46			
1064 H. E. Not. 70%	P	2:12	77,69			
5010 INSS				713,08		
5110 IRRF				682,05		
<b>Totais</b>			<b>6.354,57</b>	<b>1.395,13</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.959,44</b>		

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007946	Rogério Martins	220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.173,82
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,33	31,95		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:30	166,13		B110 - Base IRRF Salário	1.383,52
5010 INSS				182,48	B120 - Dedução IRRF Salário	182,48
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,48
5700 Vale Transporte				18,48	B400 - Base FGTS Salário	2.173,82
					B410 - FGTS Salário 8%	173,91
					B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>2.173,82</b>	<b>991,26</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.182,56</b>		
003586	Romildo Herminio dos Santos	110:00	Servente	11/02/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	781,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	781,35
3936 Ajuda Compensatória Mensal 24 %	A		187,52		B110 - Base IRRF Salário	468,81
5010 INSS				58,60	B120 - Dedução IRRF Salário	58,60
5310 Adiantamento Salarial				312,54	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	58,60
5700 Vale Transporte				7,81	B400 - Base FGTS Salário	781,35
					B410 - FGTS Salário 8%	62,51
					B900 - Remuneração Total Mês	781,35
					B903 - Salário Mês	781,35
<b>Totais</b>			<b>968,87</b>	<b>378,95</b>		
<b>Líquido</b>				<b>589,92</b>		
007993	Ronaldo Alves da Costa	200:00	Servente	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,28	8,68		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.907,86
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,31	20,76		B110 - Base IRRF Salário	1.907,86
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B120 - Dedução IRRF Salário	156,02
0268 Descanso Semanal Remunerado			272,55		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	156,02
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		117,19		B400 - Base FGTS Salário	1.907,86
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,06		B410 - FGTS Salário 8%	152,63
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,19		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	91:28	107,93		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	3:45	45,14			
5010 INSS				156,02		
<b>Totais</b>			<b>1.907,86</b>	<b>156,02</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.751,84</b>		
000435	Samuel Jose Acioli	220:00	Encarregado de Obras II	10/08/2009	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.653,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.653,38
5010 INSS				510,40	B110 - Base IRRF Salário	2.792,03
5120 IRRF s/ Adiantamento				153,26	B120 - Dedução IRRF Salário	2.006,35
5210 Pensão s/ Salário				1.495,95	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	510,40
5310 Adiantamento Salarial				1.708,09	B400 - Base FGTS Salário	4.653,38
5700 Vale Transporte				46,53	B410 - FGTS Salário 8%	372,27
					B900 - Remuneração Total Mês	4.653,38
					B903 - Salário Mês	4.653,38
					B920 - Base Salário Família	4.653,38
<b>Totais</b>			<b>4.653,38</b>	<b>3.914,23</b>		
<b>Líquido</b>				<b>739,15</b>		

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007980	Samuel Marcos Alves	200:00	Servente	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	14,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.699,12
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,08	6,49		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	1.699,12
0268 Descanso Semanal Remunerado			242,73		B120 - Dedução IRRF Salário	137,23
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		112,52		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	137,23
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		37,51		B400 - Base FGTS Salário	1.699,12
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		112,52		B410 - FGTS Salário 8%	135,93
1020 H. E. 70%	P	6:06	72,80		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:17	33,73		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				137,24		
5624 Faltas (H)	P	8:00		46,08		
5625 DSR s/ Faltas	P	1		38,38		
<b>Totais</b>			<b>1.783,58</b>	<b>221,70</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.561,88</b>		
<b>007947 Sandro Leandro Batista de Mattos</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.171,49
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,31	31,57		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	91:25	164,18		B110 - Base IRRF Salário	1.381,19
5010 INSS				182,20	B120 - Dedução IRRF Salário	182,20
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,20
5700 Vale Transporte				18,48	B400 - Base FGTS Salário	2.171,49
					B410 - FGTS Salário 8%	173,72
					B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>2.171,49</b>	<b>990,98</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.180,51</b>		
<b>008011 Thiago Lucindo Ferreira</b>						
		200:00	Auxiliar de Laboratório	19/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,24	58,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.393,78
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,35	22,35		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.249,60		B110 - Base IRRF Salário	2.393,78
0268 Descanso Semanal Remunerado			341,97		B120 - Dedução IRRF Salário	208,88
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		128,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	208,88
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		42,82		B400 - Base FGTS Salário	2.393,78
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		128,47		B410 - FGTS Salário 8%	191,50
1020 H. E. 70%	P	3:42	49,12		B900 - Remuneração Total Mês	1.249,60
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:59	116,23		B905 - Salário Hora	7,81
1064 H. E. Not. 70%	P	20:05	256,06		B920 - Base Salário Família	802,21
5010 INSS				208,88		
<b>Totais</b>			<b>2.393,78</b>	<b>208,88</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.184,90</b>		
<b>003495 Valdir dos Santos</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	15/01/2014	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.034,27
					B903 - Salário Mês	1.975,74
					B920 - Base Salário Família	2.034,27
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	58,53
<b>Totais</b>					- Afastado desde: 23/08/2016 Motivo: Auxílio Doença	
<b>Líquido</b>						

# Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008058	Vanderlei das Neves Rogerio	200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,06	0,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.013,08
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,19	4,50		B110 - Base IRRF Salário	1.013,08
0261 Intermitente Horas	I		682,48		B120 - Dedução IRRF Salário	75,98
0268 Descanso Semanal Remunerado			144,73		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	75,98
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		66,77		B400 - Base FGTS Salário	1.013,08
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		22,26		B410 - FGTS Salário 8%	81,05
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		66,77		B900 - Remuneração Total Mês	682,48
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	34:17	23,38		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:18	1,84			
5010 INSS				75,98		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>1.013,08</b>	<b>104,33</b>	- Admitido em 17/08/2020	
<b>Líquido</b>			<b>908,75</b>			
<b>008003 Victor Hugo Marques da Silva</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,27	46,31		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.606,40
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,48	27,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.606,40
0268 Descanso Semanal Remunerado			372,34		B120 - Dedução IRRF Salário	234,39
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		146,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	234,39
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		48,68		B400 - Base FGTS Salário	2.606,40
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		146,03		B410 - FGTS Salário 8%	208,51
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	98:56	142,07		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	18:38	240,82		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				234,39		
5110 IRRF				20,88		
<b>Totais</b>			<b>2.606,40</b>	<b>255,27</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.351,13</b>			
<b>000483 Vinicius Martingil Pereira</b>						
		220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	14/09/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.344,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.344,89
5010 INSS				467,21	B110 - Base IRRF Salário	2.606,93
5110 IRRF				17,68	B120 - Dedução IRRF Salário	467,21
5120 IRRF s/ Adiantamento				250,57	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	467,21
5310 Adiantamento Salarial				1.487,39	B400 - Base FGTS Salário	4.344,89
5700 Vale Transporte				42,05	B410 - FGTS Salário 8%	347,59
					B900 - Remuneração Total Mês	4.344,89
					B903 - Salário Mês	4.344,89
<b>Totais</b>			<b>4.344,89</b>	<b>2.264,90</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.079,99</b>			
<b>008061 Vitoriano Oliveira do Vale</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	20/08/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510 Insuficiência de Saldo			222,75		B905 - Salário Hora	8,98
5700 Vale Transporte				194,40		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>222,75</b>	<b>222,75</b>	- Admitido em 20/08/2020	
<b>Líquido</b>			<b>0,00</b>			

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008041	Waldecil Luis Piannta	200:00	Servente	09/07/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261	Intermitente Horas		252,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	361,73
0268	Descanso Semanal Remunerado		51,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)		24,57		B110 - Base IRRF Salário	361,73
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)		8,19		B120 - Dedução IRRF Salário	27,12
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		24,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	27,12
0400	Salário Família	1	48,62		B400 - Base FGTS Salário	361,73
5010	INSS			27,12	B410 - FGTS Salário 8%	28,94
					B900 - Remuneração Total Mês	252,72
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	57,33
<b>Totais</b>			<b>410,35</b>	<b>27,12</b>		
<b>Líquido</b>				<b>383,23</b>		
<b>008015 Wallace Armando De Campos Pessoa</b>						
008015	Wallace Armando De Campos Pessoa	200:00	Motorista de Caminhão I	28/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190	DSR s/ Salário Variável	16,55	127,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.112,07
0261	Intermitente Horas		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268	Descanso Semanal Remunerado		444,58		B110 - Base IRRF Salário	3.112,07
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)		157,66		B120 - Dedução IRRF Salário	295,07
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)		52,55		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	295,07
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		157,66		B400 - Base FGTS Salário	3.112,07
1010	H. E. 50%	P 49:15	663,40		B410 - FGTS Salário 8%	248,97
5010	INSS			295,07	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
5110	IRRF			40,04	B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	1.158,85
<b>Totais</b>			<b>3.112,07</b>	<b>335,11</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.776,96</b>		
<b>008014 Wallace Martins Bispo Santos</b>						
008014	Wallace Martins Bispo Santos	200:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190	DSR s/ Salário Variável	6,08	46,22		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.572,15
0191	DSR s/ Adicional Noturno	1,12	9,06		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261	Intermitente Horas		1.508,64		B110 - Base IRRF Salário	2.572,15
0268	Descanso Semanal Remunerado		367,45		B120 - Dedução IRRF Salário	230,28
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)		151,43		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	230,28
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)		50,48		B400 - Base FGTS Salário	2.572,15
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		151,43		B410 - FGTS Salário 8%	205,77
1010	H. E. 50%	P 14:26	194,42		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1050	Adicional Noturno 20,0%	P 31:14	47,10		B905 - Salário Hora	8,98
1060	Hora Extra Noturna 50%	P 3:23	45,92		B920 - Base Salário Família	696,06
5010	INSS			230,28		
<b>Totais</b>			<b>2.572,15</b>	<b>230,28</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.341,87</b>		
<b>008052 Wanderson Silva Pinto</b>						
008052	Wanderson Silva Pinto	220:00	Apropriador	23/07/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190	DSR s/ Salário Variável	2,36	18,97		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.631,04
0191	DSR s/ Adicional Noturno	3,34	25,98		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261	Intermitente Horas		1.603,68		B110 - Base IRRF Salário	2.631,04
0268	Descanso Semanal Remunerado		375,86		B120 - Dedução IRRF Salário	237,35
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)		159,78		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	237,35
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)		53,26		B400 - Base FGTS Salário	2.631,04
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		159,78		B410 - FGTS Salário 8%	210,48
1050	Adicional Noturno 20,0%	P 92:39	135,08		B900 - Remuneração Total Mês	1.603,68
1064	H. E. Not. 70%	P 6:38	98,65		B905 - Salário Hora	10,28
5010	INSS			237,35		
5110	IRRF			22,51		
<b>Totais</b>			<b>2.631,04</b>	<b>259,86</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.371,18</b>		

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008042	Wellington de Souza	200:00	Operador de Espargidor	09/07/2020	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510			535,50		B905 - Salário Hora	10,28
5700				535,50		
<b>Totais</b>			<b>535,50</b>	<b>535,50</b>		
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>007976 Weverson da Silva Luiz</b>						
				180:00	Vigia	20/04/2020 4 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191		4,55	38,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.316,91
0261	I		1.416,96		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268			330,99		B110 - Base IRRF Salário	2.316,91
0324	I		141,09		B120 - Dedução IRRF Salário	199,65
0329	I		47,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	199,65
0354	I		141,09		B400 - Base FGTS Salário	2.316,91
1050	P	127:45	201,08		B410 - FGTS Salário 8%	185,35
5010				199,65	B900 - Remuneração Total Mês	1.416,96
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	568,96
<b>Totais</b>			<b>2.316,91</b>	<b>199,65</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.117,26</b>		
<b>007981 Willians Goncalves Martins</b>						
				200:00	Servente	22/04/2020 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190		4,39	30,05		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.127,45
0191		1,07	7,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261	I		1.291,68		B110 - Base IRRF Salário	2.127,45
0268			303,92		B120 - Dedução IRRF Salário	176,92
0324	I		128,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	176,92
0329	I		42,93		B400 - Base FGTS Salário	2.127,45
0354	I		128,79		B410 - FGTS Salário 8%	170,20
1020	P	3:41	43,96		B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
1040	P	8:00	112,32		B905 - Salário Hora	7,02
1050	P	29:13	37,75		B920 - Base Salário Família	531,85
5010				176,92		
<b>Totais</b>			<b>2.127,45</b>	<b>176,92</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.950,53</b>		



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/10/2020

Nº Controle: 945.725.778.274.687.248 | Autenticação Bancária: 047.388.429

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Código de barras: **85850000611-6 41860180201-0 00764520080-5 02999040001-6**

Empresa / Órgão:

**FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **800299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **09/2020**

Data de validade: **07/10/2020**

Data de débito: **06/10/2020**

Valor do pagamento: **R\$ 61.141,86**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

258tC7Ld @77BwOMW N4o#lsJo 2ko8BZnB TJs6DMBl tEJzUYpG #s\*KkWs# pw7F339d  
JcQ3ViKi KoQOqDQU CAZ@zCB3 mfFQdtXI jep5qJ22 sR@qSHQu cnYYkCrA ot97Jnk\*  
IyKv3mC9 JkW9BwCC oiSHJ#F2 LFWTFG7Y QwqI@ikr 3d6UyAF@ 00500620 001100.1

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





GFIP - SEFIP 8.40

 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 05/10/2020 - 17:35:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 05/10/2020 - 17:35:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/10/2020 - 17:35:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 764.273,33	06-QTDE TRABALHADORES 258	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.141,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.141,86
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/10/2020 - 17:35:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 764.273,33	06-QTDE TRABALHADORES 258	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.141,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.141,86
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Data da Transação: 19/10/2020  
 Nº Controle: 945.725.778.274.687.248  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 3428 Conta de Débito: 28521-8

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858100027515 110203852021 940716202880 153031311757  
 Data do Pagamento: 19/10/2020  
 Número do Documento: 0716202881530313-1  
 Valor Total: R\$ 275.111,02  
 Autenticação Bancária: 057.239.865

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 3428, na data de pagamento.

**Autenticação**

IfmvlVMr \*SI4x6C# @uUGwdeP Y9rZQbGY 3Oc#sKq5 IR?9jVnL yLYPe7cH ?A7QCoD6  
 GejXOtZO jRpWaIff ENyV3REb w\*Fy4#Sp pDB@Efb2 #PGMaDIg xIdMwY8l pYu\*#mNn  
 xHu7Vh4i TlVUV2@O \*yRAjqsk E6rZHjhX XaC7MudO V76UKP2M 00521920 007.005.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Data da Transação: 19/10/2020  
 Nº Controle: 134.656.877.424.687.248  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 3428 Conta de Débito: 28521-8

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858700000359 988603852026 940716202880 152493406319  
 Data do Pagamento: 19/10/2020  
 Número do Documento: 0716202881524934-0  
 Valor Total: R\$ 3.598,86  
 Autenticação Bancária: 057.239.869

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 3428, na data de pagamento.

### Autenticação

BdGK4SIV fx?yhyZf E5@SE?\*P UeIsJi6\* ngL7SIJD IboEJ9D3 KkS7Hx4y Vigj4JzB  
 DNo5MTDh TT36PKOl 9aagw\*3V aRoX\*ncs mW3Rz9Ww yCV6UY6x W8rLiZ3R cAT8OmM5  
 IYdmXocp v#35tAfO xSqEaHbB MTSNHInq A7IRariv DakTvQE5 00501920 00.90059

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.299.904/0001-60</b>	Razão Social <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2020</b>	Número do Documento <b>07.16.20288.1530313-1</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2020</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000003013732</b>			Valor Total do Documento <b>275.111,02</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	57.318,36			57.318,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.684,44			2.684,44
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	61.862,36			61.862,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.460,63			5.460,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	355,73			355,73
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	8.950,99			8.950,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.744,95			7.744,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	619,59			619,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	3.097,98			3.097,98
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4.646,97			4.646,97
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.858,78			1.858,78
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.403,87			8.403,87
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.227.25318/74				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	938,41			938,41
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	CNO:51.227.25318/74				

SENDA (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 5

14/10/2020 16:20:10

85810002751 5 11020385202 1 94071620288 0 15303131175 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002751 5	11020385202 1	94071620288 0	15303131175 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ 00.299.904/0001-60  
 Número: 07.16.20288.1530313-1  
 Pagar até: 20/10/2020  
 Valor: 275.111,02



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.227.25318/74	1.582,58			1.582,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.227.25318/74	1.369,35			1.369,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.227.25318/74	109,54			109,54
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.227.25318/74	547,74			547,74
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.227.25318/74	821,61			821,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.227.25318/74	328,64			328,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.232.08100/72	1.739,12			1.739,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.232.08100/72	251,24			251,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.232.08100/72	217,39			217,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.232.08100/72	17,39			17,39
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.232.08100/72	86,95			86,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.232.08100/72	130,43			130,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	52,17			52,17



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.232.08100/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.244.31185/78	6.413,22			6.413,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.244.31185/78	926,48			926,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.244.31185/78	801,65			801,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.244.31185/78	64,13			64,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.244.31185/78	320,66			320,66
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.244.31185/78	480,99			480,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.244.31185/78	192,39			192,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04590/73	671,67			671,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04590/73	97,03			97,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04590/73	83,95			83,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04590/73	6,71			6,71
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04590/73	33,58			33,58
1184	CP TERCEIROS - SESI	50,37			50,37



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04590/73	20,15			20,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04592/78	563,50			563,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04592/78	81,40			81,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04592/78	70,43			70,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04592/78	5,63			5,63
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04592/78	28,17			28,17
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04592/78	42,26			42,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04592/78	16,90			16,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.50761/79	46.300,79			46.300,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.50761/79	6.702,89			6.702,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.50761/79	5.799,75			5.799,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.50761/79	463,98			463,98





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.50761/79	2.319,90			2.319,90
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.50761/79	3.479,85			3.479,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.50761/79	1.391,94			1.391,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.61150/76	18.063,34			18.063,34
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.003.61150/76	551,13			551,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.61150/76	2.616,54			2.616,54
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.61150/76	2.263,99			2.263,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.61150/76	181,11			181,11
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.61150/76	905,59			905,59
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.61150/76	1.358,39			1.358,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.61150/76	543,35			543,35
	<b>Totais</b>	<b>275.111,02</b>			<b>275.111,02</b>



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.299.904/0001-60</b>	Razão Social <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2020</b>	Número do Documento <b>07.16.20288.1524934-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2020</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000003013732</b>			Valor Total do Documento <b>3.598,86</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.837,33			1.837,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.168,21			1.168,21
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	73,92			73,92
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	CNO:51.227.25318/74 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	415,80			415,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:30.709.687/0001-08				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	103,60			103,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	CNO:90.002.72193/72 CNPJ Prestador:03.399.352/0001-50				
	<b>Totais</b>	<b>3.598,86</b>			<b>3.598,86</b>

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000035 9

98860385202 6

94071620288 0

15249340631 9

CNPJ 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.20288.1524934-0

Pagar até: 20/10/2020

Valor: 3.598,86



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160 ,

Seu arquivo EbNZ3qP50Pj00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/10/2020 às 17:49:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8A02E77BFD35C06..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** FILIPE SA BARRETO CARCELER:05798750752  
**Inscrição Transmissor:** 057.987.507-52

**Responsável:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 00.299.904/0001-60  
**Competência:** 09/2020  
**NRA:** EbNZ3qP50Pj00002  
**Base de Processamento:** RJ - Rio de Janeiro  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** VANESSA NEVES  
**Telefone:** 002122521341

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/10/2020  
HORA: 17:35:08  
PÁG : 0009

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda	N° ARQUIVO: EbNZ3qP50Pj0000-2
COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00211 Pavimenta Rio AP4	FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
	N° CONTROLE: M6LLNCZSPZB0000-5
LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605	INSCRIÇÃO: 900035076179
CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ	BAIRRO: Centro
	CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341
	CNAE PREPONDERANTE: 4222701
	CNAE: 4222701
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	
	507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	20.039,06	0,00	0,00	0,00	20.039,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	46.398,03	0,00	0,00	0,00	46.398,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	6.681,31	0,00	0,00	0,00	6.681,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.021,16	0,00	0,00	0,00	73.021,16
OUTRAS ENTIDADES	13.455,43	0,00	0,00	0,00	13.455,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.455,43	0,00	0,00	0,00	13.455,43
TOTAL A RECOLHER	86.476,59	0,00	0,00	0,00	86.476,59

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858500006116 418601802010 007645200805 029990400016  
858300000009 139301802019 007645200007 029990400016EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
VALDIR DOS SANTOS	0,00	0,00	108.06552.57-0 0,00	15/01/2014 0,00	01	0,00	23/08/2016 P1	0,00
GUILHERME DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	161.84644.43-3 0,00	12/06/2014 0,00	01	0,00	04/08/2014 P1	0,00
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS	5.903,66	0,00	107.85252.52-2 0,00	14/10/2009 685,44	01	472,30		04101 0,00
ALEXANDRE DA CONCEICAO MARQUES	1.630,42	0,00	180.87178.29-2 0,00	09/03/2017 131,05	01	130,43		07170 0,00
ALEXSSANDE SILVA BARRETO DE FREITAS	2.160,22	0,00	212.15970.06-6 0,00	20/07/2015 180,85	01	05 172,81		05174 0,00
ANTONIO HENRIQUE NETO	1.771,19	0,00	124.69458.09-0 0,00	17/03/2020 143,72	01	141,70		07170 0,00
CARLOS ANTONIO DA FONSECA	2.157,58	0,00	123.33915.29-5 0,00	06/07/2012 180,53	01	172,61		07152 0,00
CELSO ALVES DA COSTA	3.231,23	0,00	124.37726.32-4 0,00	16/03/2020 311,30	01	258,50		07151 0,00
DENIS BEZERRA DA SILVA	3.666,62	0,00	128.72130.18-9 0,00	16/06/2014 372,26	01	293,33		04142 0,00
FABRICIO AURELIO DA SILVA BARROS	1.078,79	0,00	127.33024.54-1 0,00	21/03/2018 81,41	01	86,31		07152 0,00
FERNANDO JOSE AZEVEDO DOS SANTOS	10.115,06	0,00	128.93463.60-8 0,00	08/04/2008 713,08	01	809,21		02141 0,00
GILBERTO AUGUSTO FERRO COSTA ASSUMPCAO	10.115,06	0,00	124.34299.44-1 0,00	04/05/2009 713,08	01	809,21		02149 0,00
GIVANILDO SANTOS ANDRADE	2.966,38	0,00	128.17881.76-3 0,00	14/03/2016 277,59	01	237,32		04142 0,00
IVANILZA NUNES DOS SANTOS	1.543,64	0,00	127.22128.56-1 0,00	13/07/2011 123,24	01	123,50		05142 0,00
JOAO SANTOS GONCALVES BARBOSA	1.904,94	0,00	206.55546.13-2 0,00	17/03/2020 155,76	01	152,39		07170 0,00
JOSE RENATO MAIA TAVARES	10.115,06	0,00	123.71399.71-1 0,00	24/04/2012 713,08	01	809,21		02142 0,00
LOHAN ANTUNES EDUARDO DA SILVA	2.908,56	0,00	133.98920.58-5 0,00	19/12/2012 270,65	01	232,68		03121 0,00
LUIZ CLAUDIO FERRARI CAMPOS	1.749,61	0,00	125.37720.80-8 0,00	11/03/2020 141,78	01	139,97		07170 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020  
HORA: 17:35:08  
PÁG : 0037/0051

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016  
858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUIZ HENRIQUE COSTA DA SILVA	1.860,45	0,00	163.80689.12-6 0,00	17/03/2020 151,76	01	148,83		07170 0,00
MARCELO VIDAL DE NEGREIROS	2.157,58	0,00	124.05670.04-8 0,00	01/11/2002 180,53	01	172,61		07152 0,00
MARCIO DA SILVA DE SOUZA	1.898,91	0,00	228.20071.70-7 0,00	17/03/2020 155,22	01	151,91		07170 0,00
MARCOS VINICIUS SINGELLO PATROCINIO	2.844,56	0,00	136.24918.76-0 0,00	28/04/2016 262,97	01	227,56		03121 0,00
OSVALDO PECANHA SOBRINHO	11.179,80	0,00	122.79476.13-6 0,00	04/09/2009 713,08	01	894,39		02142 0,00
PEDRO IVO BASILIO ALVES	2.766,48	0,00	131.97016.52-0 0,00	01/06/2011 253,60	01	221,31		03516 0,00
RAFAEL DA ANUNCIACAO BARROS	3.258,67	0,00	129.97012.56-4 0,00	15/09/2014 315,14	01	260,69		03121 0,00
REINALDO RANGEL SOARES	1.873,21	0,00	107.90328.55-8 0,00	02/02/2009 152,90	01	149,86		05174 0,00
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA	3.186,95	0,00	129.29353.54-8 0,00	19/03/2020 305,10	01	254,95		03011 0,00
ROGERIO MARTINS	2.142,42	0,00	107.32770.01-4 0,00	16/03/2020 178,71	01	171,40		07825 0,00
ROMILDO HERMINIO DOS SANTOS	781,35	0,00	124.49836.54-5 0,00	11/02/2014 58,60	01	62,51		07170 0,00
SAMUEL JOSE ACIOLI	4.653,38	0,00	123.49206.84-1 0,00	10/08/2009 510,40	01	372,28		07102 0,00
SANDRO LEANDRO BATISTA DE MATTOS	2.158,20	0,00	129.17033.09-8 0,00	16/03/2020 180,61	01	172,66		07825 0,00
VINICIUS MARTINGIL PEREIRA	4.437,64	0,00	131.99557.54-5 0,00	14/09/2009 480,20	01	355,01		03516 0,00
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	1.562,87	0,00	124.71831.71-2 0,01	27/04/2020 124,97	04	125,03	18/09/2020 J	07111 0,00
HURCIEL DE SOUSA BARBOSA	1.294,37	0,00	133.24083.34-5 0,01	17/08/2020 100,81	04	103,54	29/09/2020 J	07151 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020  
HORA: 17:35:08  
PÁG : 0038/0051

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016  
858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS	2.738,29	0,00	201.29724.93-3 0,01	20/04/2020 250,22	04	0,00	30/09/2020 11	07151 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020  
HORA: 17:35:08  
PÁG : 0039/0051

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016  
858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ADAUTO LEAL DA SILVA	2.393,43	0,00	122.10053.51-1 0,00	17/08/2020 208,83	04	191,48	07825 0,00
ADAUTO LEAL DA SILVA JUNIOR	2.289,16	0,00	160.03343.19-3 0,00	21/08/2020 196,32	04	183,13	07825 0,00
ADENILSON SILVA REIS CANDIDO	2.106,66	0,00	133.74430.56-1 0,00	27/04/2020 174,42	04	168,53	07170 0,00
ADJAILTON ALVES DA SILVA	1.901,38	0,00	152.30841.50-1 0,00	09/07/2020 155,44	04	152,11	05174 0,00
ALEXANDRE NOBREGA DO VALE	1.901,38	0,00	133.35471.56-2 0,00	09/07/2020 155,44	04	152,11	05174 0,00
AMAURI SEVERINO DE MENEZES	1.825,48	0,00	121.95737.82-6 0,00	25/06/2020 148,61	04	146,04	07152 0,00
ARIVALDO REIS FERREIRA	2.470,27	0,00	121.84422.75-6 0,00	18/08/2020 218,06	04	197,63	07825 0,00
ARTUR ALBERTO PAULA DA SILVA	1.977,01	0,00	133.33651.56-3 0,00	25/03/2020 162,25	04	158,16	07151 0,00
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	1.979,13	0,00	207.15142.73-3 0,00	13/07/2020 162,44	04	158,33	07170 0,00
CAIO MARCIO JOIA DA SILVA	258,51	0,00	124.37749.24-3 0,00	06/05/2020 19,38	04	20,69	05174 0,00
CARLOS EDUARDO SANTOS DO CARMO	2.312,89	0,00	165.23428.89-4 0,00	25/03/2020 199,17	04	185,03	07151 0,00
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA CARVALHO	2.008,38	0,00	212.89841.24-3 0,00	27/04/2020 165,07	04	160,67	07170 0,00
CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.539,76	0,00	127.29614.56-9 0,00	01/04/2020 226,39	04	203,19	07825 0,00
DEVAYR PEDRO LUCIANO	2.430,20	0,00	122.92730.70-9 0,00	20/04/2020 213,25	04	194,42	05174 0,00
FABIO HENRIQUE FERNANDES	2.600,05	0,00	126.77106.14-2 0,00	27/04/2020 233,63	04	208,01	07821 0,00
FELIPE MEDEIROS SANTOS PINHAL	1.492,28	0,00	130.63525.22-6 0,00	02/09/2020 118,62	04	119,38	07170 0,00
FILIFE SALES DA COSTA	2.100,37	0,00	133.32674.60-8 0,00	09/07/2020 173,67	04	168,02	07170 0,00
GERONCIO DE JESUS CARDIAL	2.136,34	0,00	120.22275.97-9 0,00	22/04/2020 177,98	04	170,91	07111 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020  
HORA: 17:35:08  
PÁG : 0040/0051

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016  
858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
GLAUCIO DIAS GUIMARAES MANCO	1.804,82	0,00	204.69303.81-0 0,00	27/04/2020 146,75	04	144,38	07170 0,00
HIGOR SOUZA MUNIZ	798,91	0,00	134.02792.58-2 0,00	22/04/2020 59,91	04	63,91	07170 0,00
HUGO RICARDO LEITE VIEIRA	1.967,74	0,00	165.58655.33-1 0,00	27/04/2020 161,41	04	157,41	07170 0,00
JAILSON TOMAS DA SILVA	326,69	0,00	128.00500.06-0 0,00	28/09/2020 24,50	04	26,14	07111 0,00
JESUS AFONSO DOS SANTOS	2.023,63	0,00	124.92162.39-9 0,00	09/07/2020 166,44	04	161,90	07170 0,00
JORGE LUIZ DE BARROS TORTURA	2.775,85	0,00	124.34438.15-8 0,00	06/05/2020 254,73	04	222,07	07825 0,00
JUAREZ ALMEIDA GONCALVES JUNIOR	5.155,94	0,00	131.61107.62-3 0,00	11/05/2020 580,76	04	412,47	04110 0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS DA SILVA	2.608,32	0,00	133.38530.62-4 0,00	09/07/2020 234,62	04	208,66	07152 0,00
JULIO CESAR VIEIRA DE PAULA	2.132,64	0,00	130.29223.58-1 0,00	27/04/2020 177,54	04	170,61	07825 0,00
MAGNO SANTOS DA SILVA	2.324,26	0,00	128.75298.56-0 0,00	27/04/2020 200,53	04	185,95	07151 0,00
MARCELO REIS LUIZ	2.443,50	0,00	182.21324.50-2 0,00	25/08/2020 214,84	04	195,48	07825 0,00
MARCIO RIBEIRO BENTO	1.577,32	0,00	124.66974.16-0 0,00	27/04/2020 126,27	04	126,19	07170 0,00
MARCIO SANTOS	2.206,81	0,00	125.37992.52-2 0,00	17/08/2020 186,44	04	176,55	07825 0,00
MARCOS SOARES DO NASCIMENTO	2.700,75	0,00	108.67010.13-1 0,00	27/04/2020 245,71	04	216,07	07825 0,00
MATHEUS CORDEIRO SOARES SILVA	1.577,99	0,00	237.39372.03-2 0,00	20/04/2020 126,33	04	126,23	07170 0,00
OSVALDO MANOEL RODRIGUES DA SILVA	2.223,59	0,00	123.57248.21-3 0,00	27/05/2020 188,45	04	177,89	07825 0,00
RAFAEL DAS NEVES ALVES	1.589,42	0,00	166.23996.80-0 0,00	09/07/2020 127,36	04	127,15	07170 0,00
RAFAEL MARTINS DA SILVA	2.169,10	0,00	166.53205.23-2 0,00	27/04/2020 181,92	04	173,52	07170 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020  
HORA: 17:35:08  
PÁG : 0041/0051

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016  
858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
RAFAEL ROMAO ROSA	2.147,54	0,00	156.32854.27-6 0,00	06/05/2020 179,33	04	171,80	05174 0,00
REGIS ANTONIO JULIO DE SOUZA	2.357,48	0,00	126.54792.56-2 0,00	19/08/2020 204,52	04	188,60	04142 0,00
RENATO PEREIRA	2.555,54	0,00	120.77154.59-6 0,00	29/04/2020 228,29	04	204,45	07112 0,00
ROBERTO CORDEIRO	3.863,69	0,00	120.04622.73-5 0,00	25/03/2020 399,85	04	309,10	07102 0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA PINTO	6.306,34	0,00	165.58384.05-2 0,00	15/06/2020 713,08	04	504,50	07102 0,00
RONALDO ALVES DA COSTA	1.936,41	0,00	125.05511.73-1 0,00	27/04/2020 158,59	04	154,92	07170 0,00
SAMUEL MARCOS ALVES	605,09	0,00	207.16160.26-3 0,00	22/04/2020 45,38	04	48,40	07170 0,00
THIAGO LUCINDO FERREIRA	2.427,26	0,00	133.42835.56-6 0,00	19/05/2020 212,89	04	194,18	08181 0,00
VANDERLEI DAS NEVES ROGERIO	2.275,41	0,00	170.09013.28-2 0,00	17/08/2020 194,67	04	182,03	07825 0,00
VICTOR HUGO MARQUES DA SILVA	2.327,02	0,00	207.62428.25-7 0,00	29/04/2020 200,87	04	186,16	07825 0,00
WALDECI LUIS PIANNTA	2.147,54	0,00	166.35293.19-2 0,00	09/07/2020 179,33	04	171,80	05174 0,00
WALLACE ARMANDO DE CAMPOS PESSOA	2.877,61	0,00	133.60928.54-6 0,00	28/05/2020 266,94	04	230,20	07825 0,00
WALLACE MARTINS BISPO SANTOS	2.861,89	0,00	128.34763.89-7 0,00	27/05/2020 265,05	04	228,96	07825 0,00
WANDERSON SILVA PINTO	2.619,58	0,00	126.89561.56-7 0,00	23/07/2020 235,97	04	209,57	04142 0,00
WELLINGTON DE SOUZA	1.529,28	0,00	127.32712.56-8 0,00	09/07/2020 121,95	04	122,35	07151 0,00
WEVERSON DA SILVA LUIZ	2.148,11	0,00	166.89308.29-5 0,00	20/04/2020 179,40	04	171,84	05174 0,00
WILLIANS GONCALVES MARTINS	2.061,26	0,00	134.03055.27-1 0,00	22/04/2020 169,83	04	164,90	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

231.990,16 0,00 0,03 20.039,06 18.340,20 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020  
HORA: 17:35:08  
PÁG : 0042/0051

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016  
858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: EbNZ3qP50Pj0000-2  
COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: M6LLNCZSPZB0000-5 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	108.217,62	0,00	108.217,62	0,00
04	56	121.034,25	0,00	123.772,54	0,03
TOTAIS:	86	229.251,87	0,00	231.990,16	0,03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020  
HORA: 17:35:08  
PÁG: 0043/0051

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: EbNZ3qP50Pj0000-2  
COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: M6LLNCZSPZB0000-5 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021 2252 1341 CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	86.476,59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.039,06
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			VALOR SOLICITADO:	0,00	
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:				
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	2	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

## RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500006116 418601802010 007645200805 029990400016

858300000009 139301802019 007645200007 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° ARQUIVO: EbNZ3qP50Pj0000-2  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88 N° CONTROLE: FST34cFP2QK0000-8  
 COD REC: 155 COMP: 09/2020

TOMADOR/OBRA : 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRIÇÃO: 900035076179 N° CONTROLE: M6LLNCZSPZB0000-5  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 ESTRADA DA LIGACAO SN DIVERSOS LOGRADOUROS JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO 22713470 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	231.990,16	REM SEM 13° SALÁRIO	229.251,87
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	18.340,20
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	86	TOTAL TRABALHADORES	85

## TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	231.990,16	REM SEM 13° SALÁRIO	229.251,87
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.039,06	DEPÓSITO	18.340,20
VAL DEVIDO PREV SOC	86.476,59	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	86	TOTAL TRABALHADORES	85

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/10/2020

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 17:35:08

PÁG : 001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 09/2020

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	258	1
REMUNERAÇÃO	764.273,33	696,87
DEPÓSITO	61.141,86	13,93
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	61.141,86	13,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/10/2020  
 HORA: 17:35:08  
 PÁG : 001/002

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60	0079	2100 507
31.629,64	75.078,11	17.557,61	97,24	0,00	124.168,12 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512244823975	0079	2208 507
2.454,38	6.088,74	1.543,47	0,00	0,00	10.086,59 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512272531874	0079	2208 507
4.702,77	13.470,69	3.176,89	0,00	0,00	21.350,35 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512320810072	0079	2208 507
704,20	1.989,55	504,34	0,00	0,00	3.198,09 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578	0079	2208 507
3.081,71	7.336,72	1.859,83	0,00	0,00	12.278,26 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073	0079	2208 507
329,10	768,39	194,78	0,00	0,00	1.292,27 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/10/2020  
 HORA: 17:35:08  
 PÁG : 002/002

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278		0079	507
259,72	644,64	163,41	0,00	0,00	1.067,77	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900027219372		0079	507
2.434,85	6.219,43	1.542,76	388,96	0,00	9.808,08	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900035076179		0079	507
20.039,06	53.079,34	13.455,43	97,24	0,00	86.476,59	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900036115076		0079	507
8.167,38	21.271,21	5.252,47	48,62	0,00	34.642,44	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60



## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008056	Adauto Leal da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,38	18,94		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.393,43
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:33	18,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.393,43
0268 Descanso Semanal Remunerado			341,92		B120 - Dedução IRRF Salário	208,83
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		143,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	208,83
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		47,86		B400 - Base FGTS Salário	2.393,43
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		143,57		B410 - FGTS Salário 8%	191,47
1010 H. E. 50%	P	0:35	7,86		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	83:05	119,31		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	8:55	115,24			
5010 INSS				208,83		
<b>Totais</b>			<b>2.393,43</b>	<b>208,83</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.184,60</b>		
<b>008062 Adauto Leal da Silva Junior</b>						
008062	Adauto Leal da Silva Junior	200:00	Motorista de Caminhão I	21/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,04	7,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.289,16
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:31	18,03		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.289,16
0268 Descanso Semanal Remunerado			327,02		B120 - Dedução IRRF Salário	196,32
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		142,37		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	196,32
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		47,46		B400 - Base FGTS Salário	2.289,16
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		142,37		B410 - FGTS Salário 8%	183,13
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	81:37	117,20		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	3:53	50,19		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				196,32	B920 - Base Salário Família	525,34
<b>Totais</b>			<b>2.289,16</b>	<b>196,32</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.092,84</b>		
<b>007998 Adenilson Silva Reis Candido</b>						
007998	Adenilson Silva Reis Candido	200:00	Servente	27/04/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,07	35,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.106,66
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:43	15,61		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	2.106,66
0268 Descanso Semanal Remunerado			300,95		B120 - Dedução IRRF Salário	174,42
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		117,22		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	174,42
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,07		B400 - Base FGTS Salário	2.106,66
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,22		B410 - FGTS Salário 8%	168,53
1020 H. E. 70%	P	1:36	19,09		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	88:06	101,49		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	17:50	209,55		B920 - Base Salário Família	654,43
5010 INSS				174,42		
<b>Totais</b>			<b>2.106,66</b>	<b>174,42</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.932,24</b>		
<b>008043 Adjailton Alves da Silva</b>						
008043	Adjailton Alves da Silva	180:00	Vigia	09/07/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.901,38
0268 Descanso Semanal Remunerado			271,63		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		129,15		B110 - Base IRRF Salário	1.901,38
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		43,05		B120 - Dedução IRRF Salário	155,44
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,44
5010 INSS				155,44	B400 - Base FGTS Salário	1.901,38
					B410 - FGTS Salário 8%	152,11
					B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
					B905 - Salário Hora	7,38
<b>Totais</b>			<b>1.901,38</b>	<b>155,44</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.745,94</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007867	Adriano Oliveira da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	25/02/2019	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	8,63
<b>Totais Líquido</b>						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III	14/10/2009	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		25	4.660,78		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.903,66
0200 Férias		5	932,16		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.242,88
0210 1/3 s/ Férias			310,72		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	96,17
5005 INSS Férias				96,17	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				589,27	B101 - Dependentes IRRF Fer	189,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				304,77	B110 - Base IRRF Salário	2.796,47
5310 Adiantamento Salarial				1.559,54	B120 - Dedução IRRF Salário	589,27
5330 Adiantamento Férias				1.146,71	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	589,27
5700 Vale Transporte				46,61	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	96,17
					B210 - Base IRRF Férias	1.242,88
					B220 - Dedução IRRF Férias	96,17
					B400 - Base FGTS Salário	5.903,66
					B410 - FGTS Salário 8%	472,29
					B900 - Remuneração Total Mês	5.592,93
					B903 - Salário Mês	5.592,93
					- Em Férias de: 14/09/2020 até 18/09/2020	
		<b>Totais</b>	<b>5.903,66</b>	<b>3.743,07</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>2.160,59</b>		
E00086	Alecio Guimaraes	150:00	Estagiário	19/05/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0080 Bolsa Auxílio		30	1.600,00		B110 - Base IRRF Salário	1.142,63
1870 Adicional Noturno (Bolsa Auxílio)	I	17:07	182,63		B900 - Remuneração Total Mês	1.600,00
5310 Adiantamento Salarial				640,00	B903 - Salário Mês	1.600,00
		<b>Totais</b>	<b>1.782,63</b>	<b>640,00</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>1.142,63</b>		
007324	Alexandre da Conceicao Marques	220:00	Servente	09/03/2017	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.562,70		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.630,42
0190 DSR s/ Salário Variável		1,16	9,03		B110 - Base IRRF Salário	1.005,34
1010 H. E. 50%	P	3:00	31,95		B120 - Dedução IRRF Salário	131,05
1040 H. E. 100%	P	1:53	26,74		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	131,05
5010 INSS				131,05	B400 - Base FGTS Salário	1.630,42
5310 Adiantamento Salarial				625,08	B410 - FGTS Salário 8%	130,43
5700 Vale Transporte				15,63	B900 - Remuneração Total Mês	1.562,70
					B903 - Salário Mês	1.562,70
		<b>Totais</b>	<b>1.630,42</b>	<b>771,76</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>858,66</b>		
008036	Alexandre Nobrega do Vale	180:00	Vigia	09/07/2020	1	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.901,38
0268 Descanso Semanal Remunerado			271,63		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		129,15		B110 - Base IRRF Salário	1.901,38
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		43,05		B120 - Dedução IRRF Salário	155,44
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,44
5010 INSS				155,44	B400 - Base FGTS Salário	1.901,38
					B410 - FGTS Salário 8%	152,11
					B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	301,35
		<b>Totais</b>	<b>1.901,38</b>	<b>155,44</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>1.745,94</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
006213	Alexssande Silva Barreto de Freitas	180:00	Vigia	20/07/2015	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,22
0190 DSR s/ Salário Variável		4,29	40,47		B110 - Base IRRF Salário	1.510,78
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3:27	31,08		B120 - Dedução IRRF Salário	180,85
1040 H. E. 100%	P	4:59	89,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,85
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	111:58	201,99		B250 - Base IRRF Férias(Ant)	2.455,29
1070 H. E. Not. 100%	P	8:00	173,18		B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	216,26
5010 INSS				180,85	B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	25,13
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	2.160,22
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>			<b>2.160,22</b>	<b>846,53</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.313,69</b>		
<b>008027 Amauri Severino de Menezes</b>						
				200:00	Pedreiro	25/06/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,15	22,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.825,48
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:01	10,72		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.065,12		B110 - Base IRRF Salário	1.825,48
0268 Descanso Semanal Remunerado			260,78		B120 - Dedução IRRF Salário	148,61
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		107,02		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	148,61
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		35,67		B400 - Base FGTS Salário	1.825,48
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		107,02		B410 - FGTS Salário 8%	146,04
1020 H. E. 70%	P	1:44	28,02		B900 - Remuneração Total Mês	1.065,12
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	65:20	69,65		B905 - Salário Hora	9,51
1064 H. E. Not. 70%	P	10:56	118,88			
5010 INSS				148,61		
<b>Totais</b>			<b>1.825,48</b>	<b>148,61</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.676,87</b>		
<b>007951 Antonio Henrique Neto</b>						
				220:00	Servente	17/03/2020 0 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.771,19
0190 DSR s/ Salário Variável		1,32	10,76		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:46	19,48		B110 - Base IRRF Salário	1.153,43
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	90:11	126,62		B120 - Dedução IRRF Salário	143,72
1064 H. E. Not. 70%	P	4:53	69,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	143,72
5010 INSS				143,72	B400 - Base FGTS Salário	1.771,19
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B410 - FGTS Salário 8%	141,70
5700 Vale Transporte				14,41	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.771,19</b>	<b>775,89</b>		
<b>Líquido</b>				<b>995,30</b>		
<b>008059 Arivaldo Reis Ferreira</b>						
				200:00	Motorista de Caminhão I	18/08/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,35	19,49		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.470,27
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:59	14,92		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B110 - Base IRRF Salário	2.470,27
0268 Descanso Semanal Remunerado			352,90		B120 - Dedução IRRF Salário	218,05
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		150,26		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	218,05
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,09		B400 - Base FGTS Salário	2.470,27
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		150,26		B410 - FGTS Salário 8%	197,62
1010 H. E. 50%	P	6:26	86,66		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	64:20	97,01		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	2:57	40,04			
5010 INSS				218,06		
5110 IRRF				11,90		
<b>Totais</b>			<b>2.470,27</b>	<b>229,96</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.240,31</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007969	Artur Alberto Paula Da Silva	200:00	Operador de Rolo Compactador	25/03/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,12	34,43		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.977,01
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:32	8,51		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.110,24		B110 - Base IRRF Salário	1.977,01
0268 Descanso Semanal Remunerado			282,43		B120 - Dedução IRRF Salário	162,24
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		112,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	162,24
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		37,47		B400 - Base FGTS Salário	1.977,01
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		112,41		B410 - FGTS Salário 8%	158,16
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	49:50	55,31		B900 - Remuneração Total Mês	1.110,24
1064 H. E. Not. 70%	P	19:46	223,80		B905 - Salário Hora	10,28
5010 INSS				162,25	B920 - Base Salário Família	584,34
<b>Totais</b>			<b>1.977,01</b>	<b>162,25</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.814,76</b>		
<b>008049 Bruno de Oliveira Silva</b>						
		200:00	Servente	13/07/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,28	32,22		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.979,13
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.979,13
0268 Descanso Semanal Remunerado			282,73		B120 - Dedução IRRF Salário	162,43
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		118,02		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	162,43
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,34		B400 - Base FGTS Salário	1.979,13
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		118,02		B410 - FGTS Salário 8%	158,33
1020 H. E. 70%	P	17:33	209,44		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
5010 INSS				162,44	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>1.979,13</b>	<b>162,44</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.816,69</b>		
<b>008054 Bruno Humelino Machado</b>						
		200:00	Operador de Rolo Compactador	17/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
3090 Rescisão Negativa			309,95		B102 - Dependentes IRRF 13°	379,18
7010 Insuficiência de Saldo				309,95		
<b>Totais</b>			<b>309,95</b>	<b>309,95</b>	- Desligado em 02/09/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>007972 Bruno Miranda dos Santos</b>						
		200:00	Operador de Máquinas Pesadas I	20/04/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,39	40,11		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.738,29
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:18	19,84		B102 - Dependentes IRRF 13°	568,77
0261 Intermitente Horas	I		1.727,04		B110 - Base IRRF Salário	2.738,29
0268 Descanso Semanal Remunerado			287,84		B120 - Dedução IRRF Salário	250,22
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		68,46		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	250,22
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		205,37		B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	2.738,29
1020 H. E. 70%	P	3:03	53,30		B417 - FGTS Salário ( GRFC ) 8%	219,06
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	74:37	128,94		B450 - Base FGTS (50%)	1.162,81
1064 H. E. Not. 70%	P	11:46	207,39		B455 - Saldo de FGTS	943,75
5010 INSS				250,22	B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	465,13
5340 Adiantamento de Rescisão				2.488,07		
<b>Totais</b>			<b>2.738,29</b>	<b>2.738,29</b>	- Desligado em 30/09/2020 (Dispensa Sem Justa Causa)	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008004	Caio Marcio Joia da Silva	180:00	Vigia	06/05/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0:34	0,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	258,51
0261 Intermitente Horas	I		177,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			36,93		B110 - Base IRRF Salário	258,51
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		17,28		B120 - Dedução IRRF Salário	19,38
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		5,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	19,38
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		17,28		B400 - Base FGTS Salário	258,51
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	18:18	3,59		B410 - FGTS Salário 8%	20,68
5010 INSS				19,38	B900 - Remuneração Total Mês	177,12
					B905 - Salário Hora	7,38
<b>Totais</b>			<b>258,51</b>	<b>19,38</b>		
<b>Líquido</b>				<b>239,13</b>		
<b>001991 Carlos Antonio da Fonseca</b>						
		220:00	Pedreiro	06/07/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.157,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
5010 INSS				180,53	B110 - Base IRRF Salário	1.294,55
5310 Adiantamento Salarial				863,03	B120 - Dedução IRRF Salário	180,53
5700 Vale Transporte				20,86	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,53
					B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
					B903 - Salário Mês	2.157,58
<b>Totais</b>			<b>2.157,58</b>	<b>1.064,42</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.093,16</b>		
<b>007997 Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho</b>						
		200:00	Servente	27/04/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,19	29,85		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.008,38
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:35	14,51		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.123,20		B110 - Base IRRF Salário	2.008,38
0268 Descanso Semanal Remunerado			286,91		B120 - Dedução IRRF Salário	165,07
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		113,82		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	165,07
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		37,94		B400 - Base FGTS Salário	2.008,38
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		113,82		B410 - FGTS Salário 8%	160,67
1020 H. E. 70%	P	1:48	21,48		B900 - Remuneração Total Mês	1.123,20
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	83:54	94,30		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	15:03	172,55		B920 - Base Salário Família	598,27
5010 INSS				165,07		
<b>Totais</b>			<b>2.008,38</b>	<b>165,07</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.843,31</b>		
<b>007960 Carlos Eduardo Santos do Carmo</b>						
		200:00	Operador de Espargidor	25/03/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,40	42,48		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.312,89
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:49	11,58		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		1.274,72		B110 - Base IRRF Salário	2.312,89
0268 Descanso Semanal Remunerado			330,41		B120 - Dedução IRRF Salário	199,17
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		129,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	199,17
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		43,19		B400 - Base FGTS Salário	2.312,89
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,56		B410 - FGTS Salário 8%	185,03
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	59:04	75,25		B900 - Remuneração Total Mês	1.274,72
1064 H. E. Not. 70%	P	21:15	276,14		B905 - Salário Hora	10,28
5010 INSS				199,17	B920 - Base Salário Família	707,76
<b>Totais</b>			<b>2.312,89</b>	<b>199,17</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.113,72</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007948	Celso Alves da Costa	220:00	Operador de Fresadora II	16/03/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.800,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.231,23
0190 DSR s/ Salário Variável		1,57	24,77		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:34	32,73		B110 - Base IRRF Salário	2.111,23
1020 H. E. 70%	P	2:00	43,28		B120 - Dedução IRRF Salário	311,30
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	83:33	212,72		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	311,30
1064 H. E. Not. 70%	P	4:32	117,73		B400 - Base FGTS Salário	3.231,23
5010 INSS				311,30	B410 - FGTS Salário 8%	258,50
5120 IRRF s/ Adiantamento				37,90	B900 - Remuneração Total Mês	2.800,00
5310 Adiantamento Salarial				1.082,10	B903 - Salário Mês	2.800,00
5700 Vale Transporte				26,13	B920 - Base Salário Família	3.231,23
<b>Totais</b>			<b>3.231,23</b>	<b>1.457,43</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.773,80</b>		
<b>007967 Cristiano Nascimento Da Silva</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	01/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,44	34,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.539,76
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:43	19,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.539,76
0268 Descanso Semanal Remunerado			362,82		B120 - Dedução IRRF Salário	226,39
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		145,26		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,39
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		48,42		B400 - Base FGTS Salário	2.539,76
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		145,26		B410 - FGTS Salário 8%	203,18
1010 H. E. 50%	P	3:54	52,53		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	88:15	126,73		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	13:02	168,44			
5010 INSS				226,39		
5110 IRRF				16,48		
<b>Totais</b>			<b>2.539,76</b>	<b>242,87</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.296,89</b>		
<b>008050 David Batista Nardoto Carvalho</b>						
		220:00	Laboratorista I	21/07/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	10,45
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>004387 Denis Bezerra da Silva</b>						
		220:00	Apontador	16/06/2014	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.666,62
0190 DSR s/ Salário Variável		14,28	161,46		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	55:19	1.049,47		B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant)	379,18
5010 INSS				372,26	B110 - Base IRRF Salário	2.684,34
5120 IRRF s/ Adiantamento				155,05	B120 - Dedução IRRF Salário	372,25
5310 Adiantamento Salarial				827,23	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	372,25
5700 Vale Transporte				24,56	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	546,75
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	41,00
					B400 - Base FGTS Salário	3.666,62
					B410 - FGTS Salário 8%	293,33
					B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
					B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	3.666,62
<b>Totais</b>			<b>3.666,62</b>	<b>1.379,10</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.287,52</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007975	Devayr Pedro Luciano	180:00	Vigia	20/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,29	33,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.430,20
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3:27	25,42		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B110 - Base IRRF Salário	2.430,20
0268 Descanso Semanal Remunerado			347,17		B120 - Dedução IRRF Salário	213,25
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		135,25		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	213,25
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		45,08		B400 - Base FGTS Salário	2.430,20
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		135,25		B410 - FGTS Salário 8%	194,42
1040 H. E. 100%	P	4:59	73,55		B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	111:58	165,26		B905 - Salário Hora	7,38
1070 H. E. Not. 100%	P	8:00	141,70		B920 - Base Salário Família	754,63
5010 INSS				213,25		
<b>Totais</b>			<b>2.430,20</b>	<b>213,25</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.216,95</b>		
<b>008001 Fabio Henrique Fernandes</b>						
		200:00	Sinaleiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,48	58,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.600,05
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:51	18,94		B110 - Base IRRF Salário	2.600,05
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B120 - Dedução IRRF Salário	233,63
0268 Descanso Semanal Remunerado			371,44		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	233,63
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		137,21		B400 - Base FGTS Salário	2.600,05
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		45,74		B410 - FGTS Salário 8%	208,00
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		137,21		B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
1020 H. E. 70%	P	1:44	21,75		B905 - Salário Hora	7,38
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:43	123,13			
1064 H. E. Not. 70%	P	26:25	357,83			
5010 INSS				233,63		
5110 IRRF				34,68		
<b>Totais</b>			<b>2.600,05</b>	<b>268,31</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.331,74</b>		
<b>007735 Fabricio Aurelio da Silva Barros</b>						
		110:00	Pedreiro	21/03/2018	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.078,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.078,79
3936 Ajuda Compensatória Mensal 30 %	A		323,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				81,41	B110 - Base IRRF Salário	647,27
5310 Adiantamento Salarial				431,52	B120 - Dedução IRRF Salário	81,40
5700 Vale Transporte				10,79	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	81,40
					B400 - Base FGTS Salário	1.078,79
					B410 - FGTS Salário 8%	86,30
					B900 - Remuneração Total Mês	1.078,79
					B903 - Salário Mês	1.078,79
<b>Totais</b>			<b>1.402,43</b>	<b>523,72</b>		
<b>Líquido</b>				<b>878,71</b>		
<b>008064 Felipe Medeiros Santos Pinhal</b>						
		220:00	Servente	02/09/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,28	24,78		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.492,28
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:49	6,94		B110 - Base IRRF Salário	1.492,28
0261 Intermitente Horas	I		842,40		B120 - Dedução IRRF Salário	118,62
0268 Descanso Semanal Remunerado			213,18		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	118,62
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		85,20		B400 - Base FGTS Salário	1.492,28
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		28,40		B410 - FGTS Salário 8%	119,38
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		85,20		B900 - Remuneração Total Mês	842,40
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	58:53	45,10		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	20:37	161,08			
5010 INSS				118,62		
<b>Totais</b>			<b>1.492,28</b>	<b>118,62</b>	- Admitido em 02/09/2020	
<b>Líquido</b>				<b>1.373,66</b>		

# Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
000058	Fernando Jose Azevedo dos Santos	220:00	Arquiteto	08/04/2008	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.458,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
5110 IRRF				551,39	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,66	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5310 Adiantamento Salarial				2.933,36	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.458,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,08
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.664,05
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
					B920 - Base Salário Família	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>13.573,06</b>	<b>8.768,49</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.804,57</b>		
<b>008037 Filipe Sales da Costa</b>						
				200:00	Servente	09/07/2020 2 3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,59	34,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.100,37
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:43	15,65		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	2.100,37
0268 Descanso Semanal Remunerado			300,05		B120 - Dedução IRRF Salário	173,67
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		117,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	173,67
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitent	I		39,05		B400 - Base FGTS Salário	2.100,37
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,15		B410 - FGTS Salário 8%	168,03
1020 H. E. 70%	P	1:08	13,53		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	88:19	101,74		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	17:54	210,33		B920 - Base Salário Família	649,04
5010 INSS				173,67		
<b>Totais</b>			<b>2.100,37</b>	<b>173,67</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.926,70</b>		
<b>007989 Francisco Joaquim Pereira</b>						
				200:00	Encarregado de Pavimentação I	27/04/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
3090 Rescisão Negativa			86,06		B102 - Dependentes IRRF 13°	189,59
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		86,06	B960 - Média - Aviso Prévio	86,06
<b>Totais</b>			<b>86,06</b>	<b>86,06</b>	- Desligado em 21/09/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>007982 Geroncio de Jesus Cardial</b>						
				200:00	Rastilheiro	22/04/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,36	38,92		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.136,34
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:49	10,73		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.179,24		B110 - Base IRRF Salário	2.136,34
0268 Descanso Semanal Remunerado			305,19		B120 - Dedução IRRF Salário	177,98
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		119,82		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	177,98
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitent	I		39,94		B400 - Base FGTS Salário	2.136,34
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		119,82		B410 - FGTS Salário 8%	170,91
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	59:05	69,72		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,24
1064 H. E. Not. 70%	P	21:01	252,96		B905 - Salário Hora	9,51
5010 INSS				177,98		
<b>Totais</b>			<b>2.136,34</b>	<b>177,98</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.958,36</b>		



# Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
000249	Gilberto Augusto Ferro Costa Assumpcao	220:00	Engenheiro de Segurança do Trabalho	04/05/2009	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.743,00		B090 - Dependentes IRRF Sal (a maior)	189,59
5010 INSS				713,08	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				551,39	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,66	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5310 Adiantamento Salarial				2.933,36	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5350 Adiantamento de Folha	G			3.743,00	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
					B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,08
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.611,91
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>13.858,06</b>	<b>9.053,49</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.804,57</b>		
<b>006807 Givanildo Santos Andrade</b>						
				220:00	Apontador	14/03/2016 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.966,38
0190 DSR s/ Salário Variável		6,06	68,09		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	5:28	103,71		B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant)	379,18
1040 H. E. 100%	P	15:11	338,89		B110 - Base IRRF Salário	1.984,10
5010 INSS				277,59	B120 - Dedução IRRF Salário	277,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				54,05	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	277,59
5310 Adiantamento Salarial				928,23	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	546,63
5700 Vale Transporte				24,56	B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	40,99
					B400 - Base FGTS Salário	2.966,38
					B410 - FGTS Salário 8%	237,31
					B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
					B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	2.966,38
<b>Totais</b>			<b>2.966,38</b>	<b>1.284,43</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.681,95</b>		
<b>007996 Glaucio Dias Guimaraes Manco</b>						
				200:00	Servente	27/04/2020 2 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,30	18,66		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.804,82
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:16	12,07		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.067,04		B110 - Base IRRF Salário	1.804,82
0268 Descanso Semanal Remunerado			257,83		B120 - Dedução IRRF Salário	146,75
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		106,94		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	146,75
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		35,65		B400 - Base FGTS Salário	1.804,82
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		106,94		B410 - FGTS Salário 8%	144,39
1020 H. E. 70%	P	6:05	72,60		B900 - Remuneração Total Mês	1.067,04
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	73:26	78,43		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	4:28	48,66		B920 - Base Salário Família	479,95
5010 INSS				146,75		
<b>Totais</b>			<b>1.804,82</b>	<b>146,75</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.658,07</b>		
<b>004350 Guilherme Dias de Oliveira</b>						
				220:00	Servente	12/06/2014 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>					- Afastado desde: 04/08/2014 Motivo: Auxilio Doença	
<b>Líquido</b>						

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007977	Higor Souza Muniz	200:00	Servente	22/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,13	0,57		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	798,91
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:15	3,33		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		533,52		B110 - Base IRRF Salário	798,91
0268 Descanso Semanal Remunerado			114,13		B120 - Dedução IRRF Salário	59,91
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		52,28		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	59,91
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		17,43		B400 - Base FGTS Salário	798,91
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		52,28		B410 - FGTS Salário 8%	63,91
0400 Salário Família		1	48,62		B900 - Remuneração Total Mês	533,52
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	40:33	21,65		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:41	3,72		B920 - Base Salário Família	151,26
5010 INSS				59,91		
<b>Totais</b>			<b>847,53</b>	<b>59,91</b>		
<b>Líquido</b>				<b>787,62</b>		
007994	Hugo Ricardo Leite Vieira	200:00	Servente	27/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,58	37,16		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.967,74
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:10	11,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.067,04		B110 - Base IRRF Salário	1.967,74
0268 Descanso Semanal Remunerado			281,11		B120 - Dedução IRRF Salário	161,41
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		108,82		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	161,41
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		36,27		B400 - Base FGTS Salário	1.967,74
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		108,82		B410 - FGTS Salário 8%	157,42
1020 H. E. 70%	P	1:18	15,51		B900 - Remuneração Total Mês	1.067,04
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	70:34	75,37		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	20:45	226,04			
5010 INSS				161,41		
<b>Totais</b>			<b>1.967,74</b>	<b>161,41</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.806,33</b>		
008055	Hurciel de Sousa Barbosa	200:00	Operador de Bob Cat	17/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,12	20,31		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.294,37
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:09	4,50		B102 - Dependentes IRRF 13°	379,18
0261 Intermitente Horas	I		781,28		B110 - Base IRRF Salário	1.294,37
0268 Descanso Semanal Remunerado			130,21		B120 - Dedução IRRF Salário	100,81
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		95,51		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	100,81
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		31,84		B400 - Base FGTS Salário	1.294,37
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		95,51		B410 - FGTS Salário 8%	103,55
0400 Salário Família		1	48,62			
1020 H. E. 70%	P	6:43	117,38			
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	37:24	29,25			
1064 H. E. Not. 70%	P	1:50	14,62			
5010 INSS				100,81		
5340 Adiantamento de Rescisão				1.216,98		
5625 DSR s/ Faltas	P	1		26,04		
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			25,20		
<b>Totais</b>			<b>1.369,03</b>	<b>1.369,03</b>	- Desligado em 29/09/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
001339	Ivanilza Nunes dos Santos	220:00	Auxiliar de Serviços Gerais	13/07/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.543,64		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.543,64
5010 INSS				123,24	B110 - Base IRRF Salário	926,18
5310 Adiantamento Salarial				617,46	B120 - Dedução IRRF Salário	123,24
5700 Vale Transporte				15,44	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,24
					B400 - Base FGTS Salário	1.543,64
					B410 - FGTS Salário 8%	123,49
					B900 - Remuneração Total Mês	1.543,64
					B903 - Salário Mês	1.543,64

# Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.543,64</b>	<b>756,14</b>			
<b>Líquido</b>			<b>787,50</b>			
<b>008067</b>	<b>Jailson Tomas da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Rastilheiro</b>	<b>28/09/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0261	Intermitente Horas	I	228,24		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	326,69
0268	Descanso Semanal Remunerado		46,67		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)	I	22,19		B110 - Base IRRF Salário	326,69
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I	7,40		B120 - Dedução IRRF Salário	24,50
0354	13o. Proporcional (Intermitente)	I	22,19		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	24,50
5010	INSS			24,50	B400 - Base FGTS Salário	326,69
					B410 - FGTS Salário 8%	26,14
					B900 - Remuneração Total Mês	228,24
					B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>		<b>326,69</b>	<b>24,50</b>	<b>- Admitido em 28/09/2020</b>		
<b>Líquido</b>			<b>302,19</b>			
<b>008038</b>	<b>Jesus Afonso dos Santos</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/07/2020</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190	DSR s/ Salário Variável		4,31	26,01	B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.023,63
0191	DSR s/ Adicional Noturno		2:42	15,59	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261	Intermitente Horas	I	1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	2.023,63
0268	Descanso Semanal Remunerado		289,09		B120 - Dedução IRRF Salário	166,44
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)	I	116,26		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	166,44
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I	38,75		B400 - Base FGTS Salário	2.023,63
0354	13o. Proporcional (Intermitente)	I	116,26		B410 - FGTS Salário 8%	161,89
1020	H. E. 70%	P	1:18	15,51	B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	87:58	101,34	B905 - Salário Hora	7,02
1064	H. E. Not. 70%	P	13:04	153,54		
5010	INSS			166,44		
<b>Totais</b>		<b>2.023,63</b>	<b>166,44</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.857,19</b>			
<b>007950</b>	<b>João Santos Gonçalves Barbosa</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>17/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário		30	1.544,40	B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.904,94
0190	DSR s/ Salário Variável		4,13	29,60	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191	DSR s/ Adicional Noturno		2:38	18,48	B110 - Base IRRF Salário	1.287,18
1020	H. E. 70%	P	1:36	19,09	B120 - Dedução IRRF Salário	155,76
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	85:32	120,09	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,76
1064	H. E. Not. 70%	P	12:06	173,28	B400 - Base FGTS Salário	1.904,94
5010	INSS			155,76	B410 - FGTS Salário 8%	152,40
5310	Adiantamento Salarial			617,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5700	Vale Transporte			14,41	B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>		<b>1.904,94</b>	<b>787,93</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.117,01</b>			
<b>008007</b>	<b>Jorge Luiz de Barros Tortura</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>06/05/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190	DSR s/ Salário Variável		6,22	48,00	B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.775,85
0191	DSR s/ Adicional Noturno		2:41	20,24	B110 - Base IRRF Salário	2.775,85
0261	Intermitente Horas	I	1.508,64		B120 - Dedução IRRF Salário	254,72
0268	Descanso Semanal Remunerado		396,55		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	254,72
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)	I	153,78		B400 - Base FGTS Salário	2.775,85
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I	51,26		B410 - FGTS Salário 8%	222,07
0354	13o. Proporcional (Intermitente)	I	153,78		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1010	H. E. 50%	P	7:54	106,41	B905 - Salário Hora	8,98
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	87:15	131,57		
1060	Hora Extra Noturna 50%	P	15:09	205,62		
5010	INSS			254,73		
5110	IRRF			46,28		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>2.775,85</b>	<b>301,01</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.474,84</b>			
<b>001902</b>	<b>Jose Renato Maia Tavares</b>	<b>220:00</b>	<b>Engenheiro Civil</b>	<b>24/04/2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.743,00		B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5010 INSS				713,08	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5110 IRRF				603,53	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,08
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.716,18
5350 Adiantamento de Folha	G			3.743,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>		<b>13.858,06</b>	<b>9.105,63</b>			
<b>Líquido</b>			<b>4.752,43</b>			
<b>008009</b>	<b>Juarez Almeida Goncalves Junior</b>	<b>200:00</b>	<b>Assistente Administrativo I</b>	<b>11/05/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		19,12	203,78		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.155,94
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:54	30,73		B110 - Base IRRF Salário	5.155,94
0261 Intermitente Horas	I		2.122,16		B120 - Dedução IRRF Salário	580,76
0268 Descanso Semanal Remunerado			736,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	580,76
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		230,75		B400 - Base FGTS Salário	5.155,94
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		76,92		B410 - FGTS Salário 8%	412,48
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		230,75		B900 - Remuneração Total Mês	2.122,16
1020 H. E. 70%	P	3:47	83,23		B905 - Salário Hora	12,94
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	94:08	199,75			
1064 H. E. Not. 70%	P	57:21	1.241,31			
5010 INSS				580,76		
5110 IRRF				393,29		
<b>Totais</b>		<b>5.155,94</b>	<b>974,05</b>			
<b>Líquido</b>			<b>4.181,89</b>			
<b>008039</b>	<b>Julio Cesar dos Santos da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Pedreiro</b>	<b>09/07/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		4,47	35,42		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.608,32
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:28	18,25		B110 - Base IRRF Salário	2.608,32
0261 Intermitente Horas	I		1.483,56		B120 - Dedução IRRF Salário	234,62
0268 Descanso Semanal Remunerado			372,62		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	234,62
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		149,83		B400 - Base FGTS Salário	2.608,32
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		49,94		B410 - FGTS Salário 8%	208,67
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		149,83		B900 - Remuneração Total Mês	1.483,56
1020 H. E. 70%	P	1:38	26,41		B905 - Salário Hora	9,51
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	79:56	118,62			
1064 H. E. Not. 70%	P	13:28	203,84			
5010 INSS				234,62		
5110 IRRF				35,23		
<b>Totais</b>		<b>2.608,32</b>	<b>269,85</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.338,47</b>			
<b>007985</b>	<b>Julio Cesar Vieira de Paula</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão Espargidor</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		0,35	3,99		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.132,64
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:19	15,82		B110 - Base IRRF Salário	2.132,64
0261 Intermitente Horas	I		1.364,96		B120 - Dedução IRRF Salário	177,54
0268 Descanso Semanal Remunerado			304,66		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	177,54
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		134,77		B400 - Base FGTS Salário	2.132,64
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		44,92		B410 - FGTS Salário 8%	170,61
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		134,77		B900 - Remuneração Total Mês	1.364,96
					B905 - Salário Hora	8,98

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
1010	H. E. 50%	P	0:18	4,04		
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	75:23	102,82		
1060	Hora Extra Noturna 50%	P	1:47	21,89		
5010	INSS			177,54		
<b>Totais</b>			<b>2.132,64</b>	<b>177,54</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.955,10</b>			
<b>008053</b>	<b>Lohan Antunes Eduardo da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Técnico em Edificações</b>	<b>19/12/2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário	30	2.908,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.908,56
5010	INSS			270,65	B110 - Base IRRF Salário	1.745,14
5120	IRRF s/ Adiantamento			55,04	B120 - Dedução IRRF Salário	270,65
5310	Adiantamento Salarial			1.108,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,65
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	646,35
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	48,47
					B400 - Base FGTS Salário	2.908,56
					B410 - FGTS Salário 8%	232,68
					B900 - Remuneração Total Mês	2.908,56
					B903 - Salário Mês	2.908,56
<b>Totais</b>			<b>2.908,56</b>	<b>1.434,07</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.474,49</b>			
<b>008000</b>	<b>Luiz Alberto Lemos Correa</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Rolo Compactador</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
3090	Rescisão Negativa		51,55		B102 - Dependentes IRRF 13°	189,59
5650	Aviso Previo não Cumprido	30		51,55	B960 - Média - Aviso Prévio	51,55
<b>Totais</b>			<b>51,55</b>	<b>51,55</b>	- Desligado em 21/09/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>			<b>0,00</b>			
<b>007936</b>	<b>Luiz Claudio Ferrari Campos</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário	30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.749,61
0190	DSR s/ Salário Variável	1,20	9,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191	DSR s/ Adicional Noturno	2:34	18,00		B110 - Base IRRF Salário	1.131,85
1020	H. E. 70%	P	1:07	13,33	B120 - Dedução IRRF Salário	141,78
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	83:21	117,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,78
1064	H. E. Not. 70%	P	3:19	47,50	B400 - Base FGTS Salário	1.749,61
5010	INSS			141,78	B410 - FGTS Salário 8%	139,97
5310	Adiantamento Salarial			617,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5700	Vale Transporte			14,41	B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.749,61</b>	<b>773,95</b>		
<b>Líquido</b>			<b>975,66</b>			
<b>007954</b>	<b>Luiz Henrique Costa da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>17/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário	30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.860,45
0190	DSR s/ Salário Variável	3,35	25,17		B110 - Base IRRF Salário	1.242,69
0191	DSR s/ Adicional Noturno	2:25	16,97		B120 - Dedução IRRF Salário	151,75
1020	H. E. 70%	P	1:40	19,89	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	151,75
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	78:35	110,33	B400 - Base FGTS Salário	1.860,45
1064	H. E. Not. 70%	P	10:02	143,69	B410 - FGTS Salário 8%	148,84
5010	INSS			151,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5310	Adiantamento Salarial			617,76	B903 - Salário Mês	1.544,40
5700	Vale Transporte			13,90		
<b>Totais</b>			<b>1.860,45</b>	<b>783,42</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.077,03</b>			

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007988	Magno Santos da Silva	200:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,51	43,68		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.324,26
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:50	11,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0261 Intermitente Horas	I		1.274,72		B110 - Base IRRF Salário	2.324,26
0268 Descanso Semanal Remunerado			332,04		B120 - Dedução IRRF Salário	200,53
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,69		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	200,53
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,23		B400 - Base FGTS Salário	2.324,26
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,69		B410 - FGTS Salário 8%	185,94
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	59:22	75,63		B900 - Remuneração Total Mês	1.274,72
1064 H. E. Not. 70%	P	21:51	283,94		B905 - Salário Hora	10,28
5010 INSS				200,53	B920 - Base Salário Família	717,50
<b>Totais</b>			<b>2.324,26</b>	<b>200,53</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.123,73</b>		
<b>008063 Marcelo Reis Luiz</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	25/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,35	32,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.443,50
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:21	16,47		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.400,88		B110 - Base IRRF Salário	2.443,50
0268 Descanso Semanal Remunerado			349,07		B120 - Dedução IRRF Salário	214,84
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		141,25		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	214,84
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,08		B400 - Base FGTS Salário	2.443,50
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		141,25		B410 - FGTS Salário 8%	195,48
1010 H. E. 50%	P	2:13	29,86		B900 - Remuneração Total Mês	1.400,88
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	76:29	107,08		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	14:10	178,50		B920 - Base Salário Família	693,55
5010 INSS				214,84		
<b>Totais</b>			<b>2.443,50</b>	<b>214,84</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.228,66</b>		
<b>000011 Marcelo Vidal de Negreiros</b>						
		220:00	Pedreiro	01/11/2002	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.138,13		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		1:59	19,45		B110 - Base IRRF Salário	1.294,55
5010 INSS				180,53	B120 - Dedução IRRF Salário	180,53
5310 Adiantamento Salarial				863,03	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,53
5700 Vale Transporte				21,58	B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
					B903 - Salário Mês	2.157,58
<b>Totais</b>			<b>2.157,58</b>	<b>1.065,14</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.092,44</b>		
<b>007949 Marcio da Silva de Souza</b>						
		220:00	Servente	17/03/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.898,91
0190 DSR s/ Salário Variável		4,06	28,83		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:38	18,44		B110 - Base IRRF Salário	1.281,15
1020 H. E. 70%	P	1:35	18,90		B120 - Dedução IRRF Salário	155,21
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	85:21	119,83		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,21
1064 H. E. Not. 70%	P	11:46	168,51		B400 - Base FGTS Salário	1.898,91
5010 INSS				155,22	B410 - FGTS Salário 8%	151,91
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				14,41	B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.898,91
<b>Totais</b>			<b>1.898,91</b>	<b>787,39</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.111,52</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007995	Marcio Ribeiro Bento	200:00	Servente	27/04/2020	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,37	28,78		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.577,32
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:49	7,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		870,48		B110 - Base IRRF Salário	1.577,32
0268 Descanso Semanal Remunerado			225,33		B120 - Dedução IRRF Salário	126,27
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		88,45		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	126,27
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		29,48		B400 - Base FGTS Salário	1.577,32
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		88,45		B410 - FGTS Salário 8%	126,19
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	59:02	51,36		B900 - Remuneração Total Mês	870,48
1064 H. E. Not. 70%	P	21:05	187,09		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				126,27	B920 - Base Salário Família	481,51
<b>Totais</b>			<b>1.577,32</b>	<b>126,27</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.451,05</b>		
<b>008057 Marcio Santos</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,05	0,63		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.206,81
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:14	16,01		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.206,81
0268 Descanso Semanal Remunerado			315,26		B120 - Dedução IRRF Salário	186,44
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		141,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	186,44
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		47,14		B400 - Base FGTS Salário	2.206,81
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		141,42		B410 - FGTS Salário 8%	176,54
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	72:27	104,04		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:19	4,09		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				186,44		
<b>Totais</b>			<b>2.206,81</b>	<b>186,44</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.020,37</b>		
<b>007984 Marcos Soares do Nascimento</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,22	40,51		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.700,75
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:34	19,42		B110 - Base IRRF Salário	2.700,75
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B120 - Dedução IRRF Salário	245,71
0268 Descanso Semanal Remunerado			385,82		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	245,71
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		152,92		B400 - Base FGTS Salário	2.700,75
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		50,97		B410 - FGTS Salário 8%	216,06
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		152,92		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1010 H. E. 50%	P	2:07	28,51		B905 - Salário Hora	8,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	83:43	126,24			
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	17:18	234,80			
5010 INSS				245,71		
5110 IRRF				41,33		
<b>Totais</b>			<b>2.700,75</b>	<b>287,04</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.413,71</b>		
<b>007048 Marcos Vinicius Singello Patrocinio</b>						
		220:00	Auxiliar de Engenharia	28/04/2016	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.844,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.844,56
5010 INSS				262,97	B110 - Base IRRF Salário	1.706,74
5120 IRRF s/ Adiantamento				50,82	B120 - Dedução IRRF Salário	262,97
5310 Adiantamento Salarial				1.087,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	262,97
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	632,17
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	47,41
					B400 - Base FGTS Salário	2.844,56
					B410 - FGTS Salário 8%	227,56
					B900 - Remuneração Total Mês	2.844,56
					B903 - Salário Mês	2.844,56
<b>Totais</b>			<b>2.844,56</b>	<b>1.400,79</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.443,77</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007973	Matheus Cordeiro Soares Silva	200:00	Servente	20/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,46	29,42		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.577,99
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:41	7,34		B110 - Base IRRF Salário	1.577,99
0261 Intermitente Horas	I		870,48		B120 - Dedução IRRF Salário	126,33
0268 Descanso Semanal Remunerado			225,43		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	126,33
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		88,46		B400 - Base FGTS Salário	1.577,99
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		29,49		B410 - FGTS Salário 8%	126,24
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		88,46		B900 - Remuneração Total Mês	870,48
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	54:48	47,68		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	21:33	191,23			
5010 INSS				126,33		
<b>Totais</b>			<b>1.577,99</b>	<b>126,33</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.451,66</b>		
007978	Matheus Gomes Mariano	200:00	Servente	22/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
008013	Oswaldo Manoel Rodrigues Da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,15	1,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.223,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:19	16,70		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.223,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			317,66		B120 - Dedução IRRF Salário	188,45
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		141,62		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	188,45
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,21		B400 - Base FGTS Salário	2.223,59
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		141,62		B410 - FGTS Salário 8%	177,89
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	75:36	108,56		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:54	11,63		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				188,45		
<b>Totais</b>			<b>2.223,59</b>	<b>188,45</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.035,14</b>		
000469	Oswaldo Pecanha Sobrinho	220:00	Engenheiro Civil	04/09/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	11.179,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	11.179,80
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		4.142,00		B110 - Base IRRF Salário	6.707,88
5010 INSS				713,08	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5110 IRRF				779,21	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	9.614,63
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.229,78	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	367,21
5310 Adiantamento Salarial				3.242,14	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.673,68
5350 Adiantamento de Folha	G			4.142,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	11.179,80
					B410 - FGTS Salário 8%	894,38
					B900 - Remuneração Total Mês	11.179,80
					B903 - Salário Mês	11.179,80
<b>Totais</b>			<b>15.321,80</b>	<b>10.106,21</b>		
<b>Líquido</b>				<b>5.215,59</b>		



# Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança no Trabalho	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.817,51		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.766,48
5010 INSS				253,60	B110 - Base IRRF Salário	1.639,48
5310 Adiantamento Salarial				1.127,00	B120 - Dedução IRRF Salário	253,60
5610 Atrasos	P	0:59		12,60	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	253,60
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		38,43	B400 - Base FGTS Salário	2.766,48
5700 Vale Transporte				28,18	B410 - FGTS Salário 8%	221,32
					B900 - Remuneração Total Mês	2.817,51
					B903 - Salário Mês	2.817,51
<b>Totais</b>			<b>2.817,51</b>	<b>1.459,81</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.357,70</b>		
004950	Rafael Da Anunciacao Barros	220:00	Auxiliar de Engenharia	15/09/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.258,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.258,67
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		218,50		B110 - Base IRRF Salário	1.955,20
5010 INSS				315,14	B120 - Dedução IRRF Salário	315,14
5120 IRRF s/ Adiantamento				24,90	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	2.476,59
5310 Adiantamento Salarial				1.278,57	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	240,54
5350 Adiantamento de Folha	G			218,50	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	24,90
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	315,14
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	58,77
					B400 - Base FGTS Salário	3.258,67
					B410 - FGTS Salário 8%	260,69
					B900 - Remuneração Total Mês	3.258,67
					B903 - Salário Mês	3.258,67
<b>Totais</b>			<b>3.477,17</b>	<b>1.837,11</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.640,06</b>		
008040	Rafael das Neves Alves	200:00	Servente	09/07/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,53	29,96		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.589,42
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:51	8,06		B110 - Base IRRF Salário	1.589,42
0261 Intermitente Horas	I		870,48		B120 - Dedução IRRF Salário	127,36
0268 Descanso Semanal Remunerado			227,06		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	127,36
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		88,59		B400 - Base FGTS Salário	1.589,42
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		29,53		B410 - FGTS Salário 8%	127,15
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		88,59		B900 - Remuneração Total Mês	870,48
1020 H. E. 70%	P	1:00	11,93		B905 - Salário Hora	7,02
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	60:15	52,42			
1064 H. E. Not. 70%	P	20:36	182,80			
5010 INSS				127,36		
<b>Totais</b>			<b>1.589,42</b>	<b>127,36</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.462,06</b>		
007999	Rafael Martins da Silva	200:00	Servente	27/04/2020	2	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,18	42,02		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.169,10
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:43	15,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	2.169,10
0268 Descanso Semanal Remunerado			309,87		B120 - Dedução IRRF Salário	181,91
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		117,94		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	181,91
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		39,31		B400 - Base FGTS Salário	2.169,10
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,94		B410 - FGTS Salário 8%	173,53
1020 H. E. 70%	P	1:48	21,48		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	88:29	101,93		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	21:25	251,65		B920 - Base Salário Família	707,95
5010 INSS				181,92		
<b>Totais</b>			<b>2.169,10</b>	<b>181,92</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.987,18</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008005	Rafael Romao Rosa	180:00	Vigia	06/05/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,42	27,25		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.147,54
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			306,79		B110 - Base IRRF Salário	2.147,54
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		131,99		B120 - Dedução IRRF Salário	179,33
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		44,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	179,33
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		131,99		B400 - Base FGTS Salário	2.147,54
1040 H. E. 100%	P	12:00	177,12		B410 - FGTS Salário 8%	171,80
5010 INSS				179,33	B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	512,35
<b>Totais</b>			<b>2.147,54</b>	<b>179,33</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.968,21</b>		
<b>008060 Regis Antonio Julio de Souza</b>						
				200:00	Apropriador	19/08/2020 0 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,18	46,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.357,48
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:57	12,41		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.274,72		B110 - Base IRRF Salário	2.357,48
0268 Descanso Semanal Remunerado			336,78		B120 - Dedução IRRF Salário	204,52
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		130,08		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	204,52
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,36		B400 - Base FGTS Salário	2.357,48
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		130,08		B410 - FGTS Salário 8%	188,60
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	63:20	80,69		B900 - Remuneração Total Mês	1.274,72
1064 H. E. Not. 70%	P	23:18	302,78		B905 - Salário Hora	10,28
5010 INSS				204,52		
<b>Totais</b>			<b>2.357,48</b>	<b>204,52</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.152,96</b>		
<b>000178 Reinaldo Rangel Soares</b>						
				180:00	Vigia	02/02/2009 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.873,21
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3:41	33,28		B110 - Base IRRF Salário	1.223,77
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	119:55	216,33		B120 - Dedução IRRF Salário	152,90
5010 INSS				152,90	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,90
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.873,21
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	149,86
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>			<b>1.873,21</b>	<b>818,58</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.054,63</b>		
<b>007958 Renato Oliveira de Azevedo Silva</b>						
				220:00	Laboratorista II	19/03/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.546,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.186,95
0190 DSR s/ Salário Variável		5,05	58,82		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:18	26,59		B110 - Base IRRF Salário	2.168,40
1020 H. E. 70%	P	4:25	86,87		B120 - Dedução IRRF Salário	305,10
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	74:42	172,86		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	305,10
1064 H. E. Not. 70%	P	12:31	295,43		B400 - Base FGTS Salário	3.186,95
5010 INSS				305,10	B410 - FGTS Salário 8%	254,96
5120 IRRF s/ Adiantamento				55,44	B900 - Remuneração Total Mês	2.546,38
5310 Adiantamento Salarial				963,11	B903 - Salário Mês	2.546,38
5700 Vale Transporte				22,92	B920 - Base Salário Família	3.186,95
<b>Totais</b>			<b>3.186,95</b>	<b>1.346,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.840,38</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>008002</b>	<b>Renato Pereira</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Acabadora I</b>	<b>29/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,39	46,84		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.555,54
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:50	12,86		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.408,64		B110 - Base IRRF Salário	2.555,54
0268 Descanso Semanal Remunerado			365,08		B120 - Dedução IRRF Salário	228,29
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		143,17		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	228,29
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		47,72		B400 - Base FGTS Salário	2.555,54
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		143,17		B410 - FGTS Salário 8%	204,44
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	59:22	83,59		B900 - Remuneração Total Mês	1.408,64
1064 H. E. Not. 70%	P	21:12	304,47		B905 - Salário Hora	11,36
5010 INSS				228,29		
5110 IRRF				17,52		
<b>Totais</b>			<b>2.555,54</b>	<b>245,81</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.309,73</b>		
<b>007991</b>	<b>Roberto Carlos de Oliveira</b>	<b>200:00</b>	<b>Rastilheiro</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,18	20,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.562,87
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:14	5,86		B110 - Base IRRF Salário	1.562,87
0261 Intermitente Horas	I		951,00		B120 - Dedução IRRF Salário	124,97
0268 Descanso Semanal Remunerado			158,50		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	124,97
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		109,90		B400 - Base FGTS Salário	1.562,87
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		36,30		B410 - FGTS Salário 8%	125,03
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		109,90			
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	40:01	38,10			
1064 H. E. Not. 70%	P	13:41	132,87			
1640 Vale Alimentação	I		109,33			
5010 INSS				124,97		
5340 Adiantamento de Rescisão				1.345,63		
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			201,60		
<b>Totais</b>			<b>1.672,20</b>	<b>1.672,20</b>	- Desligado em 18/09/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>007966</b>	<b>Roberto Cordeiro</b>	<b>200:00</b>	<b>Encarregado de Pavimentação I</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,26	68,96		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.863,69
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:49	19,43		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		2.141,48		B110 - Base IRRF Salário	3.863,69
0268 Descanso Semanal Remunerado			551,96		B120 - Dedução IRRF Salário	399,84
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		217,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	399,84
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		72,47		B400 - Base FGTS Salário	3.863,69
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		217,41		B410 - FGTS Salário 8%	309,10
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	58:58	126,31		B900 - Remuneração Total Mês	2.141,48
1064 H. E. Not. 70%	P	20:31	448,26		B905 - Salário Hora	17,27
5010 INSS				399,85		
5110 IRRF				136,34		
<b>Totais</b>			<b>3.863,69</b>	<b>536,19</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.327,50</b>		
<b>008018</b>	<b>Rodrigo de Oliveira Pinto</b>	<b>200:00</b>	<b>Encarregado de Obras II</b>	<b>15/06/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,51	129,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.306,34
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:45	45,42		B110 - Base IRRF Salário	6.306,34
0261 Intermitente Horas	I		3.301,32		B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
0268 Descanso Semanal Remunerado			900,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		339,19		B400 - Base FGTS Salário	6.306,34
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		113,06		B410 - FGTS Salário 8%	504,51
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		339,19		B900 - Remuneração Total Mês	3.301,32
1020 H. E. 70%	P	2:48	95,82		B905 - Salário Hora	20,13
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	89:25	295,25			

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
1064	H. E. Not. 70%	P	22:10	746,58		
5010	INSS			713,08		
5110	IRRF			668,79		
<b>Totais</b>				<b>6.306,34</b>	<b>1.381,87</b>	
<b>Líquido</b>					<b>4.924,47</b>	
<b>007946</b>	<b>Rogério Martins</b>		<b>220:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>16/03/2020</b>	<b>0 1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário	30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.142,42
0191	DSR s/ Adicional Noturno	2:28	22,22		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1050	Adicional Noturno 20,0%	P 80:26	144,46		B110 - Base IRRF Salário	1.352,12
5010	INSS			178,71	B120 - Dedução IRRF Salário	178,71
5310	Adiantamento Salarial			790,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	178,71
5700	Vale Transporte			18,44	B400 - Base FGTS Salário	2.142,42
					B410 - FGTS Salário 8%	171,39
					B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>2.142,42</b>	<b>987,45</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.154,97</b>		
<b>003586</b>	<b>Romildo Herminio dos Santos</b>		<b>110:00</b>	<b>Servente</b>	<b>11/02/2014</b>	<b>0 0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário	30	781,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	781,35
3936	Ajuda Compensatória Mensal 24 %	A	187,52		B110 - Base IRRF Salário	468,81
5010	INSS			58,60	B120 - Dedução IRRF Salário	58,60
5310	Adiantamento Salarial			312,54	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	58,60
5700	Vale Transporte			7,81	B400 - Base FGTS Salário	781,35
					B410 - FGTS Salário 8%	62,51
					B900 - Remuneração Total Mês	781,35
					B903 - Salário Mês	781,35
<b>Totais</b>			<b>968,87</b>	<b>378,95</b>		
<b>Líquido</b>				<b>589,92</b>		
<b>007993</b>	<b>Ronaldo Alves da Costa</b>		<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0 0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190	DSR s/ Salário Variável	3,55	22,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.936,41
0191	DSR s/ Adicional Noturno	2:33	14,35		B110 - Base IRRF Salário	1.936,41
0261	Intermitente Horas	I	1.123,20		B120 - Dedução IRRF Salário	158,59
0268	Descanso Semanal Remunerado		276,63		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,59
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)	I	112,99		B400 - Base FGTS Salário	1.936,41
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I	37,66		B410 - FGTS Salário 8%	154,91
0354	13o. Proporcional (Intermitente)	I	112,99		B900 - Remuneração Total Mês	1.123,20
1020	H. E. 70%	P 7:38	91,10		B905 - Salário Hora	7,02
1050	Adicional Noturno 20,0%	P 83:00	93,29			
1064	H. E. Not. 70%	P 4:33	52,16			
5010	INSS			158,59		
<b>Totais</b>			<b>1.936,41</b>	<b>158,59</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.777,82</b>		
<b>000435</b>	<b>Samuel Jose Acioli</b>		<b>220:00</b>	<b>Encarregado de Obras II</b>	<b>10/08/2009</b>	<b>1 0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário	30	4.653,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.653,38
5010	INSS			510,40	B110 - Base IRRF Salário	2.792,03
5120	IRRF s/ Adiantamento			55,73	B120 - Dedução IRRF Salário	2.025,86
5210	Pensão s/ Salário			1.515,46	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	510,40
5310	Adiantamento Salarial			1.805,62	B400 - Base FGTS Salário	4.653,38
5700	Vale Transporte			46,53	B410 - FGTS Salário 8%	372,27
					B900 - Remuneração Total Mês	4.653,38
					B903 - Salário Mês	4.653,38
					B920 - Base Salário Família	4.653,38
<b>Totais</b>			<b>4.653,38</b>	<b>3.933,74</b>		
<b>Líquido</b>				<b>719,64</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007980	Samuel Marcos Alves	200:00	Servente	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,29	4,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	605,09
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0:26	1,29		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		589,68		B110 - Base IRRF Salário	605,09
0268 Descanso Semanal Remunerado			86,44		B120 - Dedução IRRF Salário	45,38
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		54,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	45,38
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		18,19		B400 - Base FGTS Salário	605,09
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		54,57		B410 - FGTS Salário 8%	48,41
1020 H. E. 70%	P	2:07	25,26		B900 - Remuneração Total Mês	589,68
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	14:11	8,37		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:32	3,21			
5010 INSS				45,38		
5624 Faltas (H)	P	55:00		162,25		
5625 DSR s/ Faltas	P	4		78,62		
<b>Totais</b>			<b>845,96</b>	<b>286,25</b>		
<b>Líquido</b>				<b>559,71</b>		
<b>007947 Sandro Leandro Batista de Mattos</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.158,20
0190 DSR s/ Salário Variável		0,12	1,78		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:31	22,55		B110 - Base IRRF Salário	1.367,90
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	81:36	146,55		B120 - Dedução IRRF Salário	180,61
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:43	11,58		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,61
5010 INSS				180,61	B400 - Base FGTS Salário	2.158,20
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B410 - FGTS Salário 8%	172,66
5700 Vale Transporte				18,44	B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>2.158,20</b>	<b>989,35</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.168,85</b>		
<b>008011 Thiago Lucindo Ferreira</b>						
		200:00	Auxiliar de Laboratório	19/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,25	47,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.427,26
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:51	18,28		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.280,84		B110 - Base IRRF Salário	2.427,26
0268 Descanso Semanal Remunerado			346,75		B120 - Dedução IRRF Salário	212,89
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		131,38		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	212,89
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,79		B400 - Base FGTS Salário	2.427,26
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		131,38		B410 - FGTS Salário 8%	194,18
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:49	118,81		B900 - Remuneração Total Mês	1.280,84
1064 H. E. Not. 70%	P	23:38	308,56		B905 - Salário Hora	7,81
5010 INSS				212,89	B920 - Base Salário Família	799,67
<b>Totais</b>			<b>2.427,26</b>	<b>212,89</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.214,37</b>		
<b>003495 Valdir dos Santos</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	15/01/2014	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.034,27
					B903 - Salário Mês	1.975,74
					B920 - Base Salário Família	2.034,27
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	58,53
<b>Totais</b>					- Afastado desde: 23/08/2016 Motivo: Auxílio Doença	
<b>Líquido</b>						

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008058	Vanderlei das Neves Rogerio	200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,46	5,49		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.275,41
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:37	18,74		B110 - Base IRRF Salário	2.275,41
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B120 - Dedução IRRF Salário	194,67
0268 Descanso Semanal Remunerado			325,06		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	194,67
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		142,21		B400 - Base FGTS Salário	2.275,41
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,40		B410 - FGTS Salário 8%	182,03
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		142,21		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1010 H. E. 50%	P	2:15	30,31		B905 - Salário Hora	8,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	84:49	121,80			
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:25	5,39			
5010 INSS				194,67		
5110 IRRF				13,26		
<b>Totais</b>			<b>2.275,41</b>	<b>207,93</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.067,48</b>		
<b>008003 Victor Hugo Marques da Silva</b>						
008003	Victor Hugo Marques da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,34	11,23		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.327,02
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:36	18,71		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.327,02
0268 Descanso Semanal Remunerado			332,43		B120 - Dedução IRRF Salário	200,86
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		142,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	200,86
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,60		B400 - Base FGTS Salário	2.327,02
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		142,81		B410 - FGTS Salário 8%	186,16
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	84:41	121,61		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	5:39	73,02		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				200,87		
<b>Totais</b>			<b>2.327,02</b>	<b>200,87</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.126,15</b>		
<b>000483 Vinicius Martingil Pereira</b>						
000483	Vinicius Martingil Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	14/09/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.344,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.437,64
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0:38	12,37		B110 - Base IRRF Salário	2.699,68
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	20:21	80,38		B120 - Dedução IRRF Salário	480,20
5010 INSS				480,20	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	480,20
5110 IRRF				23,66	B400 - Base FGTS Salário	4.437,64
5120 IRRF s/ Adiantamento				218,67	B410 - FGTS Salário 8%	355,01
5310 Adiantamento Salarial				1.519,29	B900 - Remuneração Total Mês	4.344,89
5700 Vale Transporte				37,66	B903 - Salário Mês	4.344,89
<b>Totais</b>			<b>4.437,64</b>	<b>2.279,48</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.158,16</b>		
<b>008061 Vitoriano Oliveira do Vale</b>						
008061	Vitoriano Oliveira do Vale	200:00	Motorista de Caminhão I	20/08/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008041	Waldeci Luis Piannta	180:00	Vigia	09/07/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,42	27,25		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.147,54
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			306,79		B110 - Base IRRF Salário	2.147,54
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		131,99		B120 - Dedução IRRF Salário	179,33
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		44,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	179,33
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		131,99		B400 - Base FGTS Salário	2.147,54
1040 H. E. 100%	P	12:00	177,12		B410 - FGTS Salário 8%	171,80
5010 INSS				179,33	B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	512,35
<b>Totais</b>			<b>2.147,54</b>	<b>179,33</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.968,21</b>		
<b>008015 Wallace Armando De Campos Pessoa</b>						
				200:00	Motorista de Caminhão I	28/05/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		10,32	79,51		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.877,61
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			411,09		B110 - Base IRRF Salário	2.877,61
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		154,96		B120 - Dedução IRRF Salário	266,94
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		51,65		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	266,94
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		154,96		B400 - Base FGTS Salário	2.877,61
1010 H. E. 50%	P	38:22	516,80		B410 - FGTS Salário 8%	230,21
5010 INSS				266,94	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
5110 IRRF				24,56	B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	957,88
<b>Totais</b>			<b>2.877,61</b>	<b>291,50</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.586,11</b>		
<b>008014 Wallace Martins Bispo Santos</b>						
				200:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,33	62,95		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.861,89
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:47	20,51		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.472,72		B110 - Base IRRF Salário	2.861,89
0268 Descanso Semanal Remunerado			408,84		B120 - Dedução IRRF Salário	265,05
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		151,88		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	265,05
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,63		B400 - Base FGTS Salário	2.861,89
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		151,88		B410 - FGTS Salário 8%	228,95
1010 H. E. 50%	P	2:07	28,51		B900 - Remuneração Total Mês	1.472,72
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	90:34	133,31		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	28:44	380,66		B920 - Base Salário Família	980,33
5010 INSS				265,05		
5110 IRRF				23,52		
<b>Totais</b>			<b>2.861,89</b>	<b>288,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.573,32</b>		
<b>008052 Wanderson Silva Pinto</b>						
				220:00	Apropriador	23/07/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,03	22,19		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.619,58
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:32	18,41		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.603,68		B110 - Base IRRF Salário	2.619,58
0268 Descanso Semanal Remunerado			374,23		B120 - Dedução IRRF Salário	235,97
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		144,49		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	235,97
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		48,16		B400 - Base FGTS Salário	2.619,58
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		144,49		B410 - FGTS Salário 8%	209,57
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	82:05	119,68		B900 - Remuneração Total Mês	1.603,68
1064 H. E. Not. 70%	P	9:42	144,25		B905 - Salário Hora	10,28
5010 INSS				235,97		
5110 IRRF				21,75		
<b>Totais</b>			<b>2.619,58</b>	<b>257,72</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.361,86</b>		

## Folha de Pagamento 09/2020

21/10/2020 06:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008042	Wellington de Souza	200:00	Operador de Espargidor	09/07/2020	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,52	13,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.529,28
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:14	5,86		B110 - Base IRRF Salário	1.529,28
0261 Intermitente Horas	I		945,76		B120 - Dedução IRRF Salário	121,95
0268 Descanso Semanal Remunerado			218,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	121,95
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		93,97		B400 - Base FGTS Salário	1.529,28
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		31,32		B410 - FGTS Salário 8%	122,34
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		93,97		B900 - Remuneração Total Mês	945,76
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	40:14	38,06		B905 - Salário Hora	10,28
1064 H. E. Not. 70%	P	9:09	88,29		B920 - Base Salário Família	365,05
5010 INSS				121,95		
<b>Totais</b>			<b>1.529,28</b>	<b>121,95</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.407,33</b>		
<b>007976 Weverson da Silva Luiz</b>						
				180:00	Vigia	20/04/2020 4 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,15	1,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.148,11
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3:27	25,41		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B110 - Base IRRF Salário	2.148,11
0268 Descanso Semanal Remunerado			306,87		B120 - Dedução IRRF Salário	179,40
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		132,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	179,40
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		44,00		B400 - Base FGTS Salário	2.148,11
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		132,00		B410 - FGTS Salário 8%	171,85
1020 H. E. 70%	P	0:59	12,34		B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	111:55	165,19		B905 - Salário Hora	7,38
5010 INSS				179,40	B920 - Base Salário Família	512,84
<b>Totais</b>			<b>2.148,11</b>	<b>179,40</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.968,71</b>		
<b>007981 Willians Goncalves Martins</b>						
				200:00	Servente	22/04/2020 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,23	35,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.061,26
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2:33	14,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.123,20		B110 - Base IRRF Salário	2.061,26
0268 Descanso Semanal Remunerado			294,47		B120 - Dedução IRRF Salário	169,83
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		114,43		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	169,83
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		38,14		B400 - Base FGTS Salário	2.061,26
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		114,43		B410 - FGTS Salário 8%	164,90
1020 H. E. 70%	P	1:10	13,92		B900 - Remuneração Total Mês	1.123,20
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	82:50	93,10		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	19:08	219,36		B920 - Base Salário Família	643,59
5010 INSS				169,83		
<b>Totais</b>			<b>2.061,26</b>	<b>169,83</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.891,43</b>		





**PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação - SMIHC  
Subsecretaria de Conservação

**ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 01/06**

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
01	<p><b>FATURA E FOLHA DE MEDIÇÃO:</b></p> <p><b>a)</b> Estão atestadas por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo) para serviços de área técnica ou para Contrato acima de R\$ 80.000,00, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p><b>b)</b> Indicam o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p><b>c)</b> Estão atestadas (assinatura e carimbo) nos campos Confere, Coordenador Geral e/ou Visto, respectivamente, pelo servidor que as conferiu (Conferente) e pelo Coordenador Geral ou Responsável/Substituto autorizado/nomeado (hierarquicamente superior aos fiscais), conforme Resolução SMO nº 169/1980.</p>	
02	<p><b>NOTA FISCAL:</b></p> <p><b>a)</b> Tem a indicação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e do CNPJ 042.498.733/0001-48 como Tomador dos Serviços.</p> <p><b>b)</b> Tem data de emissão que favorece o recolhimento da retenção do INSS, em tempo hábil, pela Secretaria Municipal de Fazenda, para que se evite incidência de juros a serem pagos pelo Município, tendo em vista o prazo para cumprimento da retenção legal de recolhimento até dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão do respectivo documento fiscal, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.</p> <p><b>c)</b> No caso de Nota Fiscal Eletrônica, foi verificada a sua autenticidade junto ao site do respectivo Município.</p> <p><b>d)</b> Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p><b>e)</b> Está atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo) para serviços de área técnica ou para Contrato acima de R\$ 80.000,00, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p><b>f)</b> Foi verificada a situação cadastral do prestador de serviço de outro município no CEPOM, quando aplicável, através do site <a href="http://dief.rio.gov.br/cepom">http://dief.rio.gov.br/cepom</a>, quanto ao ISS.</p>	
03	<p><b>QUADRO/JUSTIFICATIVA COMPROVANDO BASE DE CÁLCULO DO INSS QUANDO RETIDO A MENOR NA NOTA FISCAL (VALORES/ITENS REF. MÃO DE OBRA) OU ISENTO DE RETENÇÃO (QUANDO SÓ EQUIPAMENTO) – INFRN Nº 971/09 ART.121:</b></p> <p><b>a)</b> Está juntado e assinado pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	

## ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 02/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
04	<p><b>BOLETIM DE DESEMPENHO:</b></p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o nome dos fiscais, o nº do boletim, nº da medição, o nº da etapa, o objeto e o nº do Contrato.</p> <p>c) Está preenchido devidamente com as notas conceituais, o índice de desempenho da etapa e a justificativa para os conceitos aplicados.</p> <p>d) Está assinado pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	
05	<p><b>NOTA(S) DE EMPENHO(S) INDICADA(S) PARA O PRESENTE FATURAMENTO:</b></p> <p>a) Tem saldo suficiente para atender o valor total da presente medição.</p> <p>b) Tem como favorecido, o emitente dos documentos comprobatórios da cobrança.</p> <p>c) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p>	
06	<p><b>MEMORANDO DE INÍCIO OU COMUNICAÇÃO DE INÍCIO:</b></p> <p>a) Cópia está juntada.</p>	
07	<p><b>CRONOGRAMA VIGENTE:</b></p> <p>a) Cópia está juntada.</p>	
08	<p><b>QUADRO RESOLUÇÃO SMO Nº 169/80 (ELEMENTOS DA MEDIÇÃO, LOGRADOUROS BENEFICIADOS NA MEDIÇÃO E VALORES POR AP):</b></p> <p>a) Está devidamente preenchido, com as quantidades relacionadas aos respectivos logradouros beneficiados pela execução dos serviços, correspondente à medição apresentada e de acordo com os elementos orçados no contrato.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>c) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	
09	<p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:</b></p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p>	
10	<p><b>RESUMO DOS VALORES UTILIZADOS POR AP OU POR USINA DE ASFALTO, CONFORME O CASO:</b></p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p>	

## ANEXO I DA PORTARIA “N” SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 03/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
11	<p><b>NOTA(S) FISCAL(IS), RELATIVAS(S) AO(S) MATERIAL(IS) DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO(S) E/OU A(S) FERRAMENTA(S) E EQUIPAMENTO(S) ALUGADO(S), QUE COMPROVE(M) AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO PROJETO APROVADO E ORÇADO, CONFORME ART. 1º, DO DECRETO RIO Nº 43.189/2017:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p> <p>b) Foi verificada a autenticidade de cada documento apresentado e a de seu emitente.</p>	
12	<p><b>DECLARAÇÃO ATESTANDO A ADEQUADA APLICAÇÃO DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2º, DO DECRETO RIO Nº 43.189/2017:</b></p> <p>a) Está juntada e foi atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	
13	<p><b>DOCUMENTO DE CONSULTA PARA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EXTRAÍDO DO SITE DA RECEITA FEDERAL:</b></p> <p>a) Consta o documento obtido no site: <a href="http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/">http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/</a>.</p>	
14	<p><b>PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCAIS/ATESTADORES:</b></p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) de designação dos fiscais ou servidores que atestam a presente despesa.</p>	
15	<p><b>PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL E DE TERMOS ADITIVOS EXISTENTES:</b></p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) autorizativo(s).</p>	
16	<p><b>PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÕES E DE REINÍCIOS DE CONTAGEM DE PRAZO AUTORIZADAS:</b></p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) autorizativo(s).</p>	
17	<p><b>INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA CEI, conforme o caso:</b></p> <p>a) Cópia está juntada.</p> <p>b) Está preenchida adequadamente aos serviços contratados.</p>	
18	<p><b>DECLARAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DOS VALORES DA FATURA, para o caso de MATRÍCULA CEI:</b></p> <p>a) Está assinada pelo CONTADOR (CARIMBO/CRC) e pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificados.</p>	
19	<p><b>GARANTIA CONTRATUAL E ENDOSSOS COBRINDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p>	

## ANEXO I DA PORTARIA “N” SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 04/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
20	<p><b>RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA QUE ATUARAM NA MEDIÇÃO (INDICANDO NOME E FUNÇÃO):</b></p> <p>a) Está juntada e as funções descritas tem especificação no orçamento autorizado;</p> <p>b) No caso de ausência de algum nome nas Guias de Recolhimento e Folha de Pagamento, a Contratada apresentou justificativa para a ausência/divergência entre esses documentos e a Relação apresentada.</p> <p>c) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>d) Foi assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p> <p>e) Foi atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	
21	<p><b>GUIA FGTS (GFIP), PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EXCETO COMPROVANTE VIA INTERNETBANK, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO PRAZO DE RECOLHIMENTO:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p> <p>b) Foram verificadas as informações constantes na(s) GUIA(S) apresentada(s), incluindo a identificação numérica e/ou código de barras entre a(s) GUIA(S) e seus respectivos comprovantes de pagamento.</p> <p>c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de guia do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Folha de Pagamento de Trabalhadores do mês anterior, agrupando-o por mês cronologicamente.</u></p>	
22	<p><b>GUIA GPS (INSS), PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EXCETO COMPROVANTE VIA INTERNETBANK, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO O PRAZO DE RECOLHIMENTO. NO CASO DE MATRÍCULA CEI, A GUIA DEVE ESTAR SOB O Nº INSCRIÇÃO DA MATRÍCULA CEI:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s) – Caso o valor recolhido na GUIA divergir ao valor indicado na GPS emitida pela SEFIP, a Contratada deverá juntar Declaração com justificativa.</p> <p>b) Foram verificadas as informações constantes na(s) GUIA(S) apresentada(s), incluindo a identificação numérica e/ou código de barras entre a(s) GUIA(S) e seus respectivos comprovantes de pagamento.</p> <p>c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de guia do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Guia FGTS do mês da medição, agrupando-o por mês cronologicamente.</u></p>	

## ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 05/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
23	<p><b>PROTOCOLO DE ENVIO DA(S) SEFIP(S), ESPECÍFICA(S) DA(S) SEFIP(S) APRESENTADA(S):</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p> <p>b) Caso de obrigatoriedade de apresentação de Protocolo de Envio do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Guia GPS do mês da medição</u>, agrupando-o por mês cronologicamente.</p>	
24	<p><b>SEFIP COM TOMADOR EM NOME E CNPJ DA PREFEITURA, PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO O PRAZO DE RECOLHIMENTO. COM ATENÇÃO À INSCRIÇÃO, PARA O CASO DE MATRÍCULA CEI:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s) e tem a indicação do CNPJ 042.498.733/0001-48, exceto para caso com Matrícula CEI.</p> <p>b) Caso de obrigatoriedade de apresentação de SEFIP do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir do Protocolo de Envio do mês da medição</u>, agrupando-o por mês cronologicamente.</p>	
25	<p><b>FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES (FOLHA DE SALÁRIOS):</b></p> <p>a) Cópia está juntada, considerando uma Folha de Pagamento para cada competência de Guias GPS/FGTS apresentadas no presente processo.</p> <p>b) Demonstra o respectivo pagamento mensal dos funcionários indicados na Relação dos Funcionários, que atuaram no período da medição.</p> <p>c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de Folha de Pagamento do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da SEFIP do mês da medição</u>, agrupando-o por mês cronologicamente.</p>	
26	<p><b>DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE OS SALÁRIOS E O VALE-TRANSPORTE DOS EMPREGADOS, REFERENTES AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO OU AO PERÍODO DA MEDIÇÃO, ENCONTRAM-SE PAGOS:</b></p> <p>a) Está juntada, devidamente preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	
27	<p><b>DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE O TÍQUETE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO OU AO PERÍODO DA MEDIÇÃO FOI FORNECIDO AOS EMPREGADOS, NO CASO DE ACORDO:</b></p> <p>a) Está juntada, devidamente preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	
28	<p><b>DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVOU INTEGRALMENTE AS CLÁUSULAS TRABALHISTAS CONSTANTES NO CONTRATO (CONFORME ANEXO II DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 02/2018):</b></p> <p>a) Está juntada, preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	
29	<p><b>PUBLICAÇÃO DA RELEVAÇÃO DA MULTA NOS CASOS JUSTIFICADOS EM QUE OS SERVIÇOS NÃO ALCANCEM 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR PREVISTO DA ETAPA:</b></p> <p>a) Cópia da publicação está juntada.</p>	

## ANEXO I DA PORTARIA “N” SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 06/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
30	<b>PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NO CASO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.</b> <b>a) Cópia(s) da(s) publicação(ões) está(ão) juntada(s).</b>	

**Observação:** A Comissão de Fiscais/Atestadores realizará, quando aplicável, por amostragem, entrevista junto aos empregados relacionados na medição, de modo a verificar se a empresa está fazendo o depósito do FGTS, informando que solicitou cópia do respectivo Extrato de Conta do Fundo de Garantia ao empregado, em atendimento à Circular CGM nº 003/2018.

**DECLARAMOS A CONFORMIDADE dos documentos apresentados e das informações neles contidas, estando a presente despesa em condições de prosseguimento à liquidação, de acordo com o inciso I, artigo 120 do Decreto n.º 3.221/1981, alterado pelo Decreto nº 22.318/2002.**

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa  
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)



Rio de Janeiro, 26 de OUTUBRO de 2020.

À  
PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E  
CONSERVAÇÃO – SMIHC  
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO  
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.


PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: DECLARAÇÃO TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO  
REF.: 09ª MEDICAÇÃO – 06ª ETAPA INTERMEDIÁRIA  
PERIODO DE 25/09/2020 a 09/10/2020

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60 Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 024/2020 referente aos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, PROCESSO Nº. 06/300.120/2020 vem pela presente, declarar, que os TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO referente aos meses AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, encontram-se devidamente fornecidos e pagos aos empregados, apesar de os VALES TRANSPORTES não serem remunerados nas medições.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  


263ED25CCA66476  
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  


DS  




Rio de Janeiro, 26 de OUTUBRO de 2020.

À  
PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E  
CONSERVAÇÃO – SMIHC  
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO  
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.


PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: DECLARAÇÃO SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE  
REF.: 09ª MEDICÃO – 06ª ETAPA INTERMEDIÁRIA  
PERÍODO DE 25/09/2020 a 09/10/2020

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60 Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 024/2020 referente aos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, PROCESSO Nº. 06/300.120/2020 vem pela presente, declarar, que os SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE referente aos meses AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, encontram-se devidamente fornecidos e pagos aos empregados, apesar de os VALES TRANSPORTES não serem remunerados nas medições.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  


DS  






Rio de Janeiro, 26 de OUTUBRO de 2020.

À  
PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E  
CONSERVAÇÃO – SMIHC  
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO  
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.  
PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: **DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE NA PRESTAÇÃO DOS  
SERVIÇOS OBSERVOU INTEGRALMENTE AS CLÁUSULAS  
REF.: 09ª MEDIÇÃO – 06ª ETAPA INTERMEDIÁRIA  
PERÍODO DE 25/09/2020 a 09/10/2020**

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, representada por EDSON FRANCISCO NEVES DE MACEDO, portador da carteira de identidade n.º 07570270-4 DETRAN-RJ e CPF/MF n.º 891.962.017-20, declara que na prestação dos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, realizados no período de 25/09/2020 a 09/10/2020, foram observadas as cláusulas trabalhistas constantes ao Contrato nº. 024/2020 do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06/300.120/2020.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  
[Signature]

DS  
[Signature]



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	MT04050050	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 28,77	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m³		
02	MT14050300	Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do material.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 106,89	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m³		
03	TC04050700	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)	t.Km	88.444,0112	R\$ 0,49	R\$ 43.337,56
		Fresagem	1.144,96 t	x 19,00 km =	21.754,2400 t x km	(Avenida Lúcio Costa x Usina DIMENSIONAL (Bota-espera))
		Fresagem	1.144,96 t	x 4,30 km =	4.923,3280 t x km	(Usina DIMENSIONAL x Usina JPA)
		Fresagem		x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		BINDER	2.032,16 t	x 19,00 km =	38.611,0400 t x km	(Avenida Lúcio Costa)
		BINDER		x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		CBUQ	0,00 t	x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Polímero	11.782,930 m²	x 0,05 m x 2,35 t/m³ x 19,00 km =	26.305,3912 t x km	(Avenida Lúcio Costa)
		Polímero	0,000 m²	x 0,05 m x 2,35 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Polímero	0,000 m²	x 0,05 m x 2,35 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Remend (dem)	0,000 m²	x 0,05 m x 2,30 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Remend (dem)	0,000 m²	x 0,05 m x 2,30 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Remend (esc)	0,000 m²	x 0,30 m x 1,70 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Remend (esc)	0,000 m²	x 0,30 m x 1,70 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Pó (remendo)	0,000 m³	x 1,50 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Pó (remendo)	0,000 m³	x 1,50 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Brita (remendo)	0,000 m³	x 1,50 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		Brita (remendo)	0,000 m³	x 1,50 t/m³ x 0,00 km =	0,0000 t x km	
		* Fresagem	-2.624,99 t	x 20,20 km =	-53.024,7980 t x km	(Avenida Lúcio Costa) (referente à 8ª medição)
		* Fresagem	2.624,99 t	x 19,00 km =	49.874,8100 t x km	(Avenida Lúcio Costa) (referente à 8ª medição)
		Total →		88.444,0112 t.Km		
04	TC09050150	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 19,28	R\$ 0,00
		Remend (dem)	0,000 m²	x 0,05 m x 2,30 t/m³ x 20% =	0,000 t	
		Remend (esc)	0,000 m²	x 0,30 m x 1,70 t/m³ x 20% =	0,000 t	
		Total →		0,0000 t		
05	TC09050700	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 15,96	R\$ 0,00
		Asf demolido	0,000 m²	x 0,05 m x 2,30 t/m³ =	0,00 t	
		Escavação	0,000 m²	x 0,30 m x 1,70 t/m³ =	0,00 t	
		Total →		0,0000 t		
06	SC04050850	Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 198,35	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m³		
07	SC04100050	Arrancamento de tampao de ferro fundido (tampa e colar).(desonerado)	un	0,0000	R\$ 46,37	R\$ 0,00
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		Total →		0,0000 un		

DS  
EM

DS  
X

DS  
1 de 9



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
08	SC04100300	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 215,50	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m³		
09	SC09050900	Marteleteiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	185,0000	R\$ 19,86	R\$ 3.674,10
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 2,00 frentes =		185,0000 h		
		Total →		185,0000 h		
10	SC09051100	Operador de maquinas em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 22,32	R\$ 8.258,40
		2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 2,00 frentes =		370,0000 h		
		Total →		370,0000 h		
11	SC09051200	Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 21,38	R\$ 7.910,60
		2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 2,00 frentes =		370,0000 h		
		Total →		370,0000 h		
12	SC09051450	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	1.850,0000	R\$ 14,38	R\$ 26.603,00
		6,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 2,00 frentes =		1.110,0000 h		
		4,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 2,00 frentes =		740,0000 h		
		Total →		1.850,0000 h		
13	SC09100100	Operador de trafego, nivel junior, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	0,0000	R\$ 14,69	R\$ 0,00
		0,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 2,00 frentes =		0,0000 h		
14	SC09100150	Operador de trafego, nivel senior, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	0,0000	R\$ 17,87	R\$ 0,00
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		92,5000 h		
		Desconto -2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês =		-185,0000 h	(referente à 5ª medição)	
		Correção 1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês =		92,5000 h	(referente à 5ª medição)	
		Total →		0,0000 h		
15	SC14050400	Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 59,90	R\$ 0,00
		Remendos 0,00 m² x 0,15 m x 1,2 (k compact) =		0,0000 m³		
		Remendos 0,00 m² x 0,15 m x 1,2 (k compact) =		0,0000 m³		
		Total →		0,0000 m³		
16	SC14050425	Brita no 0. Fornecimento.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 104,50	R\$ 0,00
		Remendos 0,00 m² x 0,15 m x 1,2 (k compact) =		0,0000 m³		
		Remendos 0,00 m² x 0,15 m x 1,2 (k compact) =		0,0000 m³		
		Total →		0,0000 m³		
17	SC14100050	Chapa de aço de 3/4", para passagem de veiculos sobre valas, compreendendo colocacao, uso e retirada, medida pela area da chapa em cada aplicacao, inclusive mobilizacao, transporte, carga e descarga e o travamento com grampos.(desonerado)	m2	67,5000	R\$ 755,29	R\$ 50.982,07
		1,00 un x 1,50 m² x 0,0 operações =		0,0000 m²	(Renivelamento de tampão)	
		1,00 un x 1,50 m² x 0,0 operações =		0,0000 m²	(Substituição de tampão)	
		3,00 un x 1,50 m² x 15,0 operações =		67,5000 m²		
		Total →		67,5000 m²		
18	SC34050040	Levantamento ou rebaixamento de grelha de caixa de ralo sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado)	un	0,0000	R\$ 160,84	R\$ 0,00
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		Total →		0,0000 un		

DS  
EM

DS  
X

DS  
2 de 9



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
19	SC34050050	Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado)	un	0,0000	R\$ 220,04	R\$ 0,00
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		Total →	<b>0,0000 un</b>			
20	DR34050250	Tampao de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	0,0000	R\$ 416,22	R\$ 0,00
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		Total →	<b>0,0000 un</b>			
21	BP09050050	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada intermediaria (BINDER), de acordo com as especificacoes da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.(desonerado)	t	2.032,1600	R\$ 279,99	R\$ 568.984,47
		Avenida Lucio Costa 15.410,08 m <sup>2</sup> x 0,05 m x 2,35 t/m <sup>3</sup> = 1.810,6800 t				
		Remendo profundo 1.885,00 m <sup>2</sup> x 0,05 m x 2,35 t/m <sup>3</sup> = 221,4800 t				(Avenida Lúcio Costa)
		Remendo profundo 0,00 m <sup>2</sup> x 0,05 m x 2,35 t/m <sup>3</sup> = 0,0000 t				
		Total →	<b>2.032,1600 t</b>			
22	BP09050100	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificacoes da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 374,18	R\$ 0,00
		0,00 m <sup>2</sup> x 0,05 m x 2,35 t/m <sup>3</sup> = 0,0000 t				
		Total →	<b>0,0000 t</b>			
23	BP09050300	Espalhamento com vibro acabadora convencional e compactacao mecanica de qualquer tipo de concreto asfaltico usinado a quente, executado de acordo com as especificacoes da PCRJ, exclusive os materiais.(desonerado)	t	2.032,1600	R\$ 3,46	R\$ 7.031,27
		BINDER 2.032,16 t				
		CBUQ 0,00 t				
		Total →	<b>2.032,1600 t</b>			
24	BP09050400	Pintura de ligacao, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado)	m2	32.328,0100	R\$ 2,31	R\$ 74.677,70
		BINDER 15.410,08 m <sup>2</sup>				
		CBUQ 0,00 m <sup>2</sup>				
		Polímero 11.782,93 m <sup>2</sup>				
		Remendo profundc 1.885,00 m <sup>2</sup>				
		Geogrelha 3.250,00 m <sup>2</sup>				
		Total →	<b>32.328,0100 m<sup>2</sup></b>			
25	BP09050600	Micro revestimento asfaltico a frio, com emprego de emulsao modificada com polimeros, aditivo de controle de rompimento, abertura ao trafego no maximo em 2h, consumo por m2 entre 10Kg a 12Kg, em uma unica camada, com emprego da faixa III ou IV da ISSA. O preco inclui todos os materiais, equipamentos, mao de obra, execucao e transporte. O micro revestimento asfaltico a frio devera atender as especificacoes da ISSA ou do DNER.(desonerado)	m2	0,0000	R\$ 9,65	R\$ 0,00
		Total →	<b>0,0000 m<sup>2</sup></b>			



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
26	BP09050700	Revestimento de concreto asfáltico, com polímero, usinado a quente, com 5cm de espessura, executado com vibroacabadora com controle eletrônico e mesa extensiva de no mínimo 7m, conforme especificações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.(desonerado)	m <sup>2</sup>	11.782,9300	R\$ 53,64	R\$ 632.036,36
		Avenida Lucio Costa 11.782,93 m <sup>2</sup>				
		0,00 m <sup>2</sup>				
		0,00 m <sup>2</sup>				
		Total → 11.782,9300 m <sup>2</sup>				
27	BP14050060	Corte mecânico com fresadora a frio, em concreto asfáltico, em zona urbana com interferências, inclusive coleta do material em caminhão basculante, exclusive transporte do material.(desonerado)	m <sup>3</sup>	497,8086	R\$ 137,11	R\$ 68.254,53
		1.144,96 t / 2,30 t/m <sup>3</sup> = 497,8086 m <sup>3</sup> (Avenida Lúcio Costa)				
		/ 2,30 t/m <sup>3</sup> = 0,0000 m <sup>3</sup>				
		Total → 497,8086 m <sup>3</sup>				
28	BP19300050	Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado)	m	0,0000	R\$ 48,28	R\$ 0,00
		0,00 m				
		Total → 0,0000 m				
29	ET04050400	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)	m <sup>3</sup>	0,0000	R\$ 239,04	R\$ 0,00
		Preparo Manual 0,0000 m <sup>3</sup>				
		Preparo Mecânico 0,0000 m <sup>3</sup>				
		Total → 0,0000 m <sup>3</sup>				
30	ET04200050	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive materiais.(desonerado)	m <sup>3</sup>	0,0000	R\$ 102,83	R\$ 0,00
		Renivelamento 1,00 m x 1,00 m x 0,25 m = 0,2500 m <sup>3</sup>				
		Desc. Tampão 3,14 x 0,60 m x 0,60 m / 4 x 0,25 m = -0,0700 m <sup>3</sup>				
		Desc. Item -0,12 m <sup>3</sup>				
		<b>Total Renivelament</b> 0 unid x ( 0,25 m <sup>3</sup> - 0,07 m <sup>3</sup> - 0,12 m <sup>3</sup> ) = <b>0,0000 m<sup>3</sup></b>				
		Tampão novo 1,00 m x 1,00 m x 0,25 m = 0,2500 m <sup>3</sup>				
		Desc. Tampão 3,14 x 0,60 m x 0,60 m / 4 x 0,25 m = -0,0700 m <sup>3</sup>				
		<b>Total Tampão novo</b> 0 unid x ( 0,25 m <sup>3</sup> - 0,07 m <sup>3</sup> ) = <b>0,0000 m<sup>3</sup></b>				
		Total → 0,0000 m <sup>3</sup>				
31	ET04200200	Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal.(desonerado)	m <sup>3</sup>	0,0000	R\$ 52,55	R\$ 0,00
		Total → 0,0000 m <sup>3</sup>				
32	ET04250403	Lancamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.(desonerado)	m <sup>3</sup>	0,0000	R\$ 41,69	R\$ 0,00
		Total → 0,0000 m <sup>3</sup>				
33	EQ04050062	Caminhão basculante, capacidade de 5m <sup>3</sup> , com motorista, material de operação, un.mes material de manutenção e licenciamento, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 208CV. Custo mensal.(desonerado)	un.mes	1,0000	R\$ 8.744,69	R\$ 8.744,69
		1,00 un x 0,50 mês x 2,00 frentes = 1,000 un x mês				
		Total → 1,0000 un x mês				
34	EQ04050312	Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação, material de manutenção e licenciamento, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal.(desonerado)	un.mes	1,0000	R\$ 8.784,89	R\$ 8.784,89
		1,00 un x 0,50 mês x 2,00 frentes = 1,000 un x mês				
		Total → 1,0000 un x mês				



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
35	EQ14050380	Minicarregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, e as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 50CV, peso de operacao de 2,5t, capacidade de operacao de 680Kg, forca de desagregacao de 1.400Kgf, altura de descarga de 2,3m. Custo horario produtivo.(desonerado) 2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 70% x 2,00 frentes = 259,0000 h Total → 259,0000 h	h	259,0000	R\$ 84,64	R\$ 21.921,76
36	EQ14050386	Minicarregadeira, com operador e as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 50CV, peso de operacao de 2,5t, capacidade de operacao de 680Kg, forca de desagregacao de 1.400Kgf, altura de descarga de 2,3m. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) 2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 30% x 2,00 frentes = 111,0000 h Total → 111,0000 h	h	111,0000	R\$ 32,87	R\$ 3.648,57
37	EQ44050059	Mangueira para compressor de ar, duas lonas, diametro de 3/4". Custo horario corrido por decametro.(desonerado) 2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 1,0 dam x 2,00 frentes = 370,0000 h x dam Total → 370,0000 h x dam	h.dam	370,0000	R\$ 0,09	R\$ 33,30
38	EQ44050100	Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM. Custo horario produtivo.(desonerado) 2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 70% x 2,00 frentes = 259,0000 h Total → 259,0000 h	h	259,0000	R\$ 64,07	R\$ 16.594,13
39	EQ44050106	Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) 2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 30% x 2,00 frentes = 111,0000 h Total → 111,0000 h	h	111,0000	R\$ 5,65	R\$ 627,15
40	EQ44050600	Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, com material de manutencao, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as seguintes especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario produtivo.(desonerado) 1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 70% x 2,00 frentes = 129,5000 h Total → 129,5000 h	h	129,5000	R\$ 1,79	R\$ 231,80
41	EQ44050606	Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as seguintes especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) 1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 30% x 2,00 frentes = 55,5000 h Total → 55,5000 h	h	55,5000	R\$ 1,19	R\$ 66,04
42	ST74050300	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, em projetos acima de 400m2.(desonerado) 0 m / 4,85 m (espaç) = 0 faixas x 0,15 m x 0,07 m = 0,0000 m² Total → 0,0000 m²	m2	0,0000	R\$ 34,42	R\$ 0,00
43	ST74050450	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por extrusao, em projetos acima de 150m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado) Total → 0,0000 m²	m2	0,0000	R\$ 63,77	R\$ 0,00



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
44	AD14100050	Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante a operacao.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 38,86	R\$ 0,00
		Fresadora 14,450 t x 1,00 unid = 14,450 t				
		Vibroacabadora 10,500 t x 1,00 unid = 10,500 t				
		Rolo Tanden 9,400 t x 1,00 unid = 9,400 t				
		Rolo de pneus 9,000 t x 1,00 unid = 9,000 t				
		Retroescavadeira 9,439 t x 1,00 unid = 9,439 t				
		Minicarregadeira 0,629 t x 2,00 unid = 1,258 t				
		Total → 54,0470 t				
		54,047 t x 0,00 operação = 0,0000 t				
		54,047 t x 0,00 operação = 0,0000 t				
		Total → 0,0000 t				
45	AD14100300	Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos equipamentos transportados.(desonerado)	t.Km	0,0000	R\$ 1,62	R\$ 0,00
		54,047 t x 0,00 operação x 48,10 km = 0,0000 t x km				
		54,047 t x 0,00 operação x 19,00 km = 0,0000 t x km				
		Total → 0,0000 t.Km				
46	AD14150401	Caminhoneta de Servico, capacidade de 9 passageiros ou 1t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 53CV, autonomia de 3000Km/mes. Custo mensal.(desonerado)	un.mes	2,0000	R\$ 5.396,73	R\$ 10.793,46
		2,00 un x 0,50 mês = 1,0000 un.mês (Frente de serviço)				
		2,00 un x 0,50 mês = 1,0000 un.mês (Apoio)				
		Total → 2,0000 un.mês				
47	AD14150750	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)	un.mes	0,0000	R\$ 4.248,99	R\$ 0,00
		Total → 0,0000 un.mês				
48	AD19250210	Placa de sinalizacao para obra na via publica, tipo cavalete articulado, confeccionado em chapa Pet 2,4mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo, estrutura em aço tratado a base de Wash primer, pintado pelo processo eletrostatico, nas dimensoes de 0,60m x 1,00m. Fornecimento.(desonerado)	un	0,0000	R\$ 612,93	R\$ 0,00
		Total → 0,0000 un				
49	AD19250310	Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	m2	0,0000	R\$ 415,07	R\$ 0,00
		0,00 un x 2,00 m x 1,40 m x 2,00 frentes = 0,00 m²				
50	AD24050200	Aluguel de cavalete plastico universal de polietileno de alto impacto, na cor branca, com paineis de fita refletiva na dimensoes (1,15x0,61)m, permitindo adaptacao de ate 2 piscas alertas e placas de sinalizacoes diversas, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo 1 pisca alerta, primeira colocacao e retirada no final da obra.(desonerado)	un.mes	50,0000	R\$ 55,33	R\$ 2.766,50
		50,00 un x 0,50 mês x 2,00 frentes = 50,0000 un.mês				
		Total → 50,0000 un.mês				
51	AD24050250	Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com base de borracha removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta.(desonerado)	un.mes	50,0000	R\$ 51,07	R\$ 2.553,50
		50,00 un x 0,50 mês x 2,00 frentes = 50,0000 un.mês				
		Total → 50,0000 un.mês				



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
52	AD24050300	Aluguel de pisca alerta para adaptacao em cones canalizadores e cavaletes.(desonerado)	un.mes	50,0000	R\$ 38,99	R\$ 1.949,50
		50,00 un x 0,50 mês x 2,00 frentes = 50,0000 un.mês				
		Total → <b>50,0000 un.mês</b>				
53	AD24050450	Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Fornecimento.(desonerado)	m	0,0000	R\$ 0,73	R\$ 0,00
		Total → <b>0,0000 m</b>				
54	AD39050086	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 17,53	R\$ 6.486,10
		2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês = 185,0000 h				
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês = 92,5000 h				
		Desconto -2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês = -185,0000 h (referente à 5ª medição)				
		Correção 3,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês = 277,5000 h (referente à 5ª medição)				
		Total → <b>370,0000 h</b>				
55	AD39050116	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 27,49	R\$ 10.171,30
		4,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês = 370,0000 h				
56	AD39050134	Engenheiro, arquiteto ou geologo senior (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	185,0000	R\$ 185,76	R\$ 34.365,60
		2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês = 185,0000 h				
		Total → <b>185,0000 h</b>				
57	IE00027107	Mistura betuminosa tipo "gap graded", utilizando ligante de asfalto-borracha e brita 1, espalhamento e compactação, com resultado de "grip test" (ASTM) maior que 0,60, exclusive fornecimento do ligante, usinagem e transporte da massa. (desonerado)	t	0,0000	R\$ 59,61	R\$ 0,00
		Total → <b>0,0000 t</b>				
58	IE00027108	Mistura betuminosa tipo "open graded", utilizando ligante de asfalto-borracha e brita 1, espalhamento e compactação, com resultado de "grip test" (ASTM) maior que 0,75 e ruído menor que 97dB, exclusive fornecimento do ligante, usinagem e transporte da massa. (desonerado)	t	0,0000	R\$ 59,27	R\$ 0,00
		Total → <b>0,0000 t</b>				
59	IE00027109	Mistura betuminosa utilizando BMB, tipo "open graded" ou "gap graded", considerando apenas a usinagem. (desonerado)	t	0,0000	R\$ 72,15	R\$ 0,00
		Total → <b>0,0000 t</b>				
60	IE00027110	Produção de ligante modificado de asfalto-borracha (BMB) "in situ" tipo "field blend", com utilização de borracha reciclada como polímero, na proporção de 20% de pó de borracha em peso, em conformidade com ASTM 6114, ASTM D8 e com a resolução 19/2005 de 11/7/2005 da ANP. (desonerado)	t	0,0000	R\$ 3.273,93	R\$ 0,00
		Total → <b>0,0000 t</b>				





**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>ITENS A SEREM PROPOSTOS EM RERRA (SUJEITOS A APROVAÇÃO)</b>						
61	MT09050050	Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 6,54	R\$ 0,00
		Remendos 0,000 m <sup>2</sup> x 0,30 m = 0,000 m <sup>3</sup>				
		Remendos 0,000 m <sup>2</sup> x 0,30 m = 0,000 m <sup>3</sup>				
		Total → 0,0000 m <sup>3</sup>				
62	MT14050100	Compactacao de aterro em camadas de 15cm, com maco.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 40,28	R\$ 0,00
		Remendos 0,00 m <sup>2</sup> x 0,30 m = 0,0000 m <sup>3</sup>				
		Remendos 0,00 m <sup>2</sup> x 0,30 m = 0,0000 m <sup>3</sup>				
		Total → 0,0000 m <sup>3</sup>				
63	TC09050350	Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado)	t	1.144,9600	R\$ 1,19	R\$ 1.362,50
		Remend (dem) 0,000 m <sup>2</sup> x 0,05 m x 2,30 t/m <sup>3</sup> x 80% = 0,000 t				
		Remend (esc) 0,000 m <sup>2</sup> x 0,30 m x 1,70 t/m <sup>3</sup> x 80% = 0,000 t				
		Pó (remendo) 0,000 m <sup>3</sup> x 1,50 t/m <sup>3</sup> = 0,000 t				
		Brita (remendo) 0,000 m <sup>3</sup> x 1,50 t/m <sup>3</sup> = 0,000 t				
		Bota-espera 1.144,960 t + = 1.144,960 t				
		Total → 1.144,9600 t				
64	SC09051350	Rastilheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	555,0000	R\$ 19,83	R\$ 11.005,65
		3,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 2,00 frentes = 555,0000 h				
		Total → 555,0000 h				
65	SC14050050	Agua comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado)	m3	200,0000	R\$ 13,44	R\$ 2.688,00
		1,00 un x 0,50 mês x 200,0 m <sup>3</sup> /mês x 2,00 frentes = 200,0000 m <sup>3</sup>				
		Total → 200,0000 m <sup>3</sup>				
66	DR34100100	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	un	0,0000	R\$ 469,56	R\$ 0,00
		0,000 unid				
		0,000 unid				
		Total → 0,0000 un				
67	BP09050550	Reforco ou tratamento para trincamentos, com revestimento betuminoso, feito com manta de geogrelha flexivel de poliester de alta tenacidade oude fibra de vidro revestida com polimero a elevada temperatura (minimo de 180 oC), combinado com manta nao tecida ultra leve, em forma de grelha, com abertura de malha de (40x40)mm, malha fixa sem movimentacao resistencia de 50KN/m, transversal e longitudinal, especificacao segundo a norma DER-SP - ET-DE-P00/43, com as seguintes especificacoes: resistencia a tracao >=50KN/m para deformacao <=12% conforme NBR 12824; resistencia a fadiga >=90% de resistencia retida apos 100.000 ciclos carga/descarga e ponto de amolecimento >180 oC. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	m2	3.250,0000	R\$ 31,86	R\$ 103.545,00
		Av. Lúcio Costa 3.250,000 m <sup>2</sup>				
		0,000 m <sup>2</sup>				
		Total → 3.250,0000 m <sup>2</sup>				
68	EQ04050615	Caminhao tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario produtivo.(desonerado)	h	129,5000	R\$ 132,05	R\$ 17.100,47
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 70% x 2,00 frentes = 129,5000 h				
		Total → 129,5000 h				



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 9ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 6ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 9

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
69	EQ04050621	Caminhao tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)	h	55,5000	R\$ 22,85	R\$ 1.268,17
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 30% x 2,00 frentes = 55,5000 h Total → 55,5000 h				
70	EQ19050400	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para abertuar de juntas de dilatacao. Custo horario produtivo.(desonerado)	h	55,5000	R\$ 37,68	R\$ 2.091,24
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 30% x 2,00 frentes = 55,5000 h Total → 55,5000 h				
71	EQ19050406	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatacao. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)	h	129,5000	R\$ 22,49	R\$ 2.912,45
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 70% x 2,00 frentes = 129,5000 h Total → 129,5000 h				
72	AD19050500	Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado)	un.mes	2,0000	R\$ 1.042,84	R\$ 2.085,68
		2,00 un x 0,50 mês x 2,00 frentes = 2,0000 un x mês Total → 2,0000 un x mês				
73	AD19150050	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)	un.mes	1,0000	R\$ 425,64	R\$ 425,64
		2,00 un x 0,50 mês = 1,0000 un x mês				
74	AD39050068	Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	185,0000	R\$ 22,83	R\$ 4.223,55
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês x 2,00 frentes = 185,0000 h Total → 185,0000 h				
75	AD39050092	Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	185,0000	R\$ 20,02	R\$ 3.703,70
		2,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês = 185,0000 h				
76	AD39050212	Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	92,5000	R\$ 33,07	R\$ 3.058,97
		1,00 un x 0,50 mês x 185,0 h/mês = 92,5000 h				
<b>SUBTOTAL 1 (sem RERRA) → R\$</b>					<b>1.621.488,35</b>	
<b>SUBTOTAL 2 (após aprovação da RERRA) → R\$</b>					<b>155.471,02</b>	
<b>TOTAL → R\$</b>					<b>1.776.959,37</b>	



## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018****B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: 9a Etapa: 6a - INTERMEDIARIA Serviços Executados de 25/09/2020 Até 09/10/2020

Sistema: SISTEMA UNICO  
Subsistema: SUBSISTEMA UNICO  
Planilha: 1

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
1	MT 04.05.0050()	m3	231,0000	28,77	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 14.05.0300()	m3	132,0000	106,89	0,0000	0,0000	0,00
3	TC 04.05.0700()	t.Km	2.965.061,2500	0,49	88.444,0112	445.742,1142	43.337,56
4	TC 09.05.0150()	t	2.033,2500	19,28	0,0000	651,9300	0,00
5	TC 09.05.0700()	t	2.033,2500	15,96	0,0000	2.642,4196	0,00
6	SC 04.05.0850()	m3	33,0000	198,35	0,0000	0,0000	0,00
7	SC 04.10.0050()	un	80,0000	46,37	0,0000	42,0000	0,00
8	SC 04.10.0300()	m3	862,5000	215,50	0,0000	0,0000	0,00
9	SC 09.05.0900()	h	4.440,0000	19,86	185,0000	2.183,0000	3.674,10
10	SC 09.05.1100()	h	4.440,0000	22,32	370,0000	3.903,5000	8.258,40
11	SC 09.05.1200()	h	8.880,0000	21,38	370,0000	1.961,0000	7.910,60
12	SC 09.05.1450()	h	26.640,0000	14,38	1.850,0000	19.795,0000	26.603,00
13	SC 09.10.0100()	h	17.760,0000	14,69	0,0000	0,0000	0,00
14	SC 09.10.0150()	h	2.220,0000	17,87	0,0000	1.295,0000	0,00
15	SC 14.05.0400()	m3	3.588,7500	59,90	0,0000	935,8972	0,00
16	SC 14.05.0425()	m3	2.093,8500	104,50	0,0000	935,8972	0,00
17	SC 14.10.0050()	m2	800,0000	755,29	67,5000	631,5000	50.982,07
18	SC 34.05.0040()	un	1.700,0000	160,84	0,0000	102,0000	0,00
19	SC 34.05.0050()	un	800,0000	220,04	0,0000	56,0000	0,00
20	DR 34.05.0250()	un	340,0000	416,22	0,0000	42,0000	0,00
21	BP 09.05.0050()	t	25.803,0000	279,99	2.032,1600	8.341,8900	568.984,47
22	BP 09.05.0100()	t	15.510,0000	374,18	0,0000	7.376,9600	0,00
23	BP 09.05.0300()	t	41.313,0000	3,46	2.032,1600	15.718,8500	7.031,27
24	BP 09.05.0400()	m2	544.500,0000	2,31	32.328,0100	207.164,0900	74.677,70
25	BP 09.05.0600()	m2	60.000,0000	9,65	0,0000	0,0000	0,00
26	BP 09.05.0700()	m2	132.000,0000	53,64	11.782,9300	70.455,1800	632.036,36
27	BP 14.05.0060()	m3	27.150,0000	137,11	497,8086	5.425,1909	68.254,53
28	BP 19.30.0050()	m	1.650,0000	48,28	0,0000	8,8400	0,00
29	ET 04.05.0400()	m3	99,0000	239,04	0,0000	10,8600	0,00
30	ET 04.20.0050()	m3	25,0000	102,83	0,0000	10,8600	0,00
31	ET 04.20.0200()	m3	74,0000	52,55	0,0000	0,0000	0,00
32	ET 04.25.0403()	m3	99,0000	41,69	0,0000	10,8600	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto



## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018**  
**B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: 9a Etapa: 6a - INTERMEDIARIA Serviços Executados de 25/09/2020 Até 09/10/2020

Sistema: SISTEMA UNICO  
Subsistema: SUBSISTEMA UNICO  
Planilha: 1

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
33	EQ 04.05.0062()	un.mes	24,0000	8.744,69	1,0000	11,8000	8.744,69
34	EQ 04.05.0312()	un.mes	24,0000	8.784,89	1,0000	11,8000	8.784,89
35	EQ 14.05.0380()	h	3.108,0000	84,64	259,0000	2.602,9500	21.921,76
36	EQ 14.05.0386()	h	1.332,0000	32,87	111,0000	1.115,5500	3.648,57
37	EQ 44.05.0059()	h.dam	4.440,0000	0,09	370,0000	3.903,5000	33,30
38	EQ 44.05.0100()	h	3.108,0000	64,07	259,0000	2.732,4500	16.594,13
39	EQ 44.05.0106()	h	1.332,0000	5,65	111,0000	1.171,0500	627,15
40	EQ 44.05.0600()	h	3.108,0000	1,79	129,5000	1.528,1000	231,80
41	EQ 44.05.0606()	h	1.332,0000	1,19	55,5000	654,9000	66,04
42	ST 74.05.0300()	m2	22.275,0000	34,42	0,0000	1,2990	0,00
43	ST 74.05.0450()	m2	3.174,3100	63,77	0,0000	0,0000	0,00
44	AD 14.10.0050()	t	1.898,4000	38,86	0,0000	1.026,8930	0,00
45	AD 14.10.0300()	t.Km	21.696,0000	1,62	0,0000	22.967,2727	0,00
46	AD 14.15.0401()	un.mes	24,0000	5.396,73	2,0000	24,3000	10.793,46
47	AD 14.15.0750()	un.mes	12,0000	4.248,99	0,0000	0,0000	0,00
48	AD 19.25.0210()	un	200,0000	612,93	0,0000	115,0000	0,00
49	AD 19.25.0310()	m2	16,8000	415,07	0,0000	8,4000	0,00
50	AD 24.05.0200()	un.mes	600,0000	55,33	50,0000	395,0000	2.766,50
51	AD 24.05.0250()	un.mes	2.400,0000	51,07	50,0000	355,0000	2.553,50
52	AD 24.05.0300()	un.mes	1.200,0000	38,99	50,0000	115,0000	1.949,50
53	AD 24.05.0450()	m	2.399,9900	0,73	0,0000	0,0000	0,00
54	AD 39.05.0086()	h	4.440,0000	17,53	370,0000	3.200,5000	6.486,10
55	AD 39.05.0116()	h	4.440,0000	27,49	370,0000	4.902,5000	10.171,30
56	AD 39.05.0134()	h	1.110,0000	185,76	0,0000	1.443,0000	0,00
57	IE 00.02.7107()	t	6.010,1300	59,61	0,0000	0,0000	0,00
58	IE 00.02.7108()	t	969,3800	59,27	0,0000	0,0000	0,00
59	IE 00.02.7109()	t	6.979,5000	72,15	0,0000	0,0000	0,00
60	IE 00.02.7110()	t	572,9000	3.273,93	0,0000	0,0000	0,00

Soma: 1.587.122,75

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto



## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018**  
**B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: 9a Etapa: 6a - INTERMEDIARIA Serviços Executados de 25/09/2020 Até 09/10/2020

INTERMEDIARIA	Valor global previsto incluindo esta etapa	Total: R\$1.587.122,75
---------------	--	------------------------

R\$13.023.935,78	Valor global medido incluindo esta medição
------------------	--

Importa a presente Folha de Medição em: R\$ 1.587.122,75 (UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

---

 Confere

---

 Fiscal

---

 Fiscal

---

 Fiscal

---

 Visto



Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020.

**CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS**

**9ª MEDIÇÃO – 6ª ETAPA INTERMEDIÁRIA**

**PERÍODO DE 25/09/2020 a 09/10/2020**

**A:**

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ**

**Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação**

**Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional - SUBCTO**

**Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação**

**Ref.: “Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”.**

**Processo Nº 06/300.120/2020 – Contrato Nº 024/2020.**

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os **“Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **Nota Fiscal nº 007070/2020**, no valor de **R\$ 1.587.122,75 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos)**, assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **9ª Medição de Serviços - 6ª Etapa Intermediária, executados no período de 25/09/2020 à 09/10/2020**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta.

Insta salientar que os valores ora faturados baseiam-se exclusivamente nos levantamentos, nas memórias de cálculos e boletim de medição elaboradas pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA “P” N.º 034 DE 08 DE MAIO DE 2020, publicada no DORIO de 12 de maio de 2020.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  
EM

DS  
EM

DS  
EM



Nesse tocante, a empresa está procedendo ao faturamento dos quantitativos e valores apurados unilateralmente pela comissão, assim como nas medições anteriores, em que manifestamos a discordância de quantitativos e critérios adotados mas, que por única e exclusivamente devido ao cenário de total insustentabilidade financeira da empresa e do contrato, ressaltando expressamente o seu direito ao recebimento dos quantitativos reais executados e reiterando a sua discordância com alguns critérios adotados, dentre eles a apropriação de itens não medidos e outros medidos aquém do executado ou apurados de divergente da unidade contratual e das diretrizes normativas. Segue em ANEXO 2, demonstrativo das diferenças de apuração entre a medição elaborada pela Comissão e pela Dimensional e, exemplificativamente, algumas observações abaixo:

1. Não conseguimos entender as quantidades medidas dos equipamentos e mão de obra remunerados por disponibilidade, não sendo as quantidades medidas compatíveis com nossas apropriações. Salientamos que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional, que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
2. Na memória de cálculo, constam itens de equipamentos com medição de horas produtivas e improdutivas por estimativa percentual explícita, sendo tal prática, não aderente às diretrizes dos órgãos de controle. Salientamos mais uma vez, que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
3. A memória de cálculo da medição enviada pela Comissão não apresenta a área topográfica medida de fresagem. Uma vez, que a memória da Comissão apresentou informações distintas das enviadas pela Dimensional, principalmente no serviço de fresagem, faz-se necessário o encaminhamento do croqui topográfico com as áreas consideradas, de forma a trazer confiabilidade nos valores medidos. Segue abaixo, quadro comparativo das áreas apropriadas de pavimentação e volumes de fresagem pela Comissão e pela Dimensional:

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  
EM

DS  
EM

DS  
EM

DS  
EM



1ª MEDIÇÃO									
LOGRADOURO	FRESAGEM (M²)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	490,20	787,72	727,14	10.134,38	10.134,38	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	193,90	-	-	-	-	3.995,87	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>684,10</b>	<b>787,72</b>	<b>727,14</b>	<b>10.134,38</b>	<b>10.134,38</b>	<b>3.995,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>684,10</b>	<b>787,72</b>	<b>727,14</b>	<b>10.134,38</b>	<b>10.134,38</b>	<b>3.995,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2ª MEDIÇÃO									
LOGRADOURO	FRESAGEM (M²)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	707,83	492,93	952,46	14.739,05	14.739,05	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	411,45	754,85	411,45	-	-	8.850,00	12.845,87	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	355,96	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.119,28</b>	<b>1.603,74</b>	<b>1.363,91</b>	<b>14.739,05</b>	<b>14.739,05</b>	<b>8.850,00</b>	<b>12.845,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>1.803,38</b>	<b>2.391,46</b>	<b>2.091,05</b>	<b>24.873,43</b>	<b>24.873,43</b>	<b>12.845,87</b>	<b>12.845,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3ª MEDIÇÃO									
LOGRADOURO	FRESAGEM (M²)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	556,51	279,78	257,97	10.967,11	10.967,11	4.810,41	4.810,41	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	532,84	85,76	130,43	-	-	15.608,83	15.608,83	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	465,24	40,44	-	-	-	9.304,70	9.304,70	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.554,59</b>	<b>405,98</b>	<b>388,40</b>	<b>10.967,11</b>	<b>10.967,11</b>	<b>29.723,94</b>	<b>29.723,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>3.357,97</b>	<b>2.797,44</b>	<b>2.479,45</b>	<b>35.840,54</b>	<b>35.840,54</b>	<b>42.569,81</b>	<b>42.569,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4ª MEDIÇÃO									
LOGRADOURO	FRESAGEM (M²)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	14.179,52	14.179,52	24.873,43	24.873,43
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	13,11	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	276,87	261,45	244,92	-	-	-	-	3.983,73	3.983,73
RUA CMDT. RUBENS SILVA	34,93	65,87	34,78	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>324,91</b>	<b>327,31</b>	<b>279,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.179,52</b>	<b>14.179,52</b>	<b>28.857,16</b>	<b>28.857,16</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>3.682,88</b>	<b>3.124,75</b>	<b>2.759,15</b>	<b>35.840,54</b>	<b>35.840,54</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>28.857,16</b>	<b>28.857,16</b>

5ª MEDIÇÃO									
LOGRADOURO	FRESAGEM (M²)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	293,28	-	-	-	-	1.894,04	1.894,04
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	1.534,68	1.534,68
ESTRADA DO GABINAL	630,95	710,90	626,47	1.053,75	1.053,75	-	-	12.190,60	12.190,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>630,95</b>	<b>710,90</b>	<b>919,75</b>	<b>1.053,75</b>	<b>1.053,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.619,32</b>	<b>15.619,32</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>4.313,83</b>	<b>3.835,65</b>	<b>3.678,90</b>	<b>36.894,29</b>	<b>36.894,29</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>44.476,48</b>	<b>44.476,48</b>

6ª MEDIÇÃO									
LOGRADOURO	FRESAGEM (M²)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	170,43	118,94	107,16	-	-	-	-	7.843,77	7.843,77
<b>SUBTOTAL</b>	<b>170,43</b>	<b>118,94</b>	<b>107,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.843,77</b>	<b>7.843,77</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>4.484,25</b>	<b>3.954,59</b>	<b>3.786,06</b>	<b>36.894,29</b>	<b>36.894,29</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>52.320,25</b>	<b>52.320,25</b>

7ª MEDIÇÃO									
LOGRADOURO	FRESAGEM (M²)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>4.484,25</b>	<b>3.954,59</b>	<b>3.786,06</b>	<b>36.894,29</b>	<b>36.894,29</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>52.320,25</b>	<b>52.320,25</b>





LOGRADOURO	8ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. LUCIO COSTA	973,99	-	1.141,30	12.810,94	12.810,94	-	-	6.352,00	6.352,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>973,99</b>	<b>-</b>	<b>1.141,30</b>	<b>12.810,94</b>	<b>12.810,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.352,00</b>	<b>6.352,00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>5.458,24</b>	<b>3.954,59</b>	<b>4.927,36</b>	<b>49.705,23</b>	<b>49.705,23</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>58.672,25</b>	<b>58.672,25</b>

LOGRADOURO	9ª MEDIÇÃO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AV. LUCIO COSTA	648,84	-	497,81	17.295,08	17.295,08	-	-	11.782,93	11.782,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>648,84</b>	<b>-</b>	<b>497,81</b>	<b>17.295,08</b>	<b>17.295,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.782,93</b>	<b>11.782,93</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>6.107,08</b>	<b>3.954,59</b>	<b>5.425,17</b>	<b>67.000,31</b>	<b>67.000,31</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>70.455,18</b>	<b>70.455,18</b>

LOGRADOURO	ACUMULADO								
	FRESAGEM (M³)			BINDER (M²)		CAPA (M²)		CAPA C/ POLIMERO (M²)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO*1	FISCALIZAÇÃO*2	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	1.754,54	1.560,43	2.230,84	35.840,54	35.840,54	18.989,93	18.989,93	26.767,47	26.767,47
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	1.138,19	840,61	541,88	-	-	28.454,70	28.454,70	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	478,35	396,40	-	-	-	9.304,70	9.304,70	-	-
RUA TIROL	276,87	261,45	244,92	-	-	-	-	3.983,73	3.983,73
RUA CMDT. RUBENS SILVA	34,93	65,87	34,78	-	-	-	-	1.534,68	1.534,68
ESTRADA DO GABINAL	801,37	829,84	733,63	1.053,75	1.053,75	-	-	20.034,37	20.034,37
AV. LUCIO COSTA	1.622,83	-	1.639,11	30.106,02	30.106,02	-	-	18.134,93	18.134,93
<b>TOTAL</b>	<b>6.107,08</b>	<b>3.954,59</b>	<b>5.425,17</b>	<b>67.000,31</b>	<b>67.000,31</b>	<b>56.749,33</b>	<b>56.749,33</b>	<b>70.455,18</b>	<b>70.455,18</b>

## OBSERVAÇÃO:

\*1 O VOLUME DE FRESAGEM DE 3.954,59M³ REFERE-SE AO PESO APURADO PELAS NOTAS DE BALANÇA DA PREFEITURA DIVIDIDO PELO PESO ESPECÍFICO APONTADO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FISCALIZAÇÃO (2,30 T/M³) E APROPRIADAS DIARIAMENTE CONFORME EXECUÇÃO DE CADA LOGRADOURO.

\*2 O VOLUME DE FRESAGEM DE 5.425,17 M³ REFERE-SE AO VOLUME APONTADO NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO ENVIADAS PELA FISCALIZAÇÃO.

- O item de fresagem, cuja unidade do catálogo SCO e da planilha orçamentária é em metros cúbicos, está sendo aferido pela Comissão, por tonelada e transformado em metros cúbicos por um peso específico. Desta forma, destacamos que a forma de aferição deste item, devido à sua unidade de medida e conforme orientações técnicas consolidadas, bem como nenhum estabelecimento diverso no TR, Edital ou Contrato, deve se dar pela área efetivamente executada multiplicada pela espessura de projeto.
- Não identificamos o item de recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão, uma vez que o item de transporte TC 04.05.0700 (/) - *Transporte de carga de qualquer natureza, **exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar(...)***, não remuneram esse custo. Solicitamos a inclusão do item de remuneração das despesas de recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão (código EMOP 05.100.0000) na lista de itens propostos em RERRA.






6. Não foram considerados, assim como, outros reduzidos, diversos itens indiscutivelmente necessários e de custos diretos já efetivamente alocados, relativos a administração local da obra, tais como barraco de obras, mão de obra de auxiliar administrativo, engenheiro de obras, técnico de nível médio (segurança do trabalho) e vigia.

Por fim, encaminhamos em ANEXO 3, cópia da medição de serviços elaborada pela empresa, a qual julga a mais aderente à realidade contratual, com a documentação de suporte que julga pertinente para possibilitar a análise e aferição daquilo que está sendo apurado, da Medição 9 - Etapa 6 Intermediária, enviada por e-mail do dia 22/10/2020 à Comissão, bem como todas as informações comprobatórias dos serviços executados conforme relação abaixo:

- E-mail de encaminhamento da medição
- Boletim de Medição
- Relatório Fotográfico
- Diário de Obras
- Memória de Cálculo
- Projetos de Apropriação de Execução de Obras baseados no Projeto Topográfico (com demarcação das áreas e respectivos volumes dos serviços executados)
- Mapas de Distância Média de Transporte
- Projeto Executivo


Ademais, convidamos a todos a visitarem o site de transparência da obra, desenvolvido e mantido pela Dimensional: [www.pavimentarioap4.com.br](http://www.pavimentarioap4.com.br).

Atenciosamente,

DocuSigned by:  


263ED25CCA66476...  
**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**



**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# ANEXO 1



 20201027u00299904000160	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>				Número da Nota <b>00007068</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>				Data e Hora de Emissão <b>27/10/2020 15:52:27</b>	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>				Código de Verificação <b>VWSR-2BF3</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b>		Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b>		Inscrição Estadual: ---	
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>					
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>				Tel.: <b>21 2252-1341</b>	
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>					
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>		E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>33.352.394/0001-04</b>		Inscrição Municipal: <b>0.134.613-0</b>		Inscrição Estadual: ----		
Nome/Razão Social: <b>COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE</b>						
Endereço: <b>AVN PRES VARGAS 2655 - CIDADE NOVA - CEP: 20210-030</b>				Tel.: <b>2123323659</b>		
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>		E-mail: <b>nfe@cedade.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Fatura de SERVIÇOS referente à 9ª Medição, 6ª Etapa ; Intermediária, para execução de "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. ; PROGRAMA PAVIMENTA RIO", conforme Contrato n°. 024/2020, Processo n°. 06/300.120/2020, Período de Execução: 25/09/2020 a 09/10/2020.						
Mão de Obra.....R\$ 555.492,96						
Valor dos materiais incorporados a obra .....R\$ 793.561,37						
Custos Materiais não incorporados, equipamentos						
Impostos e taxas, não tem mão de obra ..... R\$ 238.068,42						
Isenta de retenção de INSS, conforme Art, 149, II, da instrução Normativa RFB n.º 971 de 13/11/2009.						
Matricula CEI n.º 90.003.50761/79						
Valor Total da Nota R\$ 1.587.122,75 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)						
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.587.122,75</b>						
Serviço Prestado <b>07.02.98 - execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, não enquadrável nos códigos anteriores</b>						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	
<b>793.561,37</b>	<b>0,00</b>	<b>793.561,38</b>	<b>3,00%</b>	<b>23.806,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010						
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br						
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM, gerado pelo sistema de NFS-e.						
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.						
- CEI / Código da Obra: CO00.211						
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.563.315,91						

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

## ANEXO 2



PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA  
MEDIÇÃO 9 - ETAPA 6 INTERMEDIÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT C/ BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
1	MT 04.05.0050 (I)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.(DESONERADO)	M3	28,77	-	-	-	-	-	-
2	MT 14.05.0300 (I)	REATERRO DE VALA, COM PÓ-DE-PEDRA, COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	106,89	-	-	-	-	-	-
3	TC 04.05.0700 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM MÉDIA VELOCIDADE (VM=40KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,49	-	-	88.444,01	43.337,56	88.444,01	43.337,56
4	TC 09.05.0150 (I)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL À GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	19,28	-	-	-	-	-	-
5	TC 09.05.0700 (I)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	15,96	-	-	-	-	-	-
6	SC 04.05.0850 (I)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DO SERVIÇO.(DESONERADO)	M3	198,35	-	-	-	-	-	-
7	SC 04.10.0050 (I)	ARRANCAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (TAMPA E COLAR).(DESONERADO)	UN	46,37	-	-	-	-	-	-
8	SC 04.10.0300 (I)	DEMOLIÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS.(DESONERADO)	M3	215,50	-	-	-	-	-	-
9	SC 09.05.0900 (I)	MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	19,86	370,00	7.348,20	185,00	3.674,10	(185,00)	(3.674,10)
10	SC 09.05.1100 (I)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,32	370,00	8.258,40	370,00	8.258,40	-	-
11	SC 09.05.1200 (I)	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	21,38	370,00	7.910,60	370,00	7.910,60	-	-
12	SC 09.05.1450 (I)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,38	3.330,00	47.885,40	1.850,00	26.603,00	(1.480,00)	(21.282,40)
13	SC 09.10.0100 (I)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL JÚNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO. (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,69	-	-	-	-	-	-
14	SC 09.10.0150 (I)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SÊNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO. (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,87	185,00	3.305,95	-	-	(185,00)	(3.305,95)
15	SC 14.05.0400 (I)	PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	59,90	-	-	-	-	-	-
16	SC 14.05.0425 (I)	BRITA Nº 0, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 20KM. FORNECIMENTO. (DESONERADO)	M3	104,50	-	-	-	-	-	-
17	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	755,29	67,50	50.982,07	67,50	50.982,07	-	-
18	SC 34.05.0040 (A)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE GRELHA DE CAIXA DE RALO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	160,84	-	-	-	-	-	-
19	SC 34.05.0050 (B)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	220,04	-	-	-	-	-	-
20	DR 34.05.0250 (I)	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO COMPLETO, ARTICULADO, PESADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, TIPO AVENIDA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	UN	416,22	-	-	-	-	-	-
21	BP 09.05.0050 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	279,99	2.032,16	568.984,47	2.032,16	568.984,47	-	-
22	BP 09.05.0100 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	374,18	-	-	-	-	-	-
23	BP 09.05.0300 (I)	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ, EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)	T	3,46	2.032,16	7.031,27	2.032,16	7.031,27	-	-
24	BP 09.05.0400 (B)	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	M2	2,31	32.328,01	74.677,70	32.328,01	74.677,70	-	-
25	BP 09.05.0600 (A)	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, COM EMPREGO DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMEROS, ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO, ABERTURA AO TRÁFEGO NO MÁXIMO EM 2H, CONSUMO POR M2 ENTRE 10KG A 12KG, EM UMA ÚNICA CAMADA, COM EMPREGO DA FAIXA III OU IV DA ISSA. O PREÇO INCLUI TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, EXECUÇÃO E TRANSPORTE. O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ISSA OU DO DNER.(DESONERADO)	M2	9,65	-	-	-	-	-	-
26	BP 09.05.0700 (A)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLÍMERO, USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRÔNICO E MESA EXTENSIVA DE NO MÍNIMO 7M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.(DESONERADO)	M2	53,64	11.782,93	632.036,36	11.782,93	632.036,36	-	-
27	BP 14.05.0060 (A)	CORTE MECÂNICO COM FRESADORA À FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	137,11	743,09	101.885,27	497,81	68.254,53	(245,28)	(33.630,74)
28	BP 19.30.0050 (I)	LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.(DESONERADO)	M	48,28	-	-	-	-	-	-
29	ET 04.05.0400 (B)	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO (FCK) MÍNIMO DE 20MPA, INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	239,04	-	-	-	-	-	-
30	ET 04.20.0050 (A)	PREPARO MANUAL DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO, EXCLUSIVE MATERIAIS.(DESONERADO)	M3	102,83	-	-	-	-	-	-
31	ET 04.20.0200 (I)	PREPARO MECÂNICO DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE MATERIAIS, CONSIDERANDO PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	52,55	-	-	-	-	-	-
32	ET 04.25.0403 (A)	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE A COLOCAÇÃO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	41,69	-	-	-	-	-	-
33	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 208CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.744,69	1,00	8.744,69	1,00	8.744,69	-	-
34	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.784,89	1,00	8.784,89	1,00	8.784,89	-	-
35	EQ 14.05.0380 (I)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	84,64	259,00	21.921,76	259,00	21.921,76	-	-
36	EQ 14.05.0386 (I)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	32,87	111,00	3.648,57	111,00	3.648,57	-	-
37	EQ 44.05.0059 (I)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO.(DESONERADO)	H.DAM	0,09	370,00	33,30	370,00	33,30	-	-

EM

X


M

PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA  
MEDIÇÃO 9 - ETAPA 6 INTERMEDIÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT C/ BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
38	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	64,07	259,00	16.594,13	259,00	16.594,13	-	-
39	EQ 44.05.0106 (I)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	5,65	111,00	627,15	111,00	627,15	-	-
40	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	1,79	129,50	231,80	129,50	231,80	-	-
41	EQ 44.05.0606 (I)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1,19	55,50	66,04	55,50	66,04	-	-
42	ST 74.05.0300 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR ASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CET-RIO, EM PROJETOS ACIMA DE 400M2.(DESONERADO)	M2	34,42	-	-	-	-	-	-
43	ST 74.05.0450 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR EXTRUSÃO, EM PROJETOS ACIMA DE 150M2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CET-RIO.(DESONERADO)	M2	63,77	-	-	-	-	-	-
44	AD 14.10.0050 (I)	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO, DURANTE A OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	38,86	-	-	-	-	-	-
45	AD 14.10.0300 (I)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS.(DESONERADO)	T.KM	1,62	-	-	-	-	-	-
46	AD 14.15.0401 (B)	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV, AUTONOMIA DE 3000 KM/MÉS. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÉS	5.396,73	2,00	10.793,46	2,00	10.793,46	-	-
47	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÉS	4.248,99	-	-	-	-	-	-
48	AD 19.25.0210 (I)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECCIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	612,93	-	-	-	-	-	-
49	AD 19.25.0310 (I)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	415,07	-	-	-	-	-	-
50	AD 24.05.0200 (I)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.(DESONERADO)	UN.MÉS	55,33	50,00	2.766,50	50,00	2.766,50	-	-
51	AD 24.05.0250 (I)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOPDE DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA.(DESONERADO)	UN.MÉS	51,07	50,00	2.553,50	50,00	2.553,50	-	-
52	AD 24.05.0300 (A)	ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTAÇÃO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES.(DESONERADO)	UN.MÉS	38,99	50,00	1.949,50	50,00	1.949,50	-	-
53	AD 24.05.0450 (A)	ROLO DE TELA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES DE (50X1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	0,73	-	-	-	-	-	-
54	AD 39.05.0086 (I)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,53	-	-	370,00	6.486,10	370,00	6.486,10
55	AD 39.05.0116 (I)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	27,49	-	-	370,00	10.171,30	370,00	10.171,30
56	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	185,76	-	-	185,00	34.365,60	185,00	34.365,60
57	IE 00.02.7107 (I)	MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	59,61	-	-	-	-	-	-
58	IE 00.02.7108 (I)	MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUÍDO MENOR QUE 97 dB, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	59,27	-	-	-	-	-	-
59	IE 00.02.7109 (I)	MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB, TIPO "OPEN GRADE" OU "GAP GRADED", CONSIDERANDO APENAS USINAGEM.(DESONERADO)	T	72,15	-	-	-	-	-	-
60	IE 00.02.7110 (I)	PRODUÇÃO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) "IN SITU" TIPO "FIELD BLEND", COM UTILIZAÇÃO DE BORRACHA RECICLADA COM POLÍMERO, NA PROPORÇÃO DE 20%, DE PÓ DE BORRACHA EM PESO, EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114, ASTM D8 E COM A RESOLUÇÃO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP.(DESONERADO)	T	3.273,93	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL POSSIVEL MEDIR</b>						<b>1.589.020,98</b>		<b>1.621.488,35</b>		<b>32.467,37</b>

**ITENS A SEREM PROPOSTOS EM RERRA**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT C/ BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
61	MT 09.05.0050 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA.(DESONERADO)	M3	6,55	-	-	-	-	-	-
62	MT 14.05.0100 (I)	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM, COM MAÇO.(DESONERADO)	M3	40,26	-	-	-	-	-	-
63	TC 09.05.0350 (I)	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHÃO À ESPERA, MANOBRAS, CARGA E DESCARGA E QUANTO À CARREGADEIRA, ESPERA E OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	1,19	1.746,27	2.078,05	1.144,96	1.362,50	(601,31)	(715,55)
64	SC 09.05.1350 (I)	RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	19,83	555,00	11.005,65	555,00	11.005,65	-	-
65	SC 14.05.0050 (I)	ÁGUA COMERCIAL. FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.(DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,00	200,00	2.688,00	-	-



PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA  
MEDIÇÃO 9 - ETAPA 6 INTERMEDIÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT C/ BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
66	BP 09.05.0550 (I)	REFORÇO OU TRATAMENTO PARA TRINCAMENTOS, COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, FEITO COM MANTA DE GEOTEXTELA FLEXÍVEL DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE OU DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM POLÍMERO A ELEVADA TEMPERATURA (MÍNIMO DE 180 °C), COMBINADO COM MANTA NÃO TECIDA ULTRA LEVE, EM FORMA DE GRELHA, COM ABERTURA DE MALHA DE (40X40)MM, MALHA FIXA SEM MOVIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA DE 50KN/M, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, ESPECIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA DER-SP - ET-DE-P00/43, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >=50KN/M PARA DEFORMAÇÃO <=12% CONFORME NBR 12824; RESISTÊNCIA A FADIGA >=90% DE RESISTÊNCIA RETIDA APÓS 100.000 CICLOS CARGA/DESCARGA E PONTO DE AMOLECIMENTO >180 °C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	31,86	3.250,00	103.545,00	3.250,00	103.545,00	-	-
67	EQ 04.05.0615 (B)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	132,05	129,50	17.100,47	129,50	17.100,47	-	-
68	EQ 04.05.0621 (A)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,85	55,50	1.268,17	55,50	1.268,17	-	-
69	EQ 19.05.0400 (B)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTUAR DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	37,68	55,50	2.091,24	55,50	2.091,24	-	-
70	EQ 19.05.0406 (A)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,49	129,50	2.912,45	129,50	2.912,45	-	-
71	AD 19.05.0500 (I)	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLT, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.042,84	2,00	2.085,68	2,00	2.085,68	-	-
72	AD 19.15.0050 (I)	CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLT AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	425,64	1,00	425,64	1,00	425,64	-	-
73	AD 39.05.0068 (I)	APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,83	462,50	10.558,87	185,00	4.223,55	(277,50)	(6.335,32)
74	AD 39.05.0092 (I)	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	20,02	370,00	7.407,40	185,00	3.703,70	(185,00)	(3.703,70)
75	AD 39.05.0212 (I)	TOPÓGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGÍ-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	33,07	185,00	6.117,95	92,50	3.058,97	(92,50)	(3.058,98)
76	TC 09.05.0200 (I)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	15,29	-	-	-	-	-	-
77	TC 04.05.0620 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,99	105.604,63	104.440,53	-	-	(105.604,63)	(104.440,53)
78	AD 19.10.0050 (I)	GALPÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPÓSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO.(DESONERADO)	M2	239,10	-	-	-	-	-	-
79	AD 39.05.0218 (A)	VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,70	462,50	6.797,08	-	-	(462,50)	(6.797,08)
80	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	0,89	5.162,93	4.595,00	-	-	(5.162,93)	(4.595,00)
84	CE 04.10.0188 (I)	LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	9,97	92,50	922,67	-	-	(92,50)	(922,67)
85	CE 04.10.0080 (I)	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	8,89	92,50	822,33	-	-	(92,50)	(822,33)
86	AD 39.05.0128 (I)	ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	129,95	185,00	24.040,64	-	-	(185,00)	(24.040,64)
87	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	185,76	277,50	51.548,40	-	-	(277,50)	(51.548,40)
88	DR 34.10.0100 (I)	GRELHA DE FERRO FUNDIDO COMPLETA, DE (30X90)CM, COM 135KG, PARA CAIXA DE RALO, ARTICULADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, PADRÃO PREFEITURA-RJ. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	UN	469,25	-	-	-	-	-	-
89	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1,0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	4.248,99	3,00	12.746,97	-	-	(3,00)	(12.746,97)
90	AD 39.05.0116 (I)	ENCARRREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	27,49	462,50	12.714,12	-	-	(462,50)	(12.714,12)
91	AD 14.10.0300 (I)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS.(DESONERADO)	T.KM	1,62	-	-	-	-	-	-
92	AD 39.05.0086 (I)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,53	462,50	8.107,62	-	-	(462,50)	(8.107,62)
93	ET 14.20.0050 (A)	FORMAS DE PLACAS DE MADEIRIT OU SIMILAR, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, RESINADAS E TAMBÉM AS DE 20MM DE ESPESURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4 VEZES, E A MADEIRA SERRADA, AUXILIAR 1 VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.(DESONERADO)	M2	71,21	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL PENDENTE DE APROVAÇÃO DA RERRA						396.019,93	155.471,02		(240.548,91)	
TOTAL GERAL						1.985.040,91	1.776.959,37		(208.081,52)	



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# ANEXO 3



**Dimensional - Fernando Santos**

**De:** Dimensional - Fernando Santos  
**Enviado em:** quinta-feira, 22 de outubro de 2020 22:04  
**Para:** 'Joao Adolpho'; GIO2 Maurício Graça; CTPAV Susana Bittencourt  
**Cc:** pavimentariop4@dimensionalengenharia.com  
**Assunto:** Medição 9 - Etapa 6 Intermediária  
**Anexos:** Medição 9 - 6ª Et. Interm.pdf

A Comissão de Fiscalização:

Segue em anexo, a Medição 9 - Etapa 6 (Intermediária).

Em tempo, segue abaixo, quadro resumo com o total acumulado das medições enviadas até o presente momento:

MEDIÇÃO	ETAPA	PERIODO	TOTAL POSSIVEL FATURAR	TOTAL A MEDIR PÓS RERRA	TOTAL EXECUTADO
1ª	1ª - INTERMEDIÁRIA	28/04/2020 ATÉ 13/05/2020	R\$ 1.189.369,53	R\$ 165.196,57	R\$ 1.354.566,10
2ª	1ª - COMPLEMENTAR	14/05/2020 ATÉ 27/05/2020	R\$ 1.487.163,22	R\$ 221.884,15	R\$ 1.709.047,37
3ª	2ª - INTERMEDIÁRIA	28/05/2020 ATÉ 13/06/2020	R\$ 2.521.404,25	R\$ 266.936,33	R\$ 2.788.340,58
4ª	2ª - COMPLEMENTAR	14/06/2020 ATÉ 26/06/2020	R\$ 2.617.401,00	R\$ 208.234,92	R\$ 2.825.635,92
5ª	3ª - INTERMEDIÁRIA	27/06/2020 ATÉ 11/07/2020	R\$ 1.358.911,64	R\$ 226.141,94	R\$ 1.585.053,58
6ª	3ª - COMPLEMENTAR	12/07/2020 ATÉ 26/07/2020	R\$ 643.153,16	R\$ 154.992,24	R\$ 798.145,40
7ª	4ª - INTEGRAL	27/07/2020 ATÉ 25/08/2020	R\$ 281.268,10	R\$ 249.703,96	R\$ 530.972,06
8ª	5ª - INTEGRAL	26/08/2020 ATÉ 24/09/2020	R\$ 1.268.658,59	R\$ 455.782,42	R\$ 1.724.441,01
9ª	6ª - INTERMEDIÁRIA	25/09/2020 ATÉ 09/10/2020	R\$ 1.589.020,95	R\$ 395.988,61	R\$ 1.985.009,56
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 12.956.350,44</b>	<b>R\$ 2.344.861,14</b>	<b>R\$ 15.301.211,58</b>

Atenciosamente,

Fernando J. A. dos Santos  
 GUN - Gestor de Unidade de Negócio  
 (21) 35445800 / (21) 99825-4906



**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



# MEDIÇÃO 9

## 6ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO  
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4  
PROGRAMA PAVIMENTARIO**



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMIHC

**Obra/Serviço:** S SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO

**Código:** 6.150

**Processo:** 0006/300120/2020

**Contrato:** 024/2020

**ID:** Dez./ 2019

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

**Prazo Inicial:** 180 dias corridos

**Prorrogações:** 0 dias corridos

**Total:** 180 dias corridos

**9ª Medição, 6ª Etapa - Intermediária, Serviços Executados de 26/09/2020 à 10/10/2020**


**INDICE**

- DOC. 1 BOLETIM DE MEDIÇÃO
- DOC. 2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- DOC. 3 DIÁRIO DE OBRAS
- DOC. 4 MEMÓRIA DE CÁLCULO
- DOC. 5 PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE TAMPÃO BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# BOLETIM DE MEDIÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMIHC																	
Obra/Serviço:		SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO															
Código:		6.150															
Processo:		0006/300.120/2020							Contrato: 024/2020								
Empresa:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							Prorrogações: 0 dias corridos								
Prazo Inicial:		180 dias corridos							Total: 180 dias corridos								
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																	
Medição: 9ª		Etapa: 6ª - Intermediária				Serviços Executados de				25/09/2020		à		09/10/2020		I0: Dez./ 2019	
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO				SALDO A REALIZAR						
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)			
				QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)			
<b>MT - MOVIMENTO DE TERRA</b>																	
1	MT 04.05.0050 (I)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.(DESONERADO)	M3	231,00	28,77	6.645,87	-	-	-	-	-	-	231,00	6.645,87			
2	MT 14.05.0300 (I)	REATERRO DE VALA, COM PÓ-DE-PEDRA, COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	132,00	106,89	14.109,48	-	-	-	-	-	-	132,00	14.109,48			
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>		<b>20.755,35</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>20.755,35</b>			
<b>TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA</b>																	
3	TC 04.05.0700 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM MÉDIA VELOCIDADE (VM=40KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	2.965.061,25	0,49	1.452.880,01	-	-	-	-	-	-	2.965.061,25	1.452.880,01			
4	TC 09.05.0150 (I)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL À GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	2.033,25	19,28	39.201,06	-	-	0,30	5,88	0,30	5,88	2.032,95	39.195,18			
5	TC 09.05.0700 (I)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	2.033,25	15,96	32.450,67	-	-	2.331,87	37.216,64	2.331,87	37.216,64	-	-			
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>		<b>1.524.531,74</b>	-	-	<b>37.222,52</b>	<b>37.222,52</b>	<b>37.222,52</b>	<b>37.222,52</b>	-	<b>1.492.075,19</b>			
<b>SC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>																	
6	SC 04.05.0850 (I)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DO SERVIÇO.(DESONERADO)	M3	33,00	198,35	6.545,55	-	-	-	-	-	-	33,00	6.545,55			
7	SC 04.10.0050 (I)	ARRANCAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (TAMPA E COLAR).(DESONERADO)	UN	80,00	46,37	3.709,60	-	-	42,00	1.947,54	42,00	1.947,54	38,00	1.762,06			
8	SC 04.10.0300 (I)	DEMOLIÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS.(DESONERADO)	M3	862,50	215,50	185.868,75	-	-	-	-	-	-	862,50	185.868,75			
9	SC 09.05.0900 (I)	MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	19,86	88.178,40	370,00	7.348,20	3.071,00	60.990,06	3.441,00	68.338,26	999,00	19.840,14			
10	SC 09.05.1100 (I)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	22,32	99.100,80	370,00	8.258,40	2.886,00	64.415,52	3.256,00	72.673,92	1.184,00	26.426,88			
11	SC 09.05.1200 (I)	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	8.880,00	21,38	189.854,40	370,00	7.910,60	1.591,00	34.015,58	1.961,00	41.926,18	6.919,00	147.928,22			
12	SC 09.05.1450 (I)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	26.640,00	14,38	383.083,20	3.330,00	47.885,40	21.811,50	313.649,37	25.141,50	361.534,77	1.498,50	21.548,43			
13	SC 09.10.0100 (I)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL JUNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17.760,00	14,69	260.894,40	-	-	1.665,00	24.458,85	1.665,00	24.458,85	16.095,00	236.435,55			
14	SC 09.10.0150 (I)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	2.220,00	17,87	39.671,40	185,00	3.305,95	1.535,50	27.439,38	1.720,50	30.745,33	499,50	8.926,07			
15	SC 14.05.0400 (I)	PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	3.588,75	59,90	214.966,12	-	-	935,89	56.059,66	935,89	56.059,66	2.652,86	158.906,46			
16	SC 14.05.0425 (I)	BRITA Nº 0, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	2.093,85	104,50	218.807,32	-	-	935,89	97.800,25	935,89	97.800,25	1.157,96	121.007,07			
17	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	800,00	755,29	604.232,00	67,50	50.982,07	562,50	424.850,62	630,00	475.832,69	170,00	128.399,31			
18	SC 34.05.0040 (A)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE GRELHA DE CAIXA DE RALO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	1.700,00	160,84	273.428,00	-	-	102,00	16.405,68	102,00	16.405,68	1.598,00	257.022,32			
19	SC 34.05.0050 (B)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	800,00	220,04	176.032,00	-	-	55,00	12.102,20	55,00	12.102,20	745,00	163.929,80			
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>		<b>2.744.371,94</b>	<b>125.690,62</b>	<b>1.134.134,71</b>	<b>1.259.825,33</b>	<b>1.259.825,33</b>	<b>1.259.825,33</b>	<b>1.259.825,33</b>	<b>1.484.546,61</b>				
<b>DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES</b>																	

DS  
EMDS  
XDS  
M

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMIHC  
 Obra/Serviço: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO  
 Código: 6.150  
 Processo: 0006/300.120/2020  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
 Prazo Inicial: 180 dias corridos



Contrato: 024/2020

Prorrogações: 0 dias corridos

Total: 180 dias corridos

BOLETIM DE MEDIÇÃO  
 Medição: 9ª Etapa: 6ª - Intermediária

Serviços Executados de 25/09/2020 à 09/10/2020

10: Dez./ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO				SALDO A REALIZAR			
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
20	DR 34.05.0250 (/)	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO COMPLETO, ARTICULADO, PESADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, TIPO AVENIDA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	UN	340,00	416,22	141.514,80	-	-	42,00	17.481,24	42,00	17.481,24	298,00	124.033,56
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				-		<b>17.481,24</b>		<b>17.481,24</b>		<b>124.033,56</b>
<b>BP - PAVIMENTAÇÃO</b>														
21	BP 09.05.0050 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	25.803,00	279,99	7.224.581,97	2.032,16	568.984,47	6.309,78	1.766.676,21	8.341,94	2.335.660,68	17.461,06	4.888.921,29
22	BP 09.05.0100 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	15.510,00	374,18	5.803.531,80	-	-	7.376,85	2.760.271,57	7.376,85	2.760.271,57	8.133,15	3.043.260,23
23	BP 09.05.0300 (/)	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ, EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)	T	41.313,00	3,46	142.942,98	2.032,16	7.031,27	13.686,65	47.355,80	15.718,81	54.387,07	25.594,19	88.555,91
24	BP 09.05.0400 (B)	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	M2	544.500,00	2,31	1.257.795,00	32.328,01	74.677,70	174.835,22	403.869,35	207.163,23	478.547,05	337.336,77	779.247,95
25	BP 09.05.0600 (A)	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, COM EMPREGO DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMEROS, ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO, ABERTURA AO TRÁFEGO NO MÁXIMO EM 2H, CONSUMO POR M2 ENTRE 10KG A 12KG, EM UMA ÚNICA CAMADA, COM EMPREGO DA FAIXA III OU IV DA ISSA. O PREÇO INCLUI TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, EXECUÇÃO E TRANSPORTE. O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ISSA OU DO DNER.(DESONERADO)	M2	60.000,00	9,65	579.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	579.000,00
26	BP 09.05.0700 (A)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLÍMERO, USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESURA, EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRÔNICO E MESA EXTENSIVA DE NO MÍNIMO 7M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.(DESONERADO)	M2	132.000,00	53,64	7.080.480,00	11.782,93	632.036,35	58.672,25	3.147.179,47	70.455,18	3.779.215,82	61.544,82	3.301.264,18
27	BP 14.05.0060 (A)	CORTE MECÂNICO COM FRESADORA A FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	27.150,00	137,11	3.722.536,50	743,09	101.885,27	5.399,99	740.393,14	6.143,09	842.278,41	21.006,91	2.880.258,09
28	BP 19.30.0050 (/)	LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.(DESONERADO)	M	1.650,00	48,28	79.662,00	-	-	-	-	-	-	1.650,00	79.662,00
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				<b>1.384.615,06</b>		<b>8.865.745,54</b>		<b>10.250.360,60</b>		<b>15.640.169,65</b>
<b>ET - ESTRUTURAS</b>														
29	ET 04.05.0400 (B)	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO (FCK) MÍNIMO DE 20MPa, INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	99,00	239,04	23.664,96	-	-	10,94	2.615,71	10,94	2.615,71	88,06	21.049,25
30	ET 04.20.0050 (A)	PREPARO MANUAL DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO, EXCLUSIVE MATERIAIS.(DESONERADO)	M3	25,00	102,83	2.570,75	-	-	10,81	1.111,58	10,81	1.111,58	14,19	1.459,17
31	ET 04.20.0200 (/)	PREPARO MECÂNICO DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE MATERIAIS, CONSIDERANDO PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	74,00	52,55	3.888,70	-	-	0,13	6,96	0,13	6,96	73,87	3.881,74
32	ET 04.25.0403 (A)	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE A COLOCAÇÃO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	99,00	41,69	4.127,31	-	-	10,94	456,19	10,94	456,19	88,06	3.671,12
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				-		<b>4.190,44</b>		<b>4.190,44</b>		<b>30.061,28</b>
<b>EQ - EQUIPAMENTOS</b>														
33	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 208CV, CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	8.744,69	209.872,56	1,00	8.744,69	12,30	107.559,68	13,30	116.304,37	10,70	93.568,19
34	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV, CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	8.784,89	210.837,36	1,00	8.784,89	12,30	108.054,14	13,30	116.839,03	10,70	93.998,33

DS  
EM

DS  
X

DS  
M

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMIHC  
 Obra/Serviço: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO  
 Código: 6.150  
 Processo: 0006/300.120/2020  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
 Prazo Inicial: 180 dias corridos



Contrato: 024/2020

Prorrogações: 0 dias corridos

Total: 180 dias corridos

BOLETIM DE MEDIÇÃO  
 Medição: 9ª Etapa: 6ª - Intermediária

Serviços Executados de 25/09/2020 à 09/10/2020

I0: Dez./ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO						SALDO A REALIZAR	
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
35	EQ 14.05.0380 (I)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	3.108,00	84,64	263.061,12	259,00	21.921,76	2.020,20	170.989,72	2.279,20	192.911,48	828,80	70.149,64
36	EQ 14.05.0386 (I)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	1.332,00	32,87	43.782,84	111,00	3.648,57	865,80	28.458,84	976,80	32.107,41	355,20	11.675,43
37	EQ 44.05.0059 (I)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO. (DESONERADO)	H.DAM	4.440,00	0,09	399,60	370,00	33,30	2.978,50	268,06	3.348,50	301,36	1.091,50	98,24
38	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCAVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	3.108,00	64,07	199.129,56	259,00	16.594,13	2.084,95	133.582,73	2.343,95	150.176,86	764,05	48.952,70
39	EQ 44.05.0106 (I)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCAVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	1.332,00	5,65	7.525,80	111,00	627,15	893,55	5.048,55	1.004,55	5.675,70	327,45	1.850,10
40	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	3.108,00	1,79	5.563,32	129,50	231,80	1.074,85	1.923,97	1.204,35	2.155,77	1.903,65	3.407,55
41	EQ 44.05.0606 (I)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	1.332,00	1,19	1.585,08	55,50	66,05	460,65	548,17	516,15	614,22	815,85	970,86
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				<b>60.652,34</b>		<b>556.433,86</b>		<b>617.086,20</b>		<b>324.671,04</b>
<b>ST - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO</b>														
42	ST 74.05.0300 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR ASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CET-RIO, EM PROJETOS ACIMA DE 400M2. (DESONERADO)	M2	22.275,00	34,42	766.705,50	-	-	1,30	44,81	1,30	44,81	22.273,70	766.660,69
43	ST 74.05.0450 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR EXTRUSÃO, EM PROJETOS ACIMA DE 150M2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CET-RIO. (DESONERADO)	M2	3.174,31	63,77	202.425,74	-	-	-	-	-	-	3.174,31	202.425,74
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>						<b>44,81</b>		<b>44,81</b>		<b>969.086,43</b>
<b>AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO</b>														
44	AD 14.10.0050 (I)	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO, DURANTE A OPERAÇÃO. (DESONERADO)	T	1.898,40	38,86	73.771,82	-	-	972,85	37.804,78	972,85	37.804,78	925,55	35.967,04
45	AD 14.10.0300 (I)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS. (DESONERADO)	T.KM	21.696,00	1,62	35.147,52	-	-	21.696,00	35.147,51	21.696,00	35.147,51	-	0,01
46	AD 14.15.0401 (B)	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV, AUTONOMIA DE 3000 KM/MÊS. CUSTO MENSAL. (DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	5.396,73	129.521,52	2,00	10.793,43	21,80	117.648,63	23,80	128.442,06	0,20	1.079,46
47	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL. (DESONERADO)	UN.MÊS	12,00	4.248,99	50.987,88	-	-	12,00	50.987,87	12,00	50.987,87	-	0,01
48	AD 19.25.0210 (I)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO. (DESONERADO)	UN	200,00	612,93	122.586,00	-	-	90,00	55.163,70	90,00	55.163,70	110,00	67.422,30
49	AD 19.25.0310 (I)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONFECIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (DESONERADO)	M2	16,80	415,07	6.973,17	-	-	16,80	6.973,17	16,80	6.973,17	-	-

DS

EM

DS

DS



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMIHC  
 Obra/Serviço: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO  
 Código: 6.150  
 Processo: 0006/300.120/2020  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
 Prazo Inicial: 180 dias corridos



Contrato: 024/2020

Prorrogações: 0 dias corridos

Total: 180 dias corridos

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Medição: 9ª Etapa: 6ª - Intermediária

Serviços Executados de 25/09/2020 à 09/10/2020

I0: Dez./ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO				SALDO A REALIZAR			
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
50	AD 24.05.0200 (/)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA. (DESONERADO)	UN.MÊS	600,00	55,33	33.198,00	50,00	2.766,50	367,50	20.333,77	417,50	23.100,27	182,50	10.097,73
51	AD 24.05.0250 (/)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOPDE DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA. (DESONERADO)	UN.MÊS	2.400,00	51,07	122.568,00	50,00	2.553,50	322,50	16.470,07	372,50	19.023,57	2.027,50	103.544,43
52	AD 24.05.0300 (A)	ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTAÇÃO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES. (DESONERADO)	UN.MÊS	1.200,00	38,99	46.788,00	50,00	1.949,50	65,00	2.534,35	115,00	4.483,85	1.085,00	42.304,15
53	AD 24.05.0450 (A)	ROLO DE TELA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES DE (50X1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO. (DESONERADO)	M	2.399,99	0,73	1.751,99	-	-	-	-	-	-	2.399,99	1.751,99
54	AD 39.05.0086 (/)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). (DESONERADO)	H	4.440,00	17,53	77.833,20	-	-	4.440,00	77.833,20	4.440,00	77.833,20	-	-
55	AD 39.05.0116 (/)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). (DESONERADO)	H	4.440,00	27,49	122.055,60	-	-	4.440,00	122.055,60	4.440,00	122.055,60	-	-
56	AD 39.05.0134 (/)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEOLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). (DESONERADO)	H	1.110,00	185,76	206.193,60	-	-	1.110,00	206.193,60	1.110,00	206.193,60	-	-
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				<b>18.062,93</b>		<b>749.146,25</b>		<b>767.209,18</b>		<b>262.167,12</b>
<b>( - ITEM ESPECIAL</b>														
57	IE 00.02.7107( )	MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA. (DESONERADO)	T	6.010,13	59,61	358.263,84	-	-	-	-	-	-	6.010,13	358.263,84
58	IE 00.02.7108( )	MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUÍDO MENOR QUE 97 dB, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA. (DESONERADO)	T	969,38	59,27	57.455,15	-	-	-	-	-	-	969,38	57.455,15
59	IE 00.02.7109( )	MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB, TIPO "OPEN GRADE" OU "GAP GRADED", CONSIDERANDO APENAS USINAGEM. (DESONERADO)	T	6.979,50	72,15	503.570,92	-	-	-	-	-	-	6.979,50	503.570,92
60	IE 00.02.7110( )	PRODUÇÃO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) "IN SITU" TIPO "FIELD BLEND", COM UTILIZAÇÃO DE BORRACHA RECICLADA COM POLÍMERO, NA PROPORÇÃO DE 20%, DE PÓ DE BORRACHA EM PESO, EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114, ASTM D8 E COM A RESOLUÇÃO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP. (DESONERADO)	T	572,90	3.273,93	1.875.634,49	-	-	-	-	-	-	572,90	1.875.634,49
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				<b>2.794.924,40</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>2.794.924,40</b>
				<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.</b>				<b>36.091.144,98</b>		<b>1.589.020,95</b>		<b>11.364.399,37</b>		<b>23.142.490,63</b>



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: 024/2020

PROCESSO: 0006/300.120/2020

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 6ª Etapa - Intermediária MEDIÇÃO: 9

PERÍODO: 25/09/2020 à 09/10/2020

LOGRADOURO: AV. LUCIO COSTA



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: EQUIP DE APOIO (LIMPEZA)



SERVIÇO: EQUIP DE APOIO (LIMPEZA)

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: 024/2020  
 PROCESSO: 0006/300.120/2020  
 EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
 ETAPA: 6ª Etapa - Intermediária MEDIÇÃO: 9  
 LOGRADOURO: AV. LUCIO COSTA

PERÍODO: 25/09/2020 à 09/10/2020



SERVIÇO: EQUIP DE APOIO (LIMPEZA)

SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO



SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO

SERVIÇO: ESPALHAMENTO DE ASFALTO



SERVIÇO: ESPALHAMENTO DE ASFALTO

SERVIÇO: ESPALHAMENTO DE ASFALTO



SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MECÂNICA

SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MECÂNICA

CONTRATO: **024/2020**  
 PROCESSO: **0006/300.120/2020**  
 EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**  
 ETAPA: **6ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **9**  
 LOGRADOURO: **AV. LUCIO COSTA**

PERÍODO: **25/09/2020** à **09/10/2020**



**SERVIÇO:** PINTURA DE LIGAÇÃO (2ª CAMADA)



**SERVIÇO:** PINTURA DE LIGAÇÃO (2ª CAMADA)



**SERVIÇO:** ESPALHAMENTO DE CBUQ (2ª CAMADA)



**SERVIÇO:** ESPALHAMENTO DE CBUQ (2ª CAMADA)



**SERVIÇO:** COMPACTAÇÃO (2ª CAMADA)



**SERVIÇO:** COMPACTAÇÃO (2ª CAMADA)



**SERVIÇO:** COMPACTAÇÃO (2ª CAMADA)



**SERVIÇO:** APLICAÇÃO DE GEOGRELHA



CONTRATO: **024/2020**  
 PROCESSO: **0006/300.120/2020**  
 EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**  
 ETAPA: **6ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **9**  
 LOGRADOURO: **AV. LUCIO COSTA**

PERÍODO: **25/09/2020** à **09/10/2020**



SERVIÇO: APLICAÇÃO DE GEOGRELHA

SERVIÇO: APLICAÇÃO DE GEOGRELHA

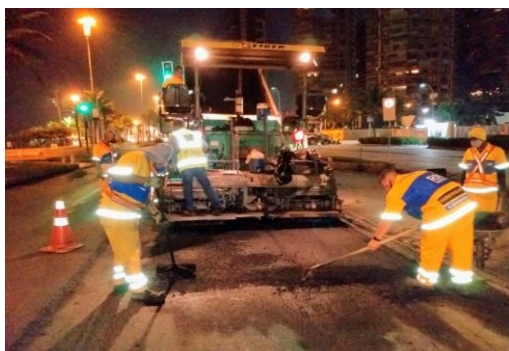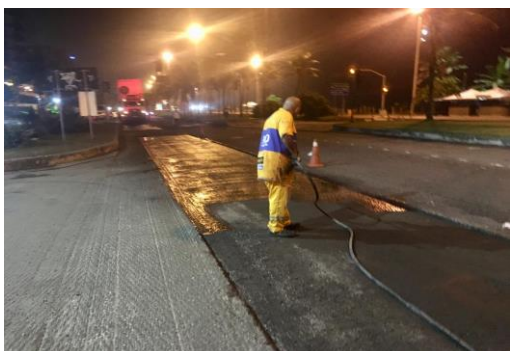

SERVIÇO: REMENDO

SERVIÇO: REMENDO




SERVIÇO: REMENDO

SERVIÇO: REMENDO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# DIÁRIO DE OBRAS







			FORMULÁRIO							Nº do Diário de Obra	
			RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP							151	
										VERSÃO	0
							PÁGINA	1/1			
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.				Hora início: 20:00		Hora término: 05:10		
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2020				Condição do Tempo: Sol		Intensidade:		
EFETIVO / QUANTIDADE											
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1		
APONTADOR	3	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	21	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0		
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2		
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	3	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEnte	32	ENCARREGADO DE OBRA	1		
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2				
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE											
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1						
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1						
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1						
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1						
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4						
CAMINHÃO TOCO	5	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2						
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2						
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA											
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>						
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO											
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO											
APLICAÇÃO DE GEOGRELHA EM TRECHOS COM MAIOR SEVERIDADE DE TRINCAS NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>						
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO											
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO						

DS  
EM





DS  
X

DS  
M



 				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				152	
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio				Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 0		Hora término: 0	
Contrato: 024/2020		Processo: 06/300.120/2020		Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data: sábado, 26 de setembro de 2020		Condição do Tempo: Sol	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	0	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVENTE	1	ENCARREGADO DE OBRA	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	5	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
 DIMENSIONAL ENGENHARIA					 FISCALIZAÇÃO				





				FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						153	
Obra:		Contratada:		Hora início:		Hora término:		VERSÃO			
Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Dimensional Engenharia Ltda.		0		0		0			
Contrato:	024/2020	Processo:	06/300.120/2020	Fiscalização:	João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data:	domingo, 27 de setembro de 2020			
				Condição do Tempo:		Sol		Intensidade:			
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>											
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0		
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0		
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0		
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEENTE	0	ENCARREGADO DE OBRA	0		
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0				
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>											
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1						
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1						
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1						
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1						
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4						
CAMINHÃO TOCO	5	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2						
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2						
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>						
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)											
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>						
											


DS  
EM



DS  
G

DS  
M



				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				154	
								VERSÃO	0
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.		<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 04:35			
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> segunda-feira, 28 de setembro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	3	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	20	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
APLICAÇÃO DE GEORRELHA EM TRECHOS COM MAIOR SEVERIDADE DE TRINCAS NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diária.				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				





				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				155	
								VERSÃO	0
				PÁGINA		1/1			
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.		<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 05:10			
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> terça-feira, 29 de setembro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	3	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	22	OPERADOR DE TRAFEGO	12	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	31	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
APLICAÇÃO DE GEORRELMHA EM TRECHOS COM MAIOR SEVERIDADE DE TRINCAS NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diária.				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				





				<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				156	
								VERSÃO 0	
								PÁGINA 1/1	
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.			<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 04:55	
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> quarta-feira, 30 de setembro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>	
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	21	OPERADOR DE TRAFEGO	15	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	27	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
APLICAÇÃO DE GEOTRELLHA EM TRECHOS COM MAIOR SEVERIDADE DE TRINCAS NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diárias.				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				

DS  
EM



DS  
X

DS  
M

 		FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						157	
								VERSÃO	0
						PÁGINA	1/1		
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.			<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 03:45	
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> quinta-feira, 1 de outubro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Nublado		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	22	OPERADOR DE TRAFEGO	15	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	31	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diária.				
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				








				<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				158	
								VERSÃO 0	
								PÁGINA 1/1	
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.		<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 04:15			
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> sexta-feira, 2 de outubro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>	
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	22	OPERADOR DE TRAFEGO	15	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	31	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diária.				
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				

DS  
EM

DS  
X


DS  
M



				<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				159	
								VERSÃO 0	
								PÁGINA 1/1	
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.			<b>Hora início:</b> 0		<b>Hora término:</b> 00:00	
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> sábado, 3 de outubro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVENTE	0	ENCARREGADO DE OBRA	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	5	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
_____					_____				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				









				FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						160	
						Hora início: 0		Hora término: 00:00		VERSÃO 0	PÁGINA 1/1
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio				Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.							
Contrato: 024/2020		Processo: 06/300.120/2020		Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data: domingo, 4 de outubro de 2020		Condição do Tempo: Sol		Intensidade:	
EFETIVO / QUANTIDADE											
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0		
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0		
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0		
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVENTE	0	ENCARREGADO DE OBRA	0		
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0				
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE											
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1						
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1						
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1						
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4						
CAMINHÃO TOCO	5	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2						
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2						
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>						<b>OCORRENCIAS:</b>					
NÃO HOUE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)											
						<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>					
DIMENSIONAL ENGENHARIA						FISCALIZAÇÃO					






				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				161	
								VERSÃO	0
				PÁGINA		1/1			
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.		<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 05:05			
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> segunda-feira, 5 de outubro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	22	OPERADOR DE TRAFEGO	15	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	32	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
APLICAÇÃO DE GEORRELHA EM TRECHOS COM MAIOR SEVERIDADE DE TRINCAS NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diárias.				
EXECUÇÃO DE REMENDO LOCALIZADO NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO									
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				

				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				162	
								VERSÃO	0
				PÁGINA		1/1			
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.		<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 05:05			
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> terça-feira, 6 de outubro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	22	OPERADOR DE TRAFEGO	16	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	32	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
APLICAÇÃO DE GEOTRELLHA EM TRECHOS COM MAIOR SEVERIDADE DE TRINCAS NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diárias.				
EXECUÇÃO DE REMENDO LOCALIZADO NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO									
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				

				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				163	
								VERSÃO	0
				PÁGINA		1/1			
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.		<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 02:50			
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> quarta-feira, 7 de outubro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Nublado		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	22	OPERADOR DE TRAFEGO	14	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	31	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (2ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diária.				
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				







				<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				164	
								VERSÃO 0	
								PÁGINA 1/1	
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.			<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 00:45	
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> quinta-feira, 8 de outubro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Chuva		<b>Intensidade:</b> Forte	
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	22	OPERADOR DE TRAFEGO	15	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	31	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
NÃO FOI EXECUTADO SERVIÇO (CHUVA FORTE)					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diárias.				
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				

DS  
EM

DS  
X



DS  
M

 		FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						164	
								VERSÃO	0
						PÁGINA	1/1		
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.			<b>Hora início:</b> 20:00		<b>Hora término:</b> 03:25	
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> quinta-feira, 8 de outubro de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Nublado		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	22	OPERADOR DE TRAFEGO	15	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	2	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	7	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	31	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	2				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	6	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b> BOTA-ESPERA DA DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO A USINA DA PREFEITURA EM JACAREPAGUA									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					O local utilizado inicialmente para disposição do material fresado, tal qual a Usina de asfalto de Jacarepagua, encontra-se sobrecarregado, ocasionando				
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CBUQ (1ª CAMADA) NA AV. LUCIO COSTA - PISTA SENTIDO RECREIO					sucessivas paralisações e prejudicando o andamento dos serviços de carga, transporte e descarga. Além do horário disponibilizado para descarga que é de				
					08:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:30, ou seja, apenas 6 horas diária.				
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				

DS  
EM

DS  
X

DS  
M

				<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				166	
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 0		Hora término: 00:00			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: sábado, 10 de outubro de 2020	Condição do Tempo: Sol		Intensidade:			
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	0	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVELENTE	1	ENCARREGADO DE OBRA	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0		
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1	FRESA 2000 OU SIMILAR	1		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	1	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	5	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# MEMÓRIA DE CÁLCULO







**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO  
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -  
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

CONTRATO:

10 - DEZ/2019

**FOLHA RESUMO**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL POSSIVEL MEDIR	%	TOTAL EXECUTADO	%	TOTAL A MEDIR PÓS RERRA
<b>A - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	R\$ 10.793,46	0,68%	R\$ 134.798,96	6,79%	R\$ 124.005,50
<b>B - CANTEIRO DE OBRAS</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 425,36	0,02%	R\$ 425,36
<b>C - CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 17.774,30	0,90%	R\$ 17.774,30
<b>D - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>E - EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL</b>	R\$ 39.201,50	2,47%	R\$ 50.208,65	2,53%	R\$ 11.007,15
<b>F - EQUIPAMENTO DE APOIO OPERACIONAL</b>	R\$ 68.910,73	4,34%	R\$ 97.042,87	4,89%	R\$ 28.132,14
<b>G - SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>	R\$ 85.500,22	5,38%	R\$ 85.500,22	4,31%	R\$ -
<b>H - FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL</b>	R\$ 88.962,65	5,60%	R\$ 127.287,65	6,41%	R\$ 38.325,00
<b>I - BINDER</b>	R\$ 548.834,52	34,54%	R\$ 584.469,79	29,44%	R\$ 35.635,27
<b>J - CBUQ COM CAP CONVENCIONAL</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>K - CBUQ COM ADIÇÃO DE POLIMERO</b>	R\$ 659.254,92	41,49%	R\$ 686.502,53	34,58%	R\$ 27.247,61
<b>L - REMENDO PROFUNDO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>M - GEOGRELHA</b>	R\$ 7.507,49	0,47%	R\$ 111.017,74	5,59%	R\$ 103.510,25
<b>N - CORTE DE SARJETA</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>O - NIVELAMENTO DE TAMPÃO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>P - NIVELAMENTO DE GRELHA</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>Q - LEVAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>R - MICROREVESTIMENTO ASFALTICO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>S - REMENDO</b>	R\$ 80.055,46	5,04%	R\$ 89.981,49	4,53%	R\$ 9.926,03
<b>- TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.589.020,95</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 1.985.009,56</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 395.988,61</b>



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS  
PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA  
ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						134.798,96		10.793,46
		VISITA DO PREFEITO A USINA: 28/02/2020						
		DATA DE MOBILIZAÇÃO: 09/03/2020						
		PRAZO DE EXECUÇÃO 25/09/2020 À 09/10/2020 = 15,00 DIAS CORRIDOS			0,50	MÊSES		
		2 EQUIPES 25/09/2020 À 09/10/2020 = 15,00 DIAS CORRIDOS			0,50	MÊSES		
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO			185	HORAS		
01	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	185,76	277,50	51.548,40	-	-
		Osvaldo Peçanha - Engenheiro Civil - Gestor de Unidade de Negócio José Renato Maia - Engenheiro Civil - Engenheiro de Produção da Obra Fernando Santos - Arquiteto e Urbanista - Planejamento e Controle 3,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			277,50 277,50			
02	AD 39.05.0128 (I)	ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	129,95	185,00	24.040,64	-	-
		Vinicius Benevides - Engenheiro Civil - Diretor Operacional e Supervisor da Obra Gilberto Assumpção - Engenheiro de Segurança do Trabalho (Conforme NR 4) 2,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			185,00 185,00			
03	AD 39.05.0116 (I)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	27,49	462,50	12.714,12	-	-
		Ailton Gonçalves dos Santos - Encarregado Administrativo Marcelo Barbosa Ribeiro - Encarregado Geral Roberto Cordeiro - Encarregado de Obras Francisco Joaquim - Encarregado de Obras Samuel José Acioli - Encarregado de Obras 5,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			462,50 462,50			
04	AD 39.05.0086 (I)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	17,53	462,50	8.107,62	-	-
		Marcos Vinicius Singello - Técnico de Medição e Controle Wander Diego Pereira - Técnico de Segurança do Trabalho Pedro Ivo B. Alves - Técnico de Segurança do Trabalho (Conforme NR 4) Everton Ferraz - Técnico de Medição e Controle Rafael da Anunciação Barros - Técnico de Medição e Controle 5,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			462,50 462,50			
05	AD 39.05.0068 (I)	APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	22,82	462,50	10.554,66	-	-
		Juarez Almeida Gonçalves - Auxiliar Administrativo Denis Bezerra da Silva - Apontador Givanildo Santos Andrade - Apontador Cleivildo Santos Freitas - Apontador Philip de Oliveira Pinheiro - Apontador 5,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			462,50 462,50			
06	CE 04.10.0188 (I)	LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	9,97	92,50	922,67	-	-
		Renato Oliveira de Azevedo Silva - Laboratorista de Solos 1,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			92,50 92,50			
07	CE 04.10.0080 (I)	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	8,89	92,50	822,33	-	-
		Thiago Lucindo Ferreira - Auxiliar de Laboratório 1,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			92,50 92,50			
08	AD 39.05.0218 (A)	VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	14,70	462,50	6.797,08	-	-
		Alexsandre Silva Barreto De Freitas - Vigia Reinaldo Rangel Soares - Vigia Ademir Da Silva - Vigia Crelio De Oliveira Gomes - Vigia Edmilso Gevezier - Vigia 5,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			462,50 462,50			
09	AD 14.15.0401 (B)	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV, AUTONOMIA DE 3000 KM/MÊS. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	5.396,73	2,00	10.793,46	2,00	10.793,46
		1,00 und x 1,00 frentes x - mês			-			
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês			1,00			
		2,00 und x 0,50 mês			1,00 2,00			
10	AD 14.15.0750 (B)	VEICULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTIVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	4.248,99	2,00	8.497,98	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x - mês			-			
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês			1,00			
		2,00 und x 0,50 mês			1,00 2,00			

RIO		PROGRAMA PAVIMENTA RIO		# ASFALTO LEGAL		Processo: 0006/300120/2020				Código da Obra: 6.150		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR	
CANTEIRO DE OBRAS								425,36	0,00			
PRAZO DE EXECUÇÃO		25/09/2020	À	09/10/2020	=	15 DIAS CORRIDOS	=	0,50	MÊSES			
HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO								185	HORAS			
01	AD 19.15.0050 (f)	CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL (DESONERADO)				UN.MÊS	425,37	1,00	425,36	-	-	
ADMINISTRAÇÃO		2,00	und	x	0,50	mês	=	1,00	1,00			

DS  
EMDS  
XDS  
M



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR	
<b>CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO</b>						<b>17.774,30</b>		<b>0,00</b>	
		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	25/09/2020	À	09/10/2020	=	15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES
		<b>2 EQUIPES</b>	25/09/2020	À	09/10/2020	=	15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES
		<b>HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO</b>							185 HORAS
01	AD 39.05.0212 (I)	<b>TOPÓGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGÍ-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)</b>	H	33,06	185,00	6.116,39	-	-	
		1,00 und x 1,00 frentes x - mês x 185,00 h/mês		=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	185,00				
					185,00				
02	AD 39.05.0092 (I)	<b>AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)</b>	H	20,02	370,00	7.408,92	-	-	
		2,00 und x 1,00 frentes x - mês x 185,00 h/mês		=	-				
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	370,00				
					370,00				
03	AD 14.15.0750 (B)	<b>VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)</b>	UN.MÊS	4.248,99	1,00	4.248,99	-	-	
		1,00 und x 1,00 frentes x - mês		=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês		=	1,00				
					1,00				

DS  
EM

DS  
X

DS  
M





**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**


Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL						50.208,65		39.201,50
	PRAZO DE EXECUÇÃO	25/09/2020 À 09/10/2020 = 15 DIAS CORRIDOS		=	0,50	MÊSES		
	2 EQUIPES	25/09/2020 À 09/10/2020 = 15 DIAS CORRIDOS		=	0,50	MÊSES		
	HORAS NORMAIS / MÉS TRABALHO				185	HORAS		
<b>01</b>	<b>SC 09.05.1450 (I)</b>	<b>SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)</b>	H	14,38	1.665,00	23.942,70	1.665,00	23.942,70
		9,00 und x 1,00 frentes x - mês x 185,00 h/mês		=	-			
		9,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	1.665,00			
<b>02</b>	<b>SC 09.05.1350 (I)</b>	<b>RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)</b>	H	19,83	555,00	11.007,15	-	-
		3,00 und x 1,00 frentes x - mês x 185,00 h/mês		=	-			
		3,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	555,00			
<b>03</b>	<b>SC 09.05.1200 (I)</b>	<b>PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)</b>	H	21,38	370,00	7.910,60	370,00	7.910,60
		2,00 und x 1,00 frentes x - mês x 185,00 h/mês		=	-			
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	370,00			
<b>04</b>	<b>SC 09.05.0900 (I)</b>	<b>MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)</b>	H	19,86	370,00	7.348,20	370,00	7.348,20
		2,00 und x 1,00 frentes x - mês x 185,00 h/mês		=	-			
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	370,00			
					<b>370,00</b>			

DS  
EM

DS  
X

DS  
M

 <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO</b>		Processo: 0006/300120/2020							
		Código da Obra: 6.150							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR	
EQUIPAMENTO DE APOIO OPERACIONAL						97.042,87		68.910,73	
		PRAZO DE EXECUÇÃO	25/09/2020	À	09/10/2020	=	15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES
		2 EQUIPES	25/09/2020	À	09/10/2020	=	15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO							185 HORAS
01	EQ 14.05.0380 (I)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	84,64	259,00	21.921,76	259,00	21.921,76	
		2,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 129,50 h/mês	=	-				
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 129,50 h/mês	=	259,00	259,00			
02	EQ 14.05.0386 (I)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	32,87	111,00	3.648,57	111,00	3.648,57	
		2,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 55,50 h/mês	=	-				
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 55,50 h/mês	=	111,00	111,00			
03	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	64,07	259,00	16.594,13	259,00	16.594,13	
		2,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 129,50 h/mês	=	-				
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 129,50 h/mês	=	259,00	259,00			
04	EQ 44.05.0106 (I)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	5,65	111,00	627,15	111,00	627,15	
		2,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 55,50 h/mês	=	-				
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 55,50 h/mês	=	111,00	111,00			
05	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	1,79	129,50	231,80	129,50	231,80	
		1,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 129,50 h/mês	=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 129,50 h/mês	=	129,50	129,50			
06	EQ 44.05.0606 (I)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1,19	55,50	66,04	55,50	66,04	
		1,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 55,50 h/mês	=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 55,50 h/mês	=	55,50	55,50			
07	EQ 44.05.0059 (I)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO.(DESONERADO)	H.DAM	0,09	370,00	33,30	370,00	33,30	
		2,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 185,00 h/mês	=	-				
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 185,00 h/mês	=	370,00	370,00			
08	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 208CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.744,69	1,00	8.744,69	1,00	8.744,69	
		1,00 und x 1,00 frentes x -	mês	=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês	=	1,00	1,00			
09	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.784,89	1,00	8.784,89	1,00	8.784,89	
		1,00 und x 1,00 frentes x -	mês	=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês	=	1,00	1,00			
10	EQ 04.05.0615 (B)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	131,97	129,50	17.090,10	-	-	
		1,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 129,50 h/mês	=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 129,50 h/mês	=	129,50	129,50			
11	EQ 04.05.0621 (A)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,84	55,50	1.267,74	-	-	
		1,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 55,50 h/mês	=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 55,50 h/mês	=	55,50	55,50			
12	SC 14.05.0050 (I)	ÁGUA COMERCIAL. FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.(DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,31	-	-	
		1,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 200,00 m3/mês	=	-				
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 200,00 m3/mês	=	200,00	200,00			
13	SC 09.05.1100 (I)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,32	370,00	8.258,40	370,00	8.258,40	
		2,00 und x 1,00 frentes x -	mês x 185,00 h/mês	=	-				
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50	mês x 185,00 h/mês	=	370,00	370,00			

		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO</b>			Processo: 0006/300120/2020 Código da Obra: 6.150			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
14	AD 19.05.0500 (I)	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.042,15	2,00	2.084,29	-	-
		2,00 und x 1,00 frentes x - mês		=	-			
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês		=	2,00			
					<u>2,00</u>			
15	EQ 19.05.0400 (B)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTUAR DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	37,67	55,50	2.090,47	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x 55,50 h/ mês x - mês		=	-			
		1,00 und x 2,00 frentes x 55,50 h/ mês x 0,50 mês		=	55,50			
					<u>55,50</u>			
16	EQ 19.05.0406 (A)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,48	129,50	2.911,23	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x 129,50 h/ mês x - mês		=	-			
		1,00 und x 2,00 frentes x 129,50 h/ mês x 0,50 mês		=	129,50			
					<u>129,50</u>			

DS  
EM

DS  
X

DS  
M



RIO PROGRAMA PAVIMENTA RIO # ASFALTO LEGAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO					Processo: 0006/300120/2020 Código da Obra: 6.150		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR	
SINALIZAÇÃO DE OBRAS							85.500,22	85.500,22	
		PRAZO DE EXECUÇÃO	25/09/2020	À	09/10/2020	= 15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES	
		2 EQUIPES	25/09/2020	À	09/10/2020	= 15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES	
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO						185 HORAS	
01	SC 09.10.0150 (I)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SÊNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,87	185,00	3.305,95	185,00	3.305,95	
		1,00 und x	1,00 frentes x	-	mês x	185,00 h/mês	=	-	
		1,00 und x	2,00 frentes x	0,50	mês x	185,00 h/mês	=	185,00	
								185,00	
02	SC 09.05.1450 (I)	SERVEANTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,38	1.665,00	23.942,70	1.665,00	23.942,70	
		9,00 und x	1,00 frentes x	-	mês x	185,00 h/mês	=	-	
		9,00 und x	2,00 frentes x	0,50	mês x	185,00 h/mês	=	1.665,00	
								1.665,00	
03	AD 24.05.0200 (I)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.(DESONERADO)	UN.MÊS	55,33	50,00	2.766,50	50,00	2.766,50	
		50,00 und x	1,00 frentes x	-	mês		=	-	
		50,00 und x	2,00 frentes x	0,50	mês		=	50,00	
								50,00	
04	AD 24.05.0250 (I)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOP DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA.(DESONERADO)	UN.MÊS	51,07	50,00	2.553,50	50,00	2.553,50	
		50,00 und x	1,00 frentes x	-	mês		=	-	
		50,00 und x	2,00 frentes x	0,50	mês		=	50,00	
								50,00	
05	AD 24.05.0300 (A)	ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTAÇÃO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES.(DESONERADO)	UN.MÊS	38,99	50,00	1.949,50	50,00	1.949,50	
		50,00 und x	1,00 frentes x	-	mês		=	-	
		50,00 und x	2,00 frentes x	0,50	mês		=	50,00	
								50,00	
06	AD 19.25.0210 (I)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECCIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	612,93	-	-	-	-	
		- und x	1,00 frentes				=	-	
								-	
07	AD 24.05.0450 (A)	ROLO DE TELA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES DE (50X1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	0,73	-	-	-	-	
		- m					=	-	
								-	
08	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	755,29	67,50	50.982,07	67,50	50.982,07	
		3,00 chapas x	1,50 m2 x	15,00	aplicações		=	67,50	
								67,50	

DS  
EMDS  
XDS  
M

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR																																		
<b>FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL</b>																																														
PRAZO DE EXECUÇÃO		25/09/2020	À	09/10/2020	=	15	DIAS CORRIDOS	=	0,50	MÊSES																																				
2 EQUIPES		25/09/2020	À	09/10/2020	=	15	DIAS CORRIDOS	=	0,50	MÊSES																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>LOGRADOURO</th> <th>EXTENSÃO (M)</th> <th>ÁREA (m²)</th> <th>TOTAL (m³)</th> <th>DMT (Km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Av. Lucio Costa</td> <td>1.983,00</td> <td>11.415,83</td> <td>570,79</td> <td>20,20</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>1.983,00</b></td> <td><b>11.415,83</b></td> <td><b>570,79</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												LOGRADOURO	EXTENSÃO (M)	ÁREA (m²)	TOTAL (m³)	DMT (Km)	Av. Lucio Costa	1.983,00	11.415,83	570,79	20,20																					<b>TOTAL</b>	<b>1.983,00</b>	<b>11.415,83</b>	<b>570,79</b>	
LOGRADOURO	EXTENSÃO (M)	ÁREA (m²)	TOTAL (m³)	DMT (Km)																																										
Av. Lucio Costa	1.983,00	11.415,83	570,79	20,20																																										
<b>TOTAL</b>	<b>1.983,00</b>	<b>11.415,83</b>	<b>570,79</b>																																											
PESO ESPECIFICO		2,35		T/M3																																										
01	BP 14.05.0060 (A)	CORTE MECÂNICO COM FRESADORA À FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)				M3	137,11	648,84	88.962,65	648,84	88.962,65																																			
<b>FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL</b> Volume 570,79 m3 = 570,79 <b>FRESAGEM JUNTO AO TETO PARA ENCAIXE DA MASSA ASFALTICA</b> Extensão 1.561,00 m x Larg. 1,00 m x Esp. 0,05 m = 78,05 <b>TOTAL 648,84</b>																																														
02	TC 09.05.0350 (I)	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHÃO A ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E QUANTO À CARREGADEIRA, ESPERA E OPERAÇÃO.(DESONERADO)				T	1,20	1.524,78	1.832,26	-	-																																			
<b>BOTA-ESPERA -&gt; USINA DA PREFEITURA</b> Volume 648,84 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 = 1.524,78 <b>TOTAL 1.524,78</b>																																														
03	TC 04.05.0620 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T.(DESONERADO)				T.KM	0,99	35.527,32	35.135,69	-	-																																			
<b>FRENTE DE SERVIÇO -&gt; USINA DA PREFEITURA</b> Volume - m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 x D.M.T. 20,20 KM = - <b>FRENTE DE SERVIÇO -&gt; BOTA-ESPERA</b> Volume 648,84 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 x D.M.T. 19,00 KM = 28.970,77 <b>BOTA-ESPERA -&gt; USINA DA PREFEITURA</b> Volume 648,84 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 x D.M.T. 4,30 KM = 6.556,54 <b>TOTAL 35.527,32</b>																																														
04	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T				T	0,89	1.524,78	1.357,05	-	-																																			
Volume 648,84 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 = 1.524,78 <b>TOTAL 1.524,78</b>																																														

DS  
EMDS  
XDS  
M



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS  
PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA  
ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR	
<b>BINDER</b>					584.469,79		548.834,52		
PRAZO DE EXECUÇÃO		25/09/2020	À	09/10/2020	=	15	DIAS CORRIDOS		
					=	0,50	MÊSES		
		<b>BINDER</b>			<b>PINT. LIGAÇÃO</b>	<b>DMT</b>			
	<b>LOGRADOURO</b>	<b>EXTENSÃO (M)</b>	<b>ÁREA (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TOTAL (T)</b>	<b>VOL. (m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁREA (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Km</b>		
	Av. Lucio Costa		15.410,08	1.810,68	770,50	15.410,08	19,00		
	<b>TOTAL</b>	-	15.410,08	1.810,68	770,50	15.410,08			
<b>PESO ESPECIFICO</b>				2,35	T/M3				
				17,75					
01	BP 09.05.0400 (B)	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)		M2	2,31	15.410,08	35.597,28	15.410,08	35.597,28
		Área	15.410,08	m2	=	15.410,08	<u>15.410,08</u>	<b>TOTAL</b>	
02	BP 09.05.0050 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)		T	279,99	1.810,68	506.972,29	1.810,68	506.972,29
		Volume	770,50	m3 x	P. Esp.	2,35	t/m³	=	1.810,68
								<u>1.810,68</u>	<b>TOTAL</b>
03	BP 09.05.0300 (I)	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ. EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)		T	3,46	1.810,68	6.264,95	1.810,68	6.264,95
		Volume	770,50	m3 x	P. Esp.	2,35	t/m³	=	1.810,68
								<u>1.810,68</u>	<b>TOTAL</b>
04	TC 04.05.0620 (J)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T.(DESONERADO)		T.KM	0,99	34.403,00	34.023,77	-	-
	Av. Lucio Costa	Peso Total	1.810,68	t x	D.M.T.	19,00	km	=	34.403,00
								<u>34.403,00</u>	<b>TOTAL</b>
05	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T		T	0,89	1.810,68	1.611,50	-	-
		Peso Total	1.810,68	T	=	1.810,68	<u>1.810,68</u>	<b>TOTAL</b>	

DS  
EM

DS  
EM

DS  
EM



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR																
<b>GEOGRELHA</b>						111.017,74		7.507,49																
PRAZO DE EXECUÇÃO		25/09/2020 À 09/10/2020 = 15 DIAS CORRIDOS			= 0,50	MÊSES																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TRECHOS EXECUTADOS</th> </tr> <tr> <th>TRECHO</th> <th>ÁREA (M2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Av. Lucio Costa</td> </tr> <tr> <td>R. DEP JOSÉ DA ROCHA RIBAS -&gt; R. CARLOS LEITE COSTA</td> <td style="text-align: right;">1.450,00</td> </tr> <tr> <td>R. CARLOS LEITE COSTA -&gt; R. GASTÃO FORMENTI</td> <td style="text-align: right;">750,00</td> </tr> <tr> <td>R. GASTÃO FORMENTI -&gt; AV. PEREGRINO JUNIOR</td> <td style="text-align: right;">1.050,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>SUBTOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.250,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL GERAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.250,00</b></td> </tr> </tbody> </table>									TRECHOS EXECUTADOS		TRECHO	ÁREA (M2)	Av. Lucio Costa		R. DEP JOSÉ DA ROCHA RIBAS -> R. CARLOS LEITE COSTA	1.450,00	R. CARLOS LEITE COSTA -> R. GASTÃO FORMENTI	750,00	R. GASTÃO FORMENTI -> AV. PEREGRINO JUNIOR	1.050,00	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.250,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.250,00</b>
TRECHOS EXECUTADOS																								
TRECHO	ÁREA (M2)																							
Av. Lucio Costa																								
R. DEP JOSÉ DA ROCHA RIBAS -> R. CARLOS LEITE COSTA	1.450,00																							
R. CARLOS LEITE COSTA -> R. GASTÃO FORMENTI	750,00																							
R. GASTÃO FORMENTI -> AV. PEREGRINO JUNIOR	1.050,00																							
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.250,00</b>																							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.250,00</b>																							
01	BP 09.05.0400 (B) CAPA REGULARIZAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	M2	2,31	3.250,00	7.507,49	3.250,00	7.507,49																
		<p style="text-align: center;">Área</p> <p>Av. Lucio Costa 3.250,00 m2</p>			=	3.250,00		<b>TOTAL 3.250,00</b>																
02	BP 09.05.0550 (I)	REFORÇO OU TRATAMENTO PARA TRINCAMENTOS, COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, FEITO COM MANTA DE GEOGRELHA FLEXÍVEL DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE OU DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM POLÍMERO A ELEVADA TEMPERATURA (MÍNIMO DE 180 °C), COMBINADO COM MANTA NÃO TECIDA ULTRA LEVE, EM FORMA DE GRELHA, COM ABERTURA DE MALHA DE (40X40)MM, MALHA FIXA SEM MOVIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA DE 50KN/M, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, ESPECIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA DER-SP - ET-DE-P00043, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA A TRACÇÃO >>50KN/M PARA DEFORMAÇÃO <=12% CONFORME NBR 12824; RESISTÊNCIA A FADIGA >>90% DE RESISTÊNCIA RETIDA APÓS 100.000 CICLOS CARGA/DESCARGA E PONTO DE AMOLECIMENTO >180 °C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	31,85	3.250,00	103.510,25	-	-																
		<p style="text-align: center;">Área</p> <p>Av. Lucio Costa 3.250,00 m2</p>			=	3.250,00		<b>TOTAL 3.250,00</b>																



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS  
PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA  
ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR																													
<b>REMEMENDO</b>						89.981,49		80.055,46																													
		PRAZO DE EXECUÇÃO 25/09/2020 À 09/10/2020 = 15 DIAS CORRIDOS = 0,50 MÊSES																																			
<b>TRECHOS EXECUTADOS</b>																																					
AV. LUCIO COSTA																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRECHO DE EXECUÇÃO</th> <th>COMPRIMENTO (m)</th> <th>LARGURA MÉDIA (m)</th> <th>ESPESSURA (M)</th> <th>EXECUTADO (m³)</th> <th>D.M.T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R. DEP JOSE DA ROCHA RIBAS -&gt; R. CARLOS LEITE COSTA</td> <td align="center">290,00</td> <td align="center">2,90</td> <td align="center">0,05</td> <td align="right">42,05</td> <td align="right">19,00</td> </tr> <tr> <td>R. CARLOS LEITE COSTA -&gt; R. GASTÃO FORMENTI</td> <td align="center">150,00</td> <td align="center">2,90</td> <td align="center">0,05</td> <td align="right">21,75</td> <td align="right">19,00</td> </tr> <tr> <td>R. GASTÃO FORMENTI -&gt; AV. PEREGRINO JUNIOR</td> <td align="center">210,00</td> <td align="center">2,90</td> <td align="center">0,05</td> <td align="right">30,45</td> <td align="right">19,00</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL</b></td> <td align="center"><b>650,00</b></td> <td align="center"><b>2,90</b></td> <td align="center"><b>0,05</b></td> <td align="right"><b>94,25</b></td> <td align="right"><b>19,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	TRECHO DE EXECUÇÃO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ESPESSURA (M)	EXECUTADO (m³)	D.M.T	R. DEP JOSE DA ROCHA RIBAS -> R. CARLOS LEITE COSTA	290,00	2,90	0,05	42,05	19,00	R. CARLOS LEITE COSTA -> R. GASTÃO FORMENTI	150,00	2,90	0,05	21,75	19,00	R. GASTÃO FORMENTI -> AV. PEREGRINO JUNIOR	210,00	2,90	0,05	30,45	19,00	<b>SUBTOTAL</b>	<b>650,00</b>	<b>2,90</b>	<b>0,05</b>	<b>94,25</b>	<b>19,00</b>					
TRECHO DE EXECUÇÃO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ESPESSURA (M)	EXECUTADO (m³)	D.M.T																																
R. DEP JOSE DA ROCHA RIBAS -> R. CARLOS LEITE COSTA	290,00	2,90	0,05	42,05	19,00																																
R. CARLOS LEITE COSTA -> R. GASTÃO FORMENTI	150,00	2,90	0,05	21,75	19,00																																
R. GASTÃO FORMENTI -> AV. PEREGRINO JUNIOR	210,00	2,90	0,05	30,45	19,00																																
<b>SUBTOTAL</b>	<b>650,00</b>	<b>2,90</b>	<b>0,05</b>	<b>94,25</b>	<b>19,00</b>																																
		PESO ESPECIFICO 2,35 T/M3																																			
01	BP 14.05.0060 (A)	<b>CORTE MECÂNICO COM FRESADORA À FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)</b>	M3	137,11	94,25	12.922,61	94,25	12.922,61																													
		<b>FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL</b> Volume 94,25 m3 = 94,25 <b>TOTAL 94,25</b>																																			
02	TC 09.05.0350 (J)	<b>CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHÃO A ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E QUANTO À CARREGADEIRA, ESPERA E OPERAÇÃO.(DESONERADO)</b>	T	1,20	221,49	266,15	-	-																													
		<b>BOTA-ESPERA -&gt; USINA DA PREFEITURA</b> Av. Lucio Costa Volume 94,25 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 = 221,49 <b>TOTAL 221,49</b>																																			
03	BP 09.05.0400 (B)	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)</b>	M2	2,31	1.885,00	4.354,35	1.885,00	4.354,35																													
		Área 1.885,00 m2 = 1.885,00 <b>TOTAL 1.885,00</b>																																			
04	BP 09.05.0050 (A)	<b>CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)</b>	T	279,99	221,48	62.012,18	221,48	62.012,18																													
		Volume 94,25 m3 x P. Esp. 2,35 t/m³ = 221,48 <b>TOTAL 221,48</b>																																			
05	BP 09.05.0300 (J)	<b>ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ, EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)</b>	T	3,46	221,48	766,32	221,48	766,32																													
		Volume 94,25 m3 x P. Esp. 2,35 t/m³ = 221,48 <b>TOTAL 221,48</b>																																			
06	TC 04.05.0620 (J)	<b>TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T.(DESONERADO)</b>	T.KM	0,99	9.368,92	9.265,64	-	-																													
		<b>FRENTE DE SERVIÇO -&gt; USINA DA PREFEITURA</b> Volume 0 homens m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 x D.M.T. 20,20 KM = - <b>FRENTE DE SERVIÇO -&gt; BOTA-ESPERA</b> Av. Lucio Costa Volume 94,25 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 x D.M.T. 19,00 KM = 4.208,26 <b>BOTA-ESPERA -&gt; USINA DA PREFEITURA</b> Av. Lucio Costa Volume 94,25 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 x D.M.T. 4,30 KM = 952,40 <b>CBUQ</b> Av. Lucio Costa Volume 94,25 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 x D.M.T. 19,00 KM = 4.208,26 <b>TOTAL 9.368,92</b>																																			
07	04.018.0015-A	<b>RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T</b>	T	0,89	442,98	394,24	-	-																													
		<b>FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL</b> Volume 94,25 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 = 221,49 <b>CBUQ</b> Volume 94,25 m3 x Peso Espec. 2,3500 t/m3 = 221,49 <b>TOTAL 442,98</b>																																			

DS  
EM

DS  
X

DS  
M

ITEM		CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	REALIZADO A MEDIR PÓS RERRA					
						NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO	
						QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
<b>MT - MOVIMENTO DE TERRA</b>											
61	MT 09.05.0050 (I)		ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRÁ), UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA (DESONERADO)	M3	6,55	-	-	1.559,82	10.217,80	1.559,82	10.217,80
62	MT 14.05.0100 (I)		COMPACTAÇÃO DE ATERRIO EM CAMADAS DE 15CM, COM MACO (DESONERADO)	M3	40,26	-	-	3.859,96	155.405,61	3.859,96	155.405,61
									<b>165.623,41</b>		<b>165.623,41</b>
<b>TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA</b>											
63	TC 09.05.0350 (I)		CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHÃO A ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E QUANTO À CARREGADEIRA, ESPERA E OPERAÇÃO (DESONERADO)	T	1,20	1.746,27	2.098,41	8.665,28	10.412,69	10.411,54	12.511,10
76	TC 09.05.0200 (I)		CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANUL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA (DESONERADO)	T	15,29	-	-	523,47	8.004,84	523,47	8.004,84
77	TC 04.05.0620 (I)		TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T (DESONERADO)	T.KM	0,99	105.604,63	104.440,53	405.581,47	401.110,66	511.186,10	505.551,19
83	TC 09.05.0700 (I)		DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	15,96	-	-	497,01	7.932,24	497,01	7.932,24
							<b>106.538,94</b>		<b>427.460,43</b>		<b>533.999,37</b>
<b>SC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
64	SC 09.05.1350 (I)		RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	19,83	555,00	11.007,15	4.329,00	85.855,76	4.884,00	96.862,91
65	SC 14.05.0050 (I)		ÁGUA COMERCIAL FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,31	1.560,00	20.968,82	1.760,00	23.657,13
							<b>13.695,46</b>		<b>106.824,58</b>		<b>120.520,04</b>
<b>BP - PAVIMENTAÇÃO</b>											
66	BP 09.05.0550 (I)		REFORÇO OU TRATAMENTO PARA TRINCAMENTOS, COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, FEITO COM MANTA DE GEOTEXTELA FLEXÍVEL DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE OU DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM POLÍMERO A ELEVADA TEMPERATURA (MÍNIMO DE 180 °C), COMBINADO COM MANTA NÃO TECIDA ULTRA LEVE, EM FORMA DE GRELHA, COM ABERTURA DE MALHA DE (40X40)MM, MALHA FIXA SEM MOVIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA DE 50KN/M, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, ESPECIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA DER-SP - ET-DE-P00/43, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >=50KN/M PARA DEFORMAÇÃO <=12% CONFORME NBR 12824; RESISTÊNCIA A FADIGA >=90% DE RESISTÊNCIA RETIDA APÓS 100.000 CICLOS CARGA/DESCARGA E PONTO DE AMOLECIMENTO >180 °C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (DESONERADO)	M2	31,85	3.250,00	103.510,25	3.199,02	101.886,55	6.448,02	205.396,80
							<b>103.510,25</b>		<b>101.886,55</b>		<b>205.396,80</b>
<b>CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA</b>											
84	CE 04.10.0188 (I)		LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (DESONERADO)	H	9,97	92,50	922,67	647,50	6.458,69	740,00	7.381,36
85	CE 04.10.0090 (I)		AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (DESONERADO)	H	8,89	92,50	822,33	647,50	5.756,33	740,00	6.578,66
							<b>1.745,00</b>		<b>12.215,02</b>		<b>13.960,02</b>
<b>EQ - EQUIPAMENTOS</b>											
67	EQ 04.05.0615 (B)		CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	131,97	129,50	17.090,10	1.010,10	133.302,78	1.139,60	150.392,88
68	EQ 04.05.0621 (A)		CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	22,84	55,50	1.267,74	432,90	9.888,37	488,40	11.156,11
69	EQ 19.05.0400 (B)		MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	37,67	55,50	2.090,47	571,65	21.531,84	627,15	23.622,31
70	EQ 19.05.0406 (A)		MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	22,48	129,50	2.911,23	1.333,85	29.985,71	1.463,35	32.896,94
81	EQ 14.05.0461 (A)		PÁ-CARREGADEIRA (CARREGADOR FRONTAL) SOBRE RODAS, CAPACIDADE RASA DE 2,66M3, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 183,7CV. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	278,75	-	-	129,50	36.098,54	129,50	36.098,54
82	EQ 14.05.0467 (I)		PÁ-CARREGADEIRA (CARREGADOR FRONTAL) SOBRE RODAS, CAPACIDADE RASA DE 2,66M3, COM OPERADOR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 183,7CV. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	87,66	-	-	55,50	4.864,98	55,50	4.864,98
							<b>23.359,54</b>		<b>235.672,22</b>		<b>259.031,76</b>
<b>AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO</b>											
71	AD 19.05.0500 (I)		ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA, MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M (DESONERADO)	UN.MÊS	1.042,15	2,00	2.084,29	16,10	16.778,54	18,10	18.862,83
72	AD 19.15.0050 (I)		CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL (DESONERADO)	UN.MÊS	425,37	1,00	425,36	10,00	4.253,62	11,00	4.678,98
73	AD 39.05.0068 (I)		APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	22,82	462,50	10.554,66	4.625,00	105.546,62	5.087,50	116.101,28
74	AD 39.05.0092 (I)		AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	20,02	370,00	7.408,92	2.886,00	57.789,58	3.256,00	65.198,50



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO  
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -  
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITENS A MEDIR PÓS RERRA

Medição: 9ª Etapa: 6ª - Intermediária

Serviços Executados de 25/09/2020 à 09/10/2020

10: Dez./ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	REALIZADO A MEDIR PÓS RERRA					
					NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
75	AD 39.05.0212 (I)	TOPÓGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	33,06	185,00	6.116,39	1.443,00	47.707,84	1.628,00	53.824,23
78	AD 19.10.0050 (I)	GALPAO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPOSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESSURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO (DESONERADO)	M2	239,10	-	-	142,89	34.164,06	142,89	34.164,06
79	AD 39.05.0218 (A)	VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	14,70	462,50	6.797,08	5.077,50	74.620,95	5.540,00	81.418,03
86	AD 39.05.0128 (I)	ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	129,95	185,00	24.040,61	1.295,00	168.284,44	1.480,00	192.325,05
87	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	185,76	277,50	51.548,40	1.665,00	309.290,40	1.942,50	360.838,80
89	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTIVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL (DESONERADO)	UN.MÊS	4.248,99	3,00	12.746,97	5,10	21.669,84	8,10	34.416,81
90	AD 39.05.0116 (I)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	27,49	462,50	12.714,12	185,00	5.085,65	647,50	17.799,77
91	AD 14.10.0300 (I)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS (DESONERADO)	T.KM	1,62	-	-	1.576,64	2.554,15	1.576,64	2.554,15
92	AD 39.05.0086 (I)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	17,53	462,50	8.107,62	185,00	3.243,05	647,50	11.350,67
						<b>142.544,42</b>		<b>850.988,74</b>		<b>993.533,16</b>
<b>( - ITEM ESPECIAL</b>										
80	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	0,89	5.162,93	4.595,00	32.659,66	29.067,07	37.822,59	33.662,07
						<b>4.595,00</b>		<b>29.067,07</b>		<b>33.662,07</b>
<b>DR - GALERIA, DRENOS E CONEXÕES</b>										
88	DR 34.10.0100 (I)	GRELHA DE FERRO FUNDIDO COMPLETA, DE (30X90)CM, COM 135KG, PARA CAIXA DE RALO, ARTICULADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, PADRÃO PREFEITURA-RJ. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (DESONERADO)	UN	469,25	-	-	25,00	11.731,33	25,00	11.731,33
						-		<b>11.731,33</b>		<b>11.731,33</b>
<b>ET - ESTRUTURAS</b>										
93	ET 14.20.0050 (A)	FORMAS DE PLACAS DE MADEIRIT OU SIMILAR, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, RESINADAS E TAMBÉM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4 VEZES, E A MADEIRA SERRADA, AUXILIAR 1 VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (DESONERADO)	M2	71,21	-	-	2,65	188,83	2,65	188,83
						-		<b>188,83</b>		<b>188,83</b>
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.</b>						<b>395.988,61</b>		<b>1.941.658,18</b>		<b>2.337.646,79</b>

DS  
EM

DS  
X

DS  
M





PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO


# PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO

AV. LUCIO COSTA – FRESAGEM



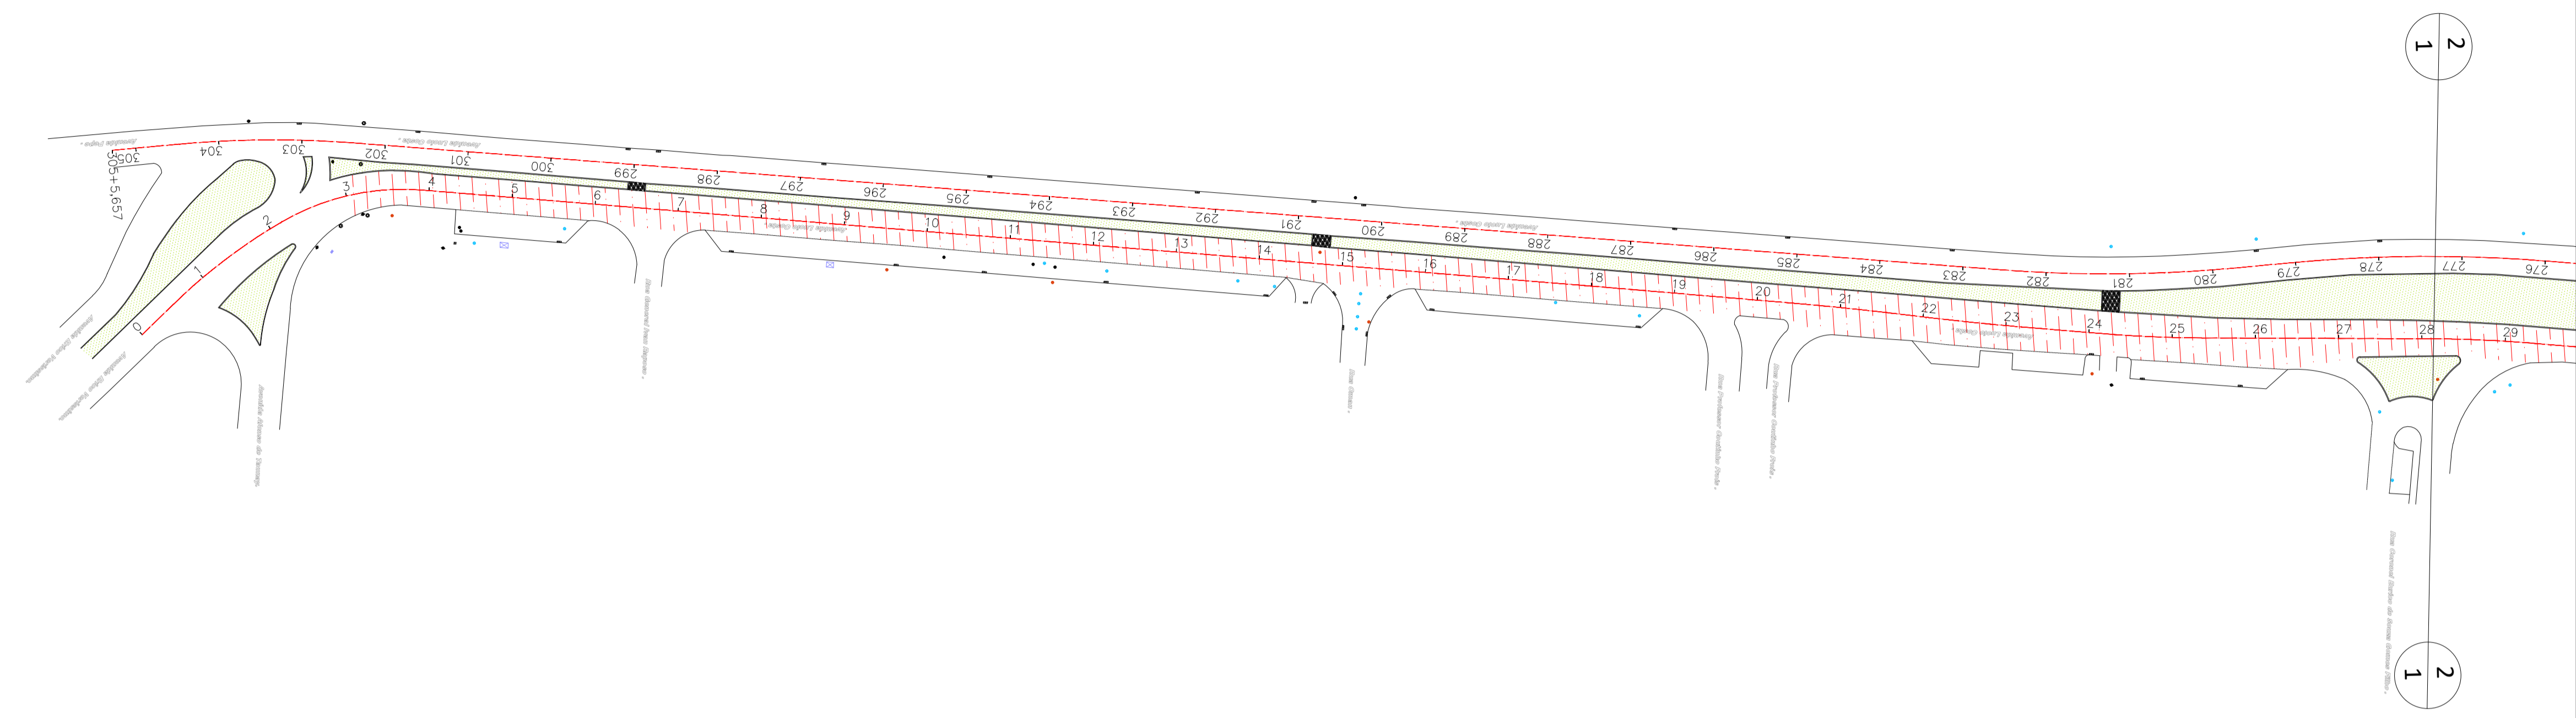

LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
<b>FRESAGEM</b>				
<b>LEGENDA</b>	<b>MEDIÇÃO</b>	<b>INICIO (KM)</b>	<b>FINAL (KM)</b>	<b>ÁREA (M2)</b>
	8ª MEDIÇÃO	-	2,13	18.687,77
	9ª MEDIÇÃO	2,13	3,47	11.415,83
<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b>				<b>30.103,60</b>

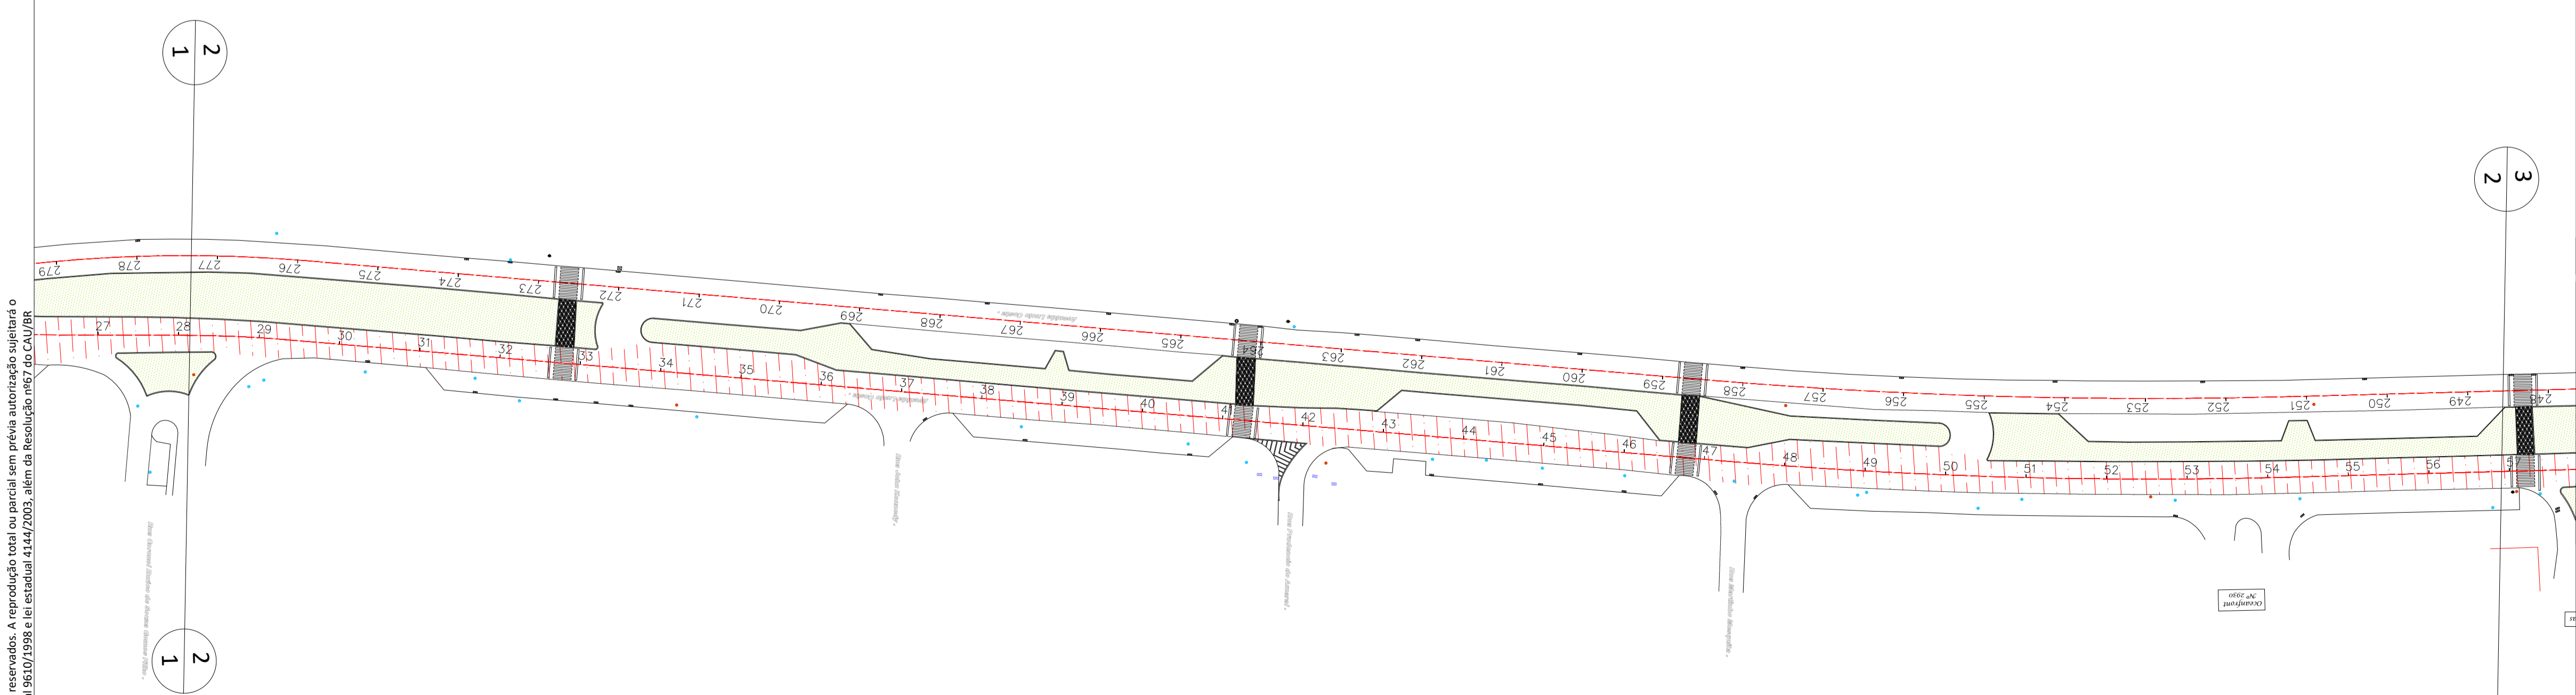

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	10/10/2020	DPA	Emissão inicial

**Empresa:** **DIMENSIONAL ENGENHARIA**  
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

<b>Identificação:</b>	<b>Contratante:</b>
00.211	SMIHC

**Empreendimento:**  
 PAVIMENTA RIO AP - 4

**Endereço:**  
 ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ



<b>Setor:</b>	<b>Profissionais responsáveis:</b>
	Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos



<b>Etapa:</b>	<b>Disciplina:</b>	<b>Escala:</b>
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/1000

<b>Conteúdo da prancha:</b>	<b>Nº da Prancha:</b>
APROPRIAÇÃO DE FRESAGEM - AVENIDA LUCIO COSTA	01/06

Nome da prancha: MED-00211-FR-PE-09-F01-R00

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e lei estadual 4144/2009, além da Resolução nº67 do CAU/BR





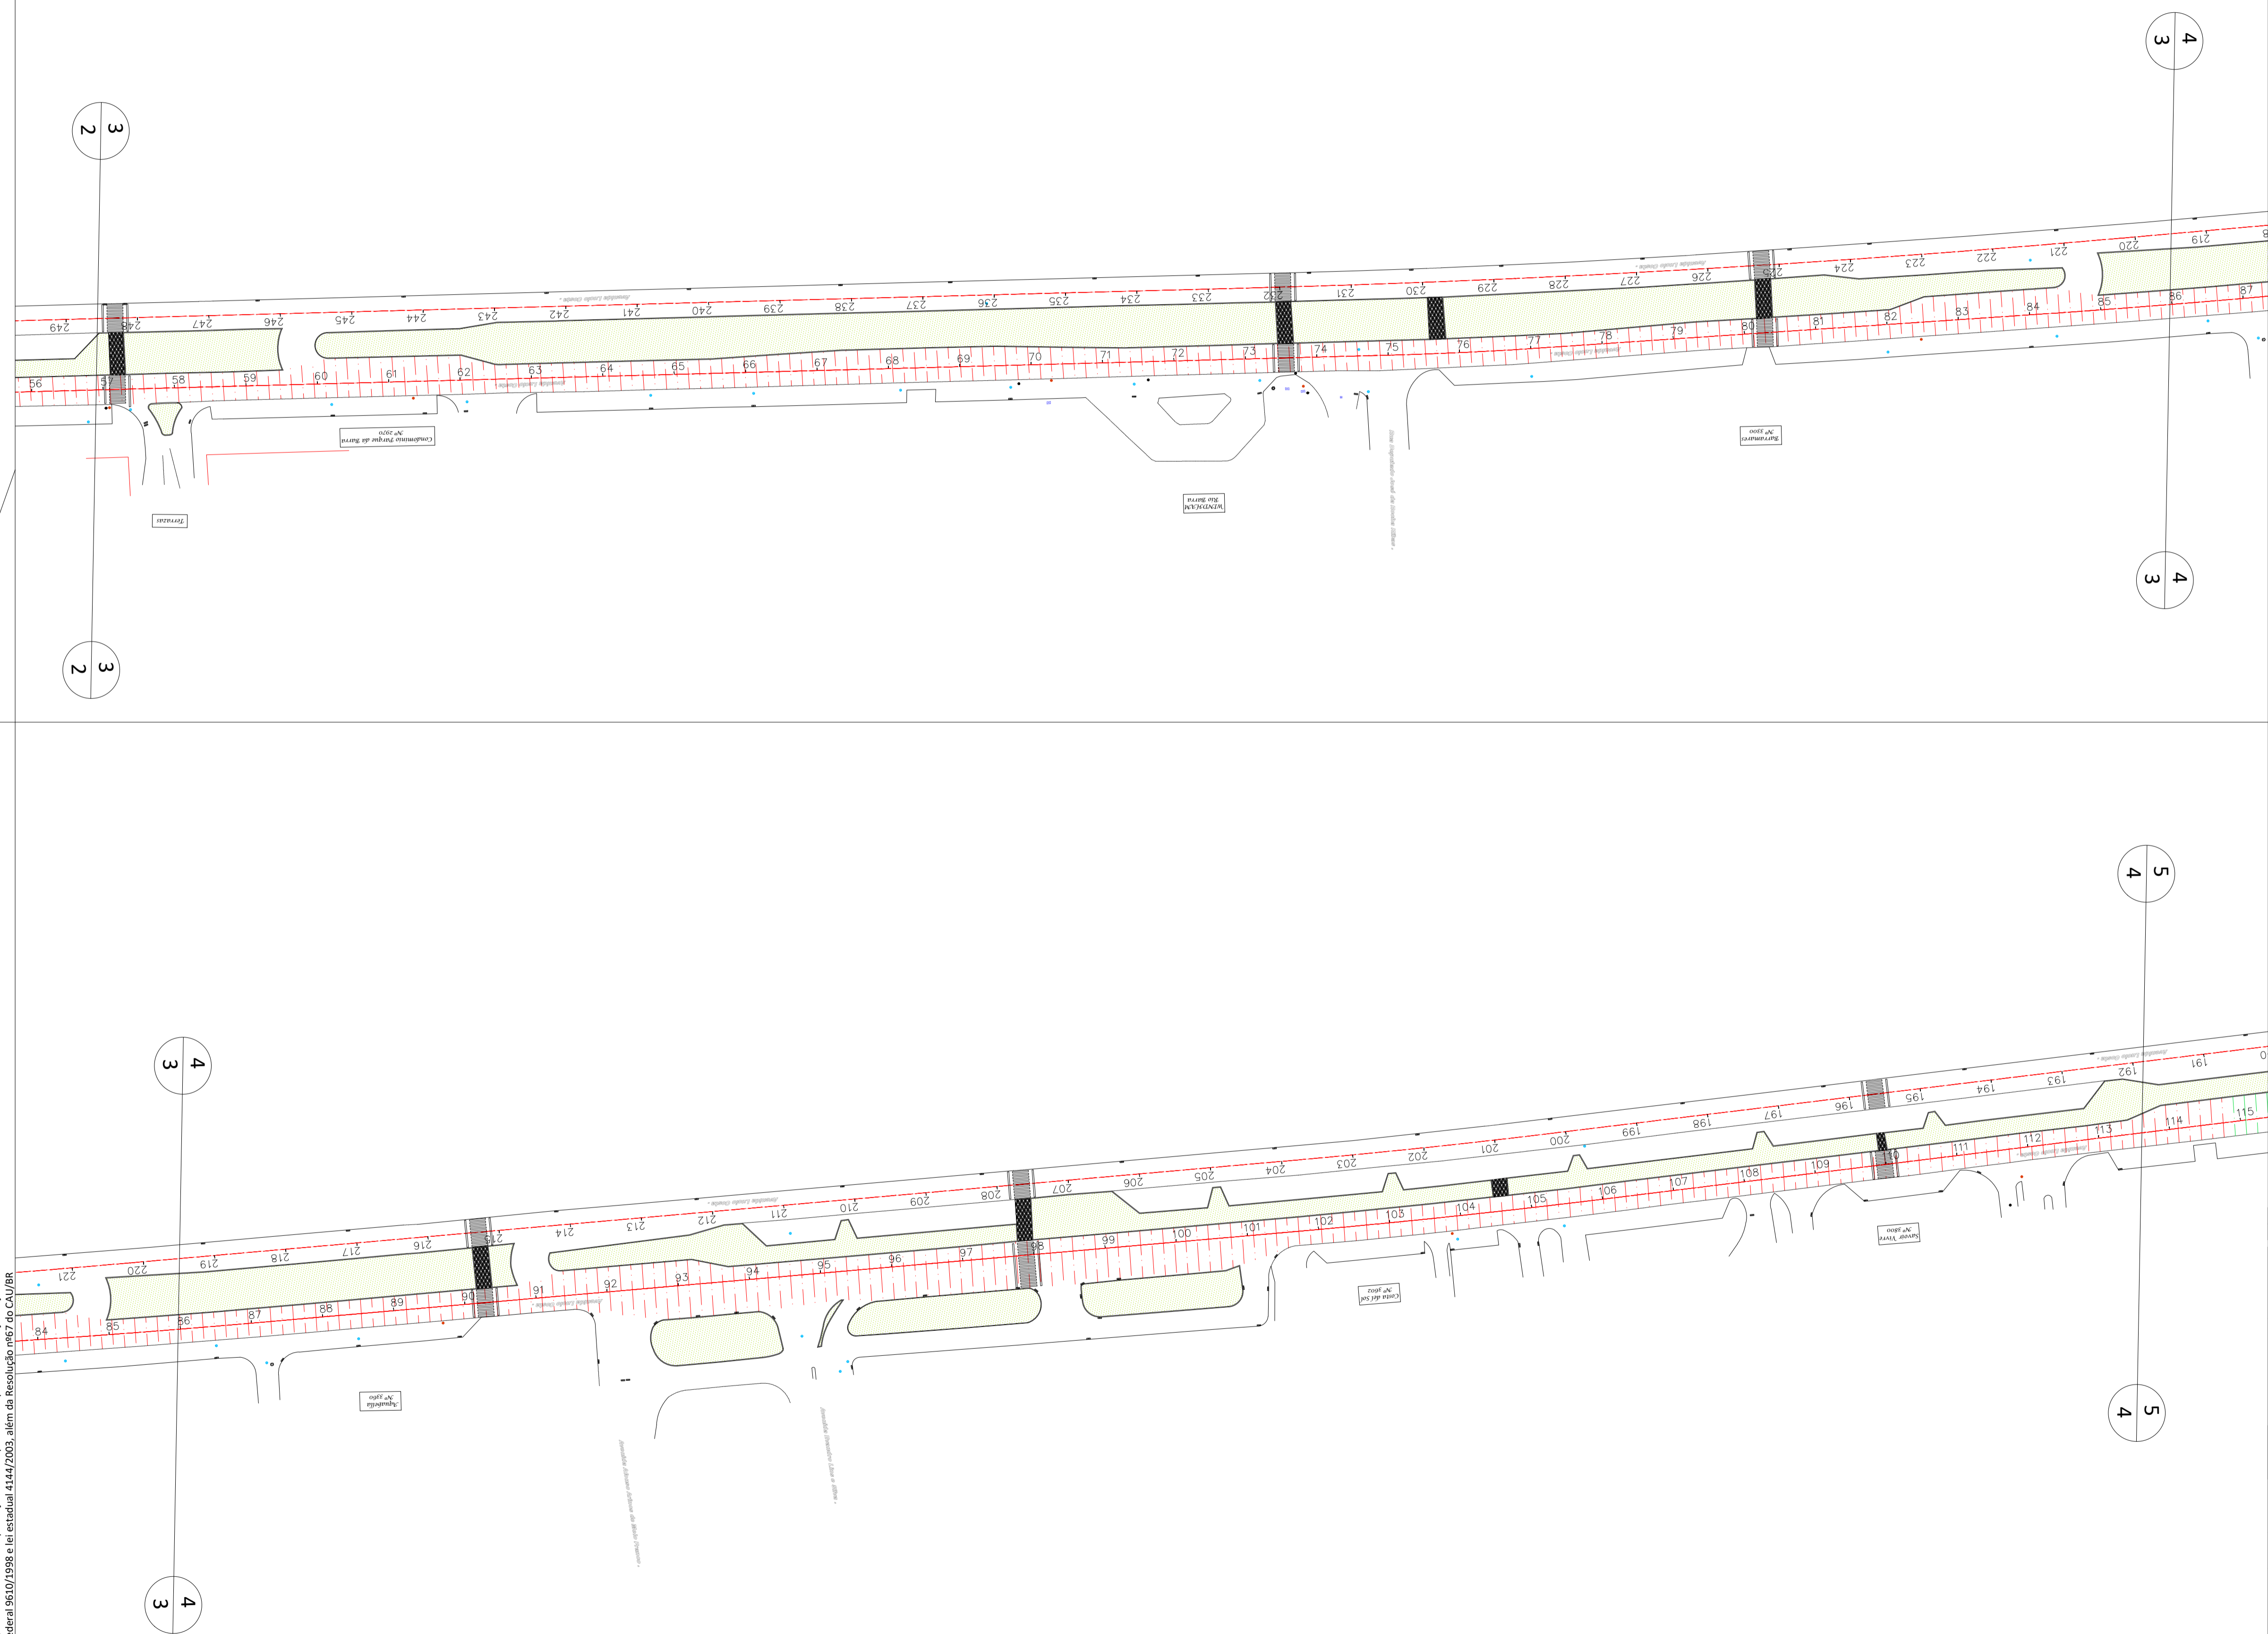


LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
<b>FRESAGEM</b>				
<b>LEGENDA</b>	<b>MEDIÇÃO</b>	<b>INICIO (KM)</b>	<b>FINAL (KM)</b>	<b>ÁREA (M2)</b>
	8ª MEDIÇÃO	-	2,13	18.687,77
	9ª MEDIÇÃO	2,13	3,47	11.415,83
		<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b> 30.103,60		

00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA</b> NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA				
Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com				
Certificações:  Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção				
Identificação:		Contratante:		
00.211		SMIHC		
Empreendimento:				
<b>PAVIMENTA RIO AP - 4</b>				
Endereço:				
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis:		
		Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Etapa:		Disciplina:		Escala:
PROJETO EXECUTIVO		PAVIMENTAÇÃO URBANA		1/1000
Conteúdo da prancha:				Nº da Prancha:
APROPRIAÇÃO DE FRESAGEM - AVENIDA LUCIO COSTA				02/06
Nome da prancha:				
MED-00211-FR-PE-09-F02-R00				

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.







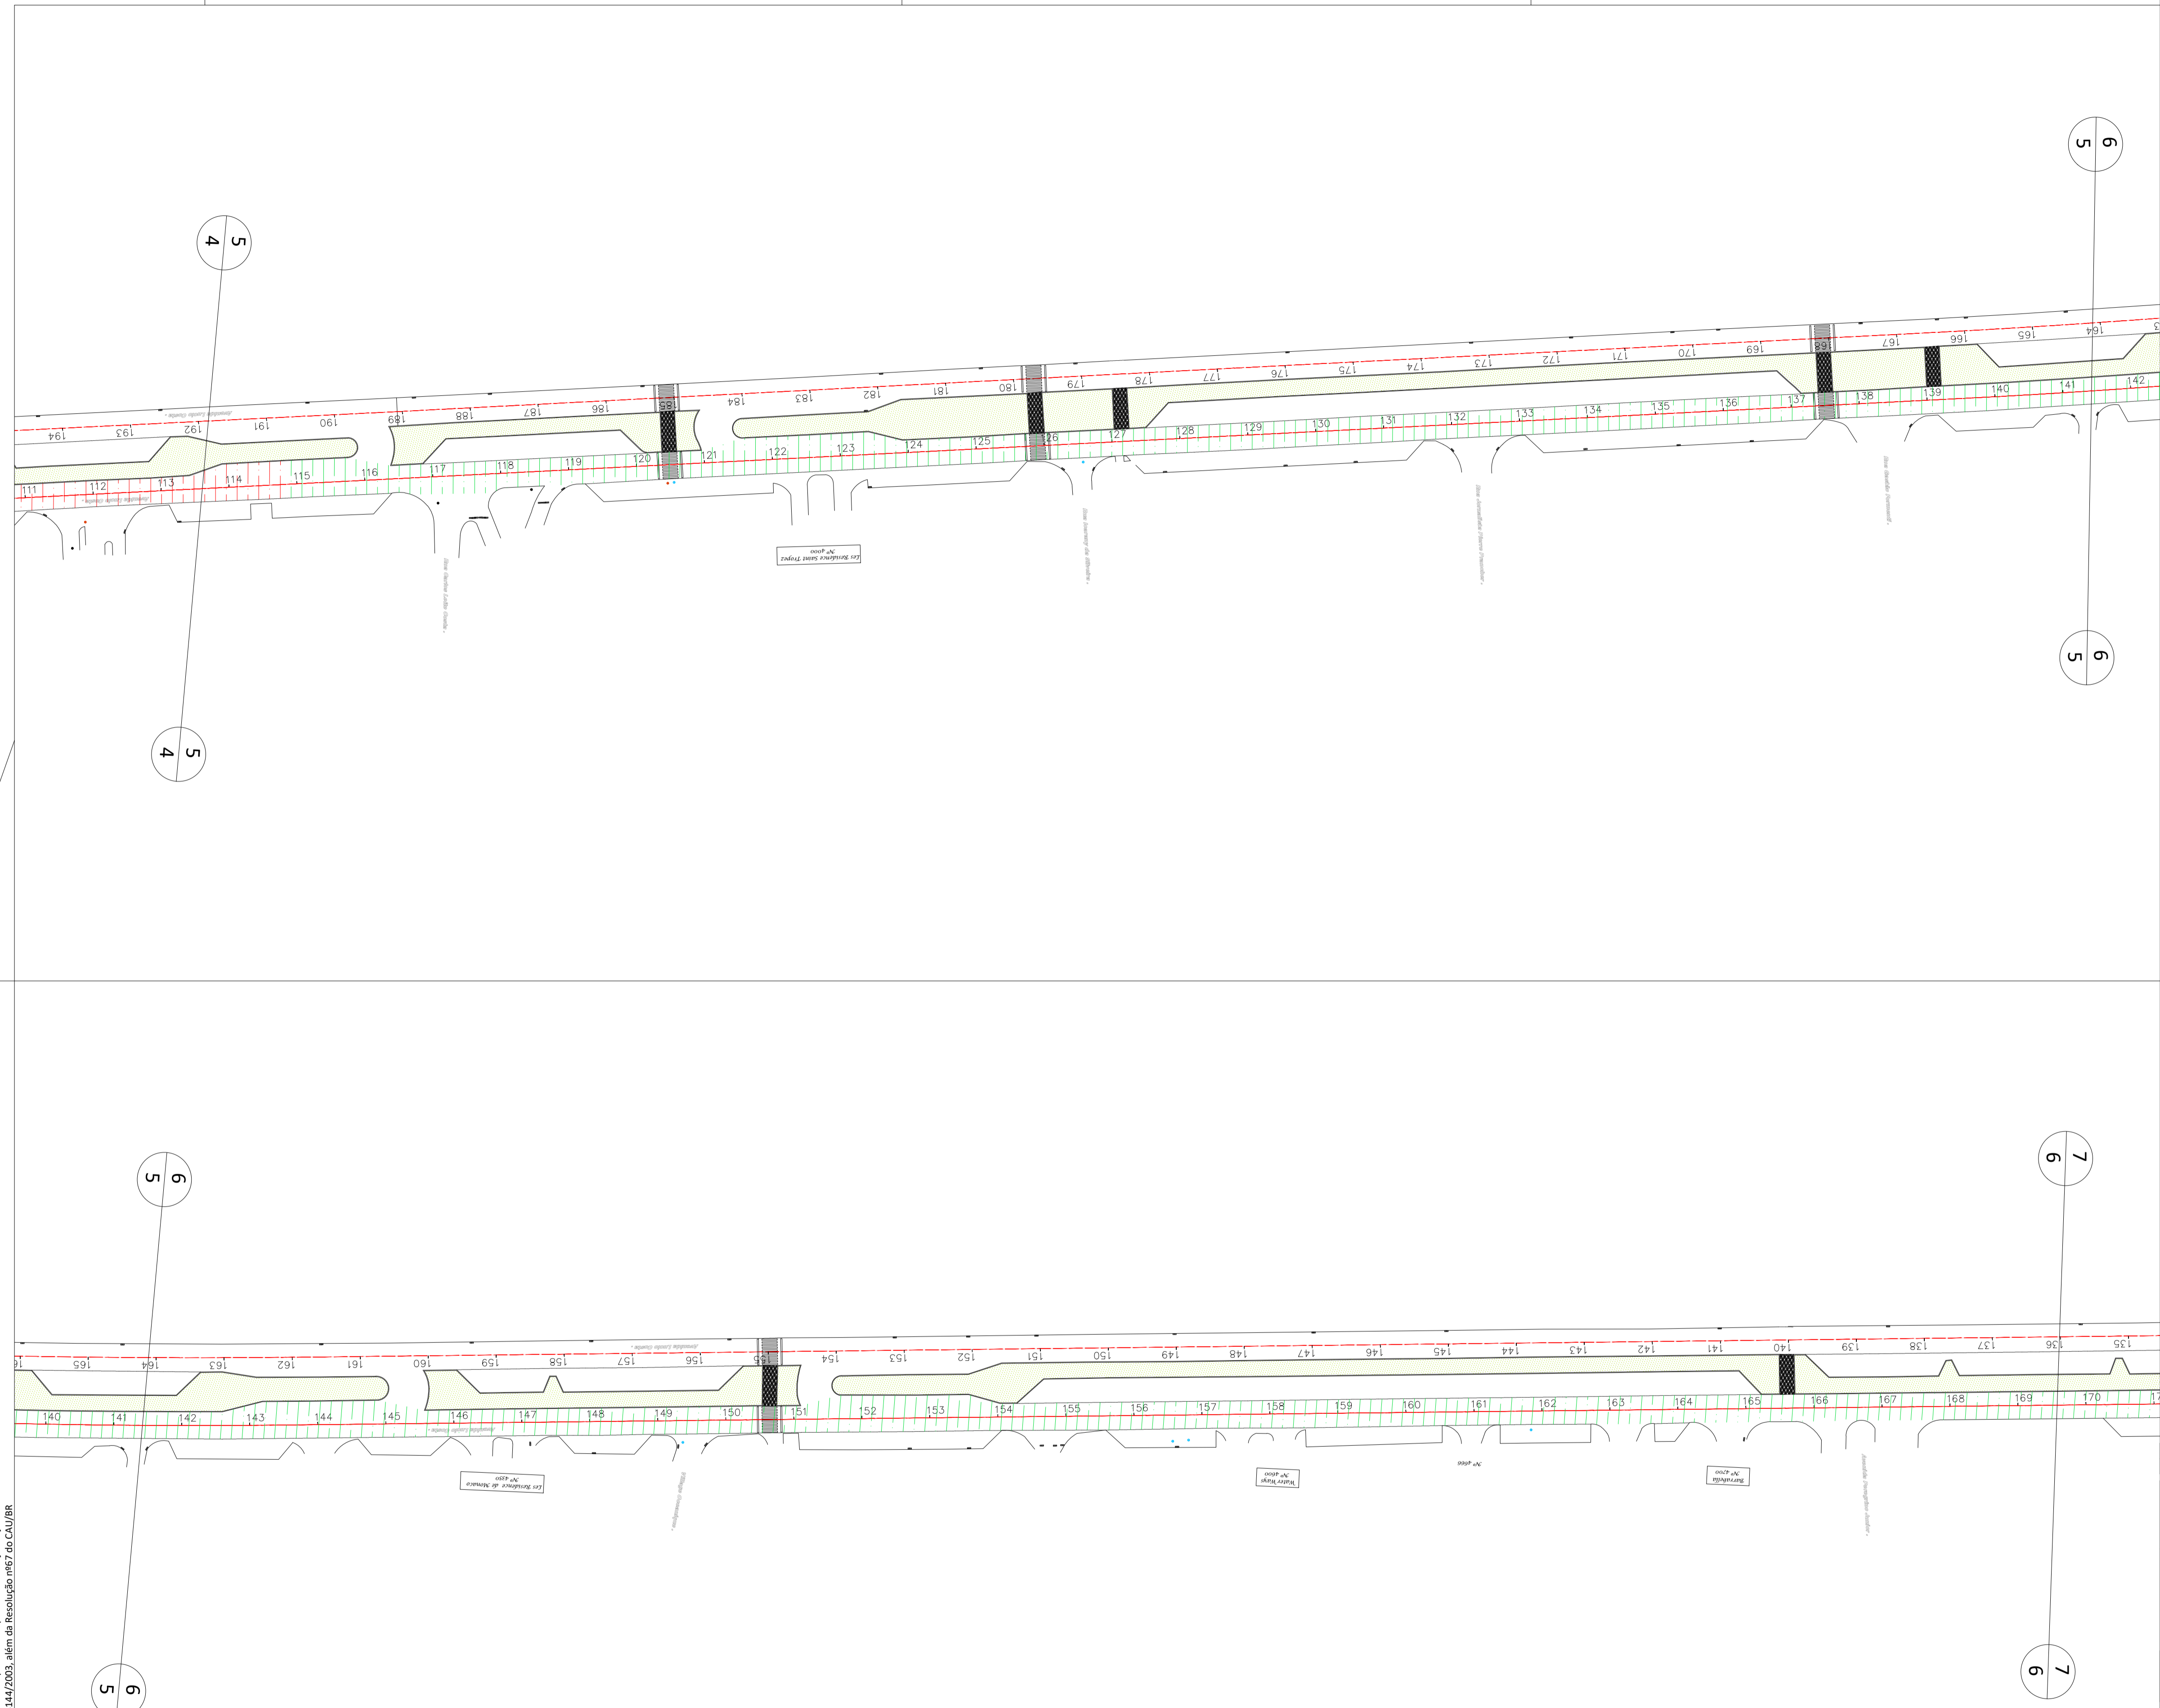


LOCAL:		AV. LUCIO COSTA		
FRESAGEM				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	2,13	18.687,77
	9ª MEDIÇÃO	2,13	3,47	11.415,83
TOTAL ACUMULADO (M2)				30.103,60

00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
<b>Empresa:</b> 		Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com		
<b>Certificações:</b> 				
<b>Identificação:</b> 00.211		<b>Contratante:</b> SMIHC		
<b>Empreendimento:</b> PAVIMENTA RIO AP - 4				
<b>Endereço:</b> ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
<b>Setor:</b>		<b>Profissionais responsáveis:</b> Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
<b>Etapa:</b> PROJETO EXECUTIVO		<b>Disciplina:</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA		<b>Escala:</b> 1/1000
<b>Conteúdo da prancha:</b> APROPRIAÇÃO DE FRESAGEM - AVENIDA LUCIO COSTA				<b>Nº da Prancha:</b> 03/06
<b>Nome da prancha:</b> MED-00211-FR-PE-09-F03-R00				

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.





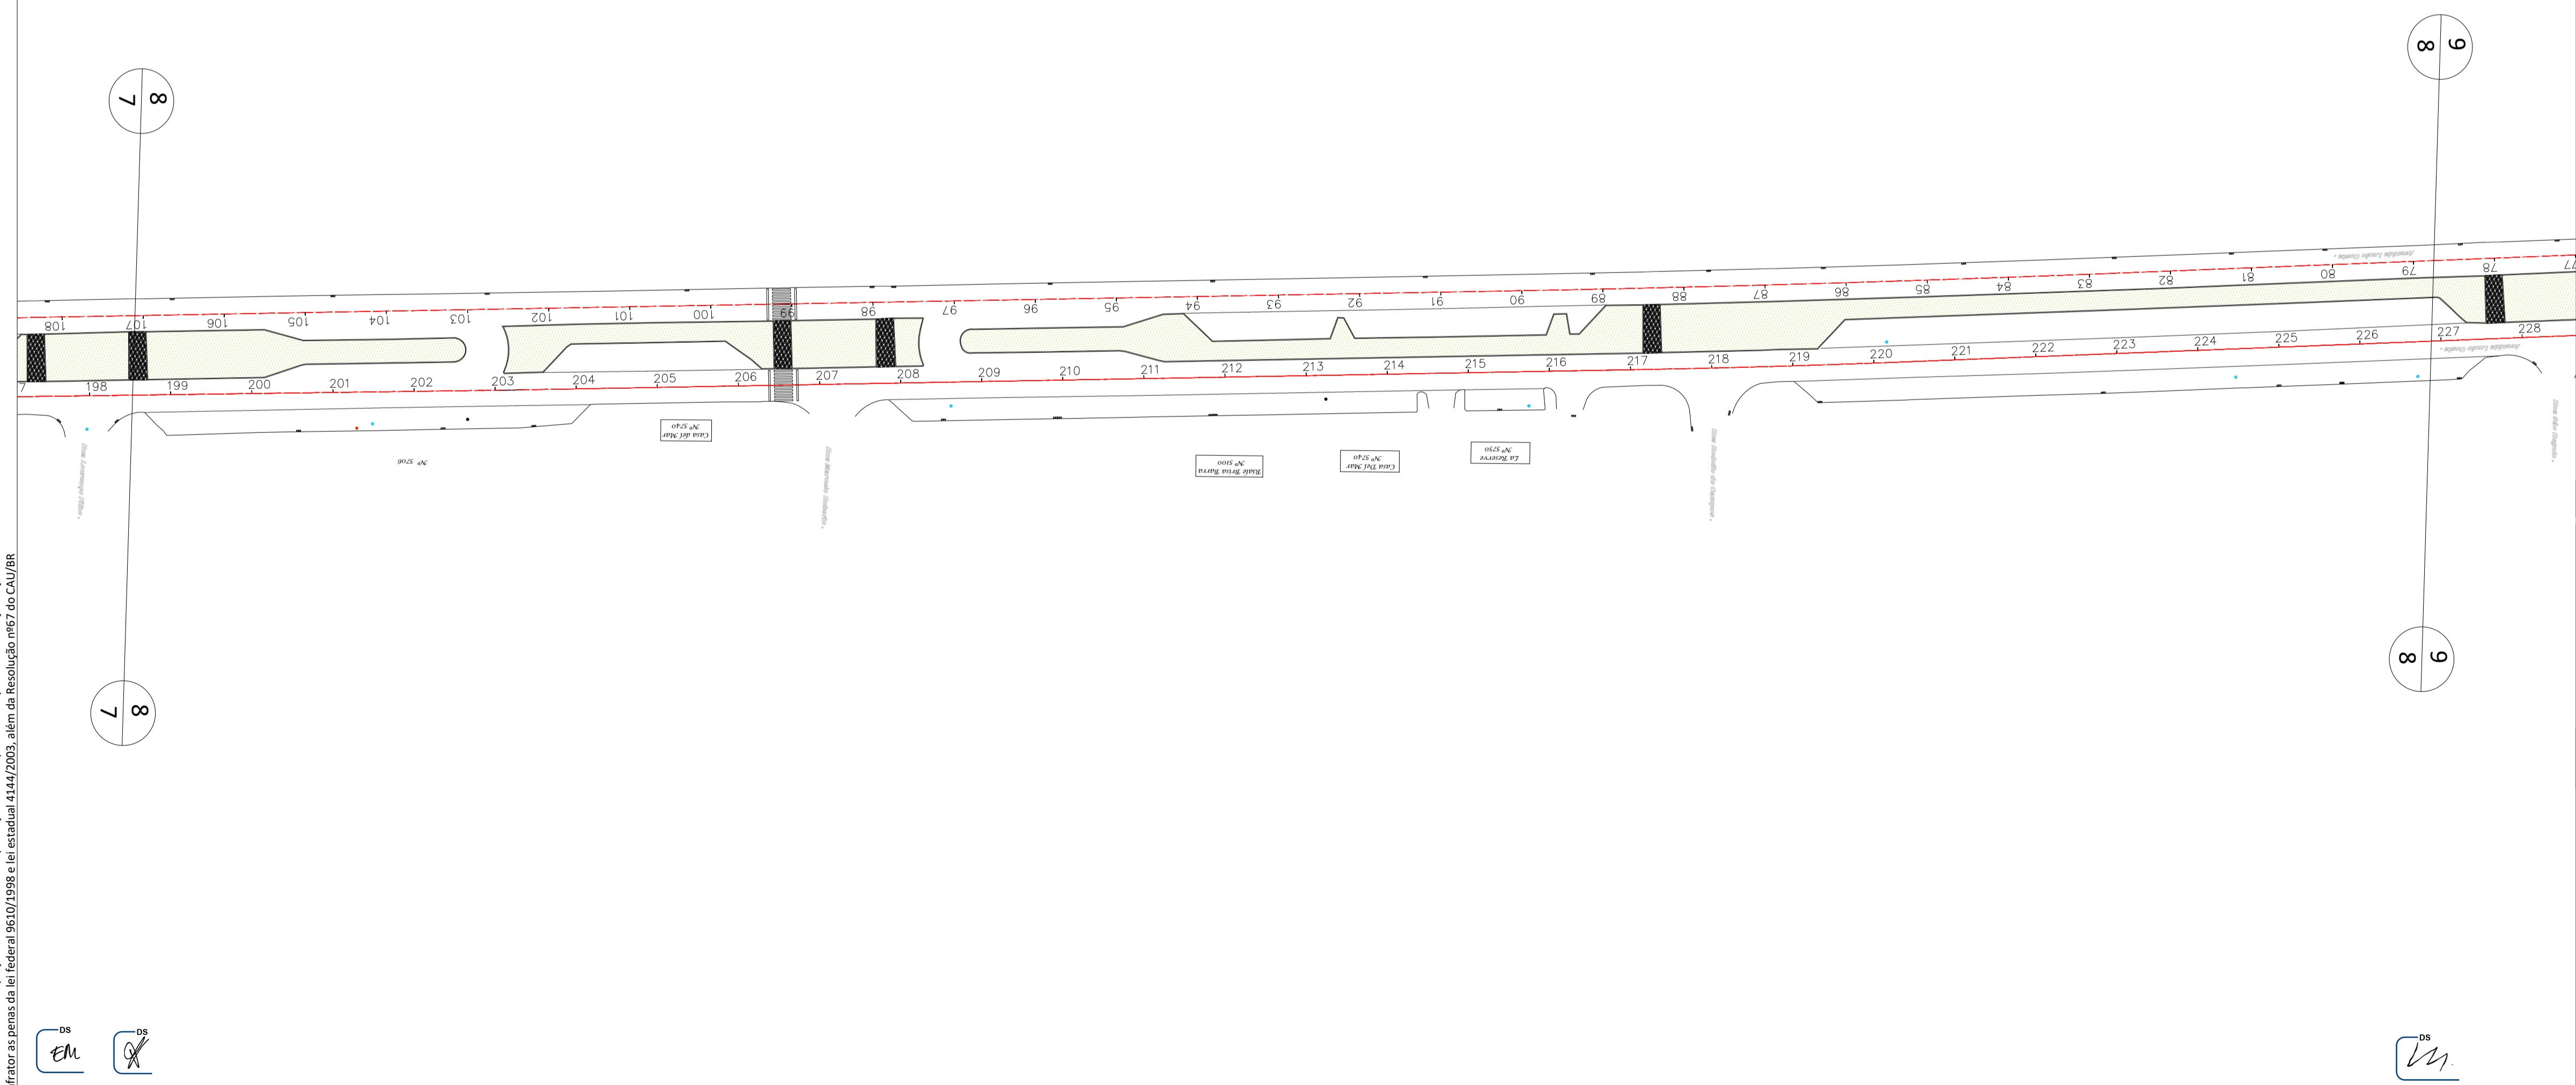
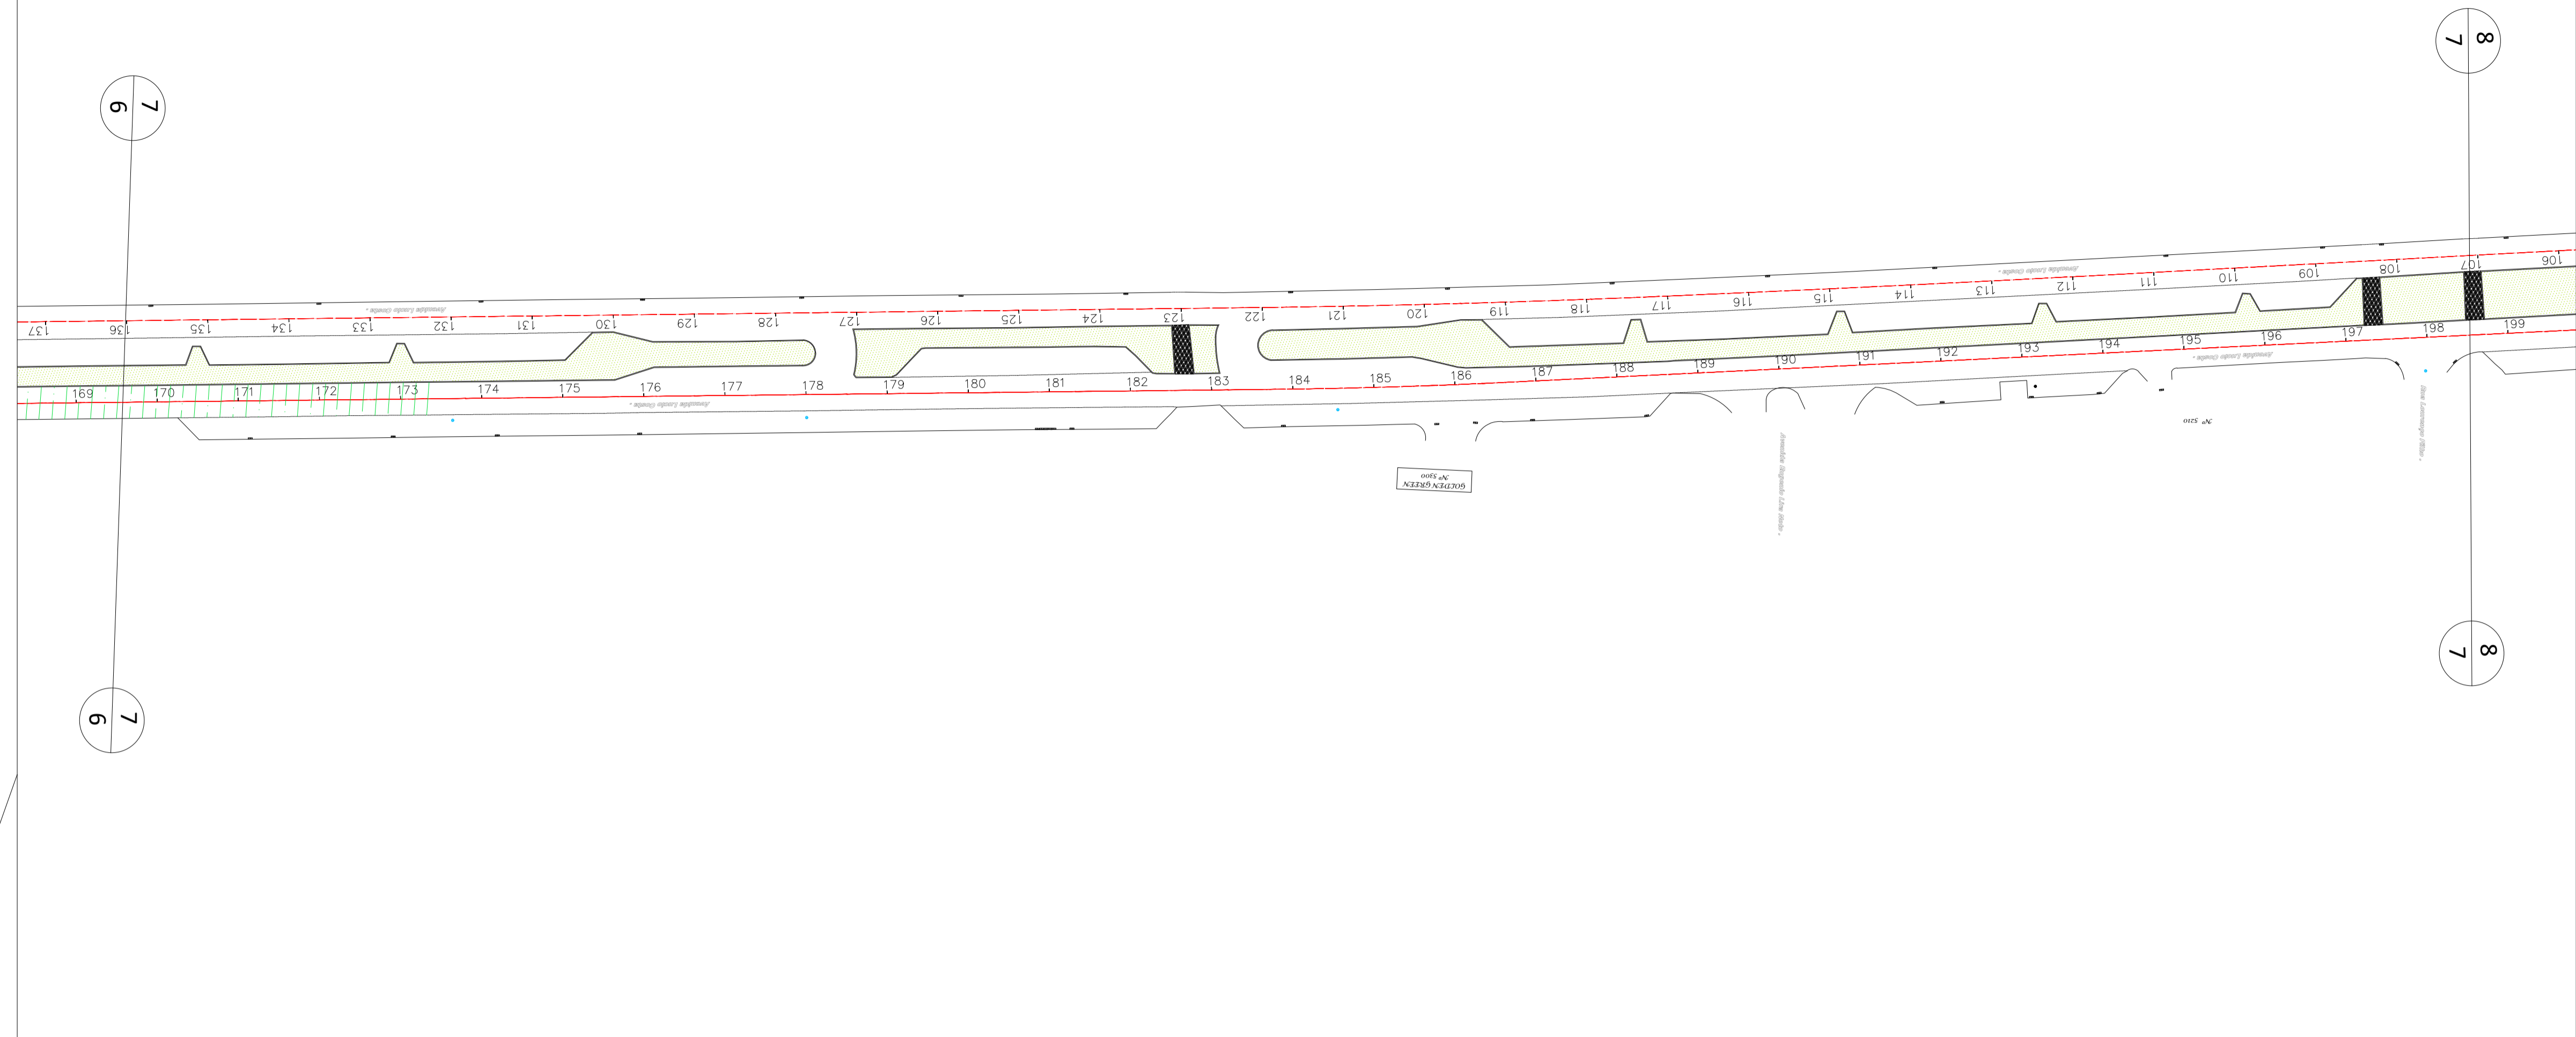


LOCAL:		AV. LUCIO COSTA		
FRESAGEM				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	2,13	18.687,77
	9ª MEDIÇÃO	2,13	3,47	11.415,83
		<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b>		
		<b>30.103,60</b>		

00	10/10/2020	DPA	Emissão inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa:				Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com
Certificações:				
Identificação:	00.211		Contratante: SMHIC	
Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis: Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Etapa:	Disciplina:		Escala:	
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA		1/1000	
Conteúdo da prancha:			Nº da Prancha:	
APROPRIAÇÃO DE FRESAGEM - AVENIDA LUCIO COSTA			04/06	
Nome da prancha: MED-00211-FR-PE-09-F04-R00				

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da Lei Federal 9610/1998 e da Estadual 4144/2009, além da Resolução nº67 do CAU/BR.



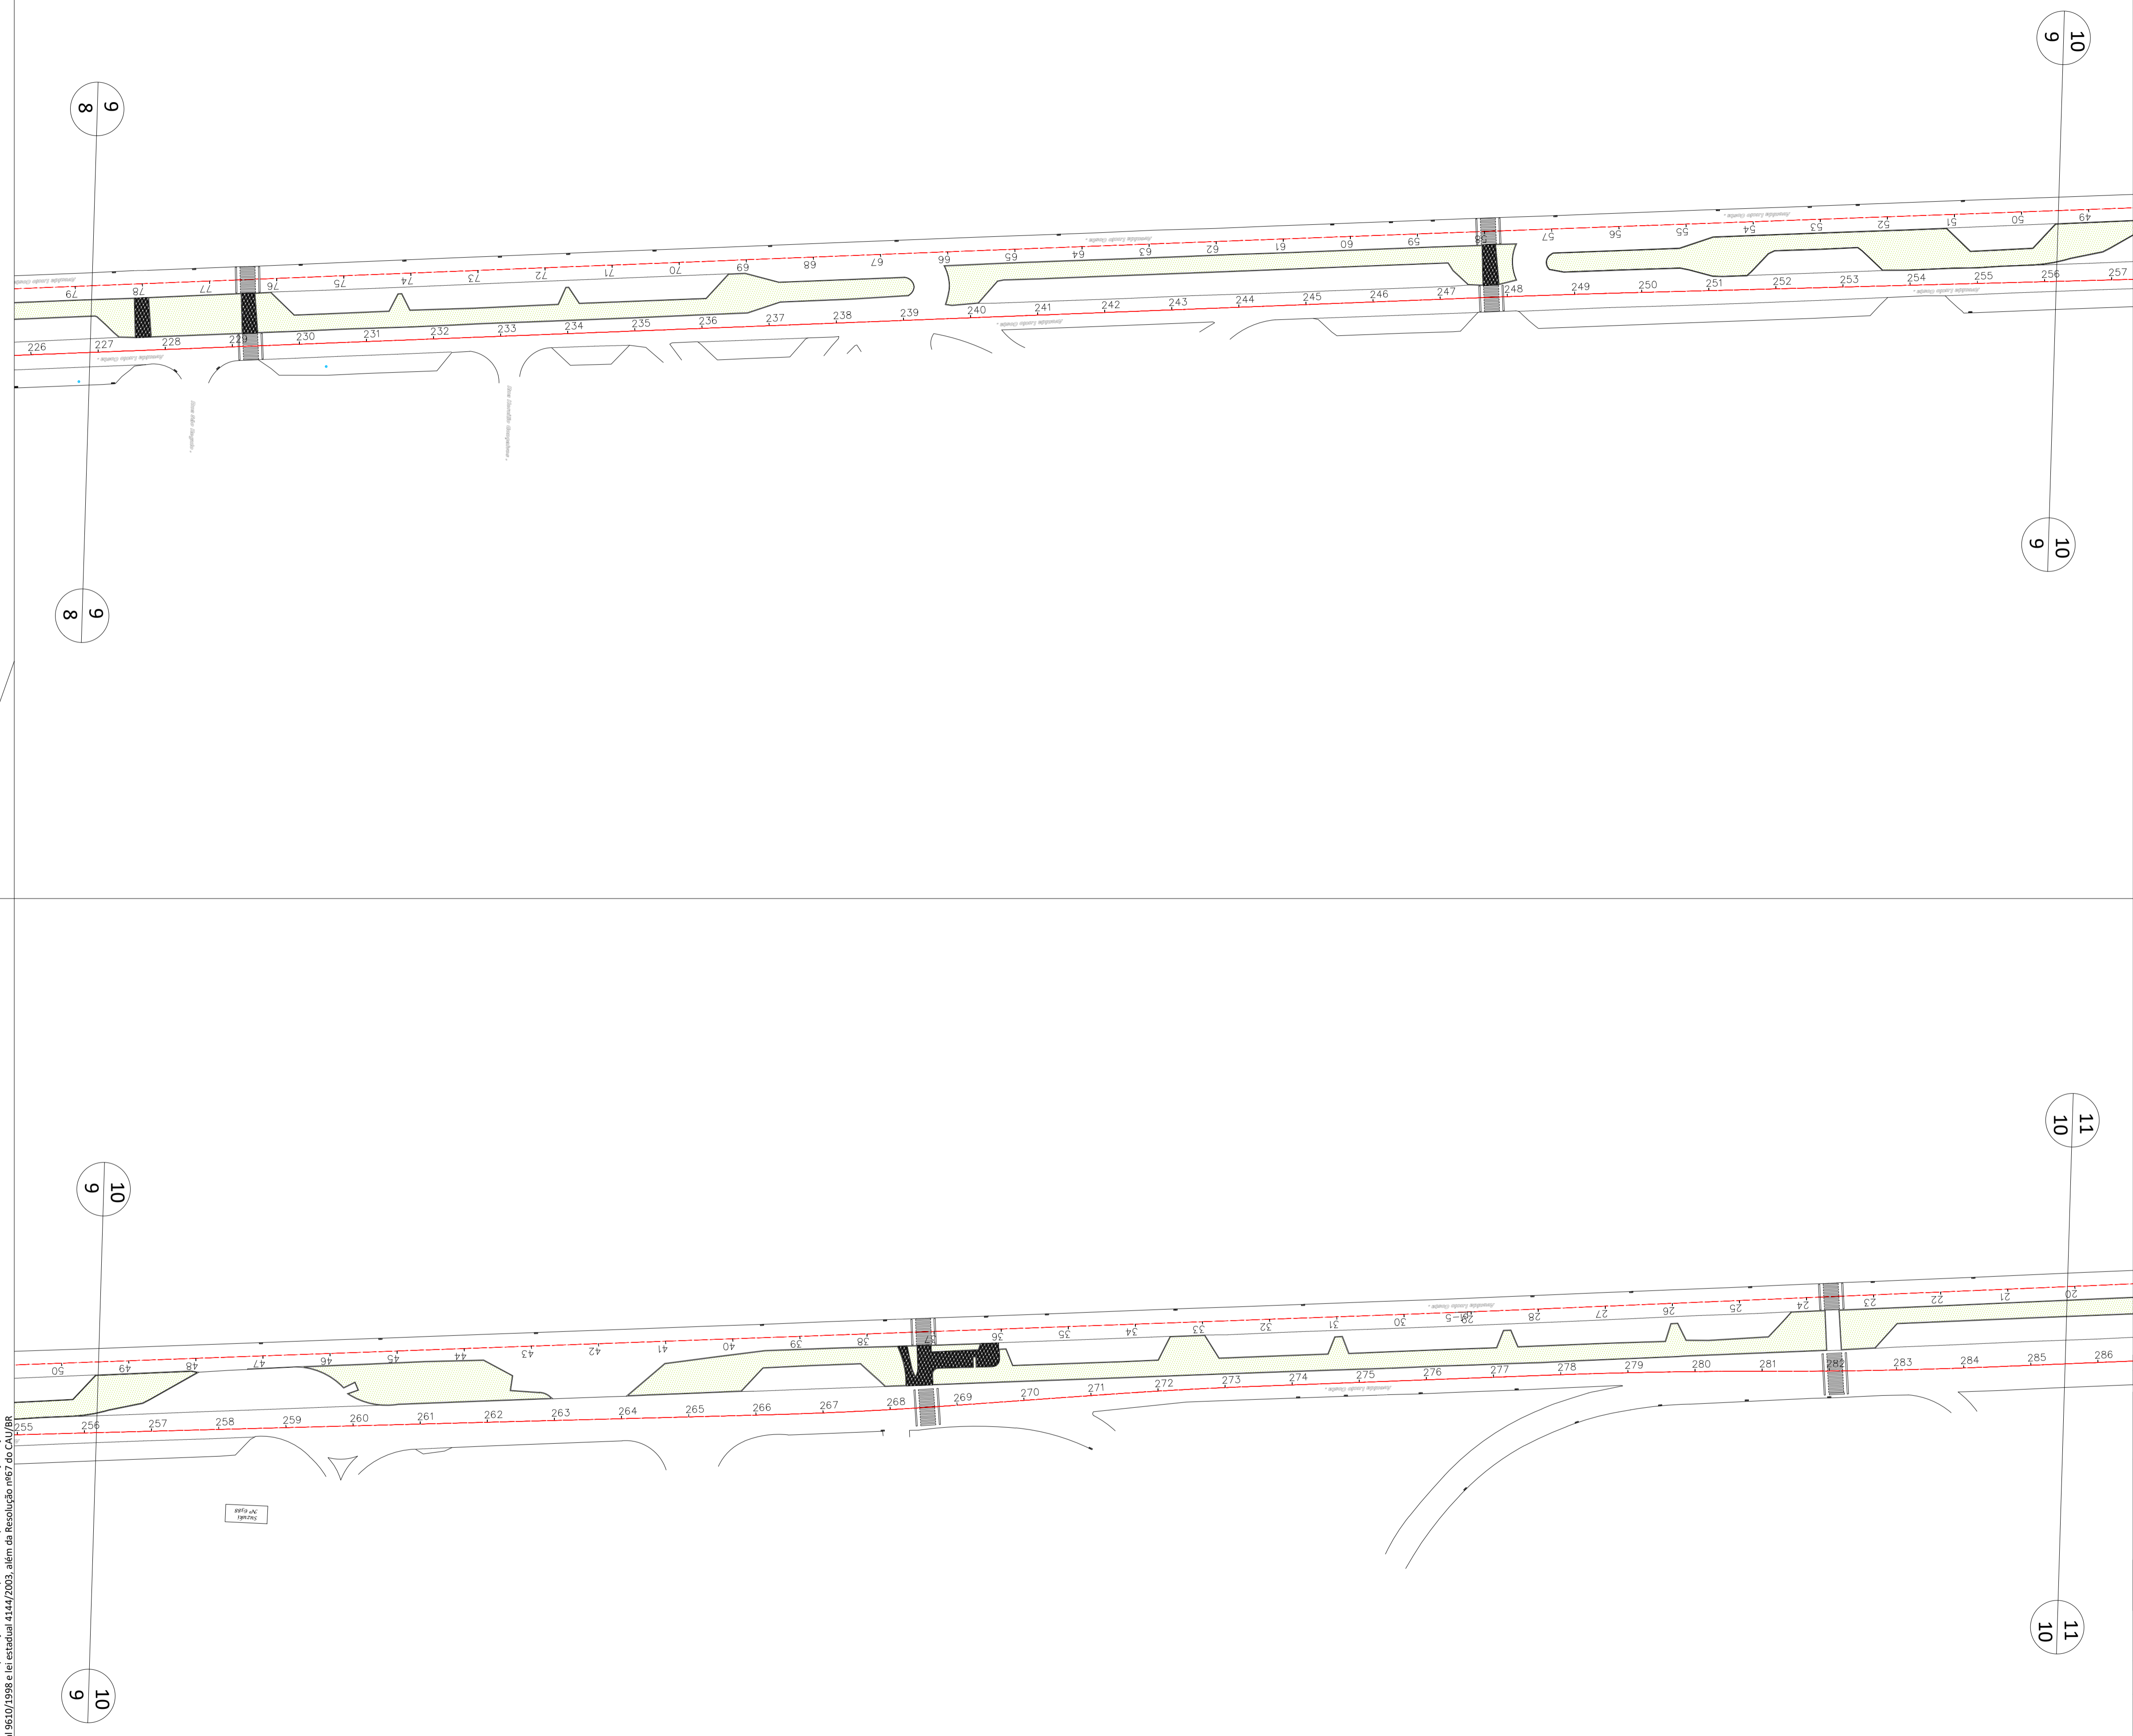

LOCAL:		AV. LUCIO COSTA			
FRESAGEM					
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)	
	8ª MEDIÇÃO	-	2,13	18.687,77	
	9ª MEDIÇÃO	2,13	3,47	11.415,83	
		<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b>			<b>30.103,60</b>

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR.

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	10/10/2020	DPA	Emissão inicial

**Empresa:** **DIMENSIONAL ENGENHARIA**  
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

**Identificação:** 00.211      **Contratante:** SMHIC



**Empreendimento:** PAVIMENTA RIO AP - 4



**Endereço:** ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

**Setor:** Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

**Etapa:** PROJETO EXECUTIVO      **Disciplina:** PAVIMENTAÇÃO URBANA      **Escala:** 1/1000

**Conteúdo da prancha:** APROPRIAÇÃO DE FRESAGEM - AVENIDA LUCIO COSTA      **Nº da Prancha:** 05/06  
**Nome da prancha:** MED-00211-FR-PE-09-F05-R00



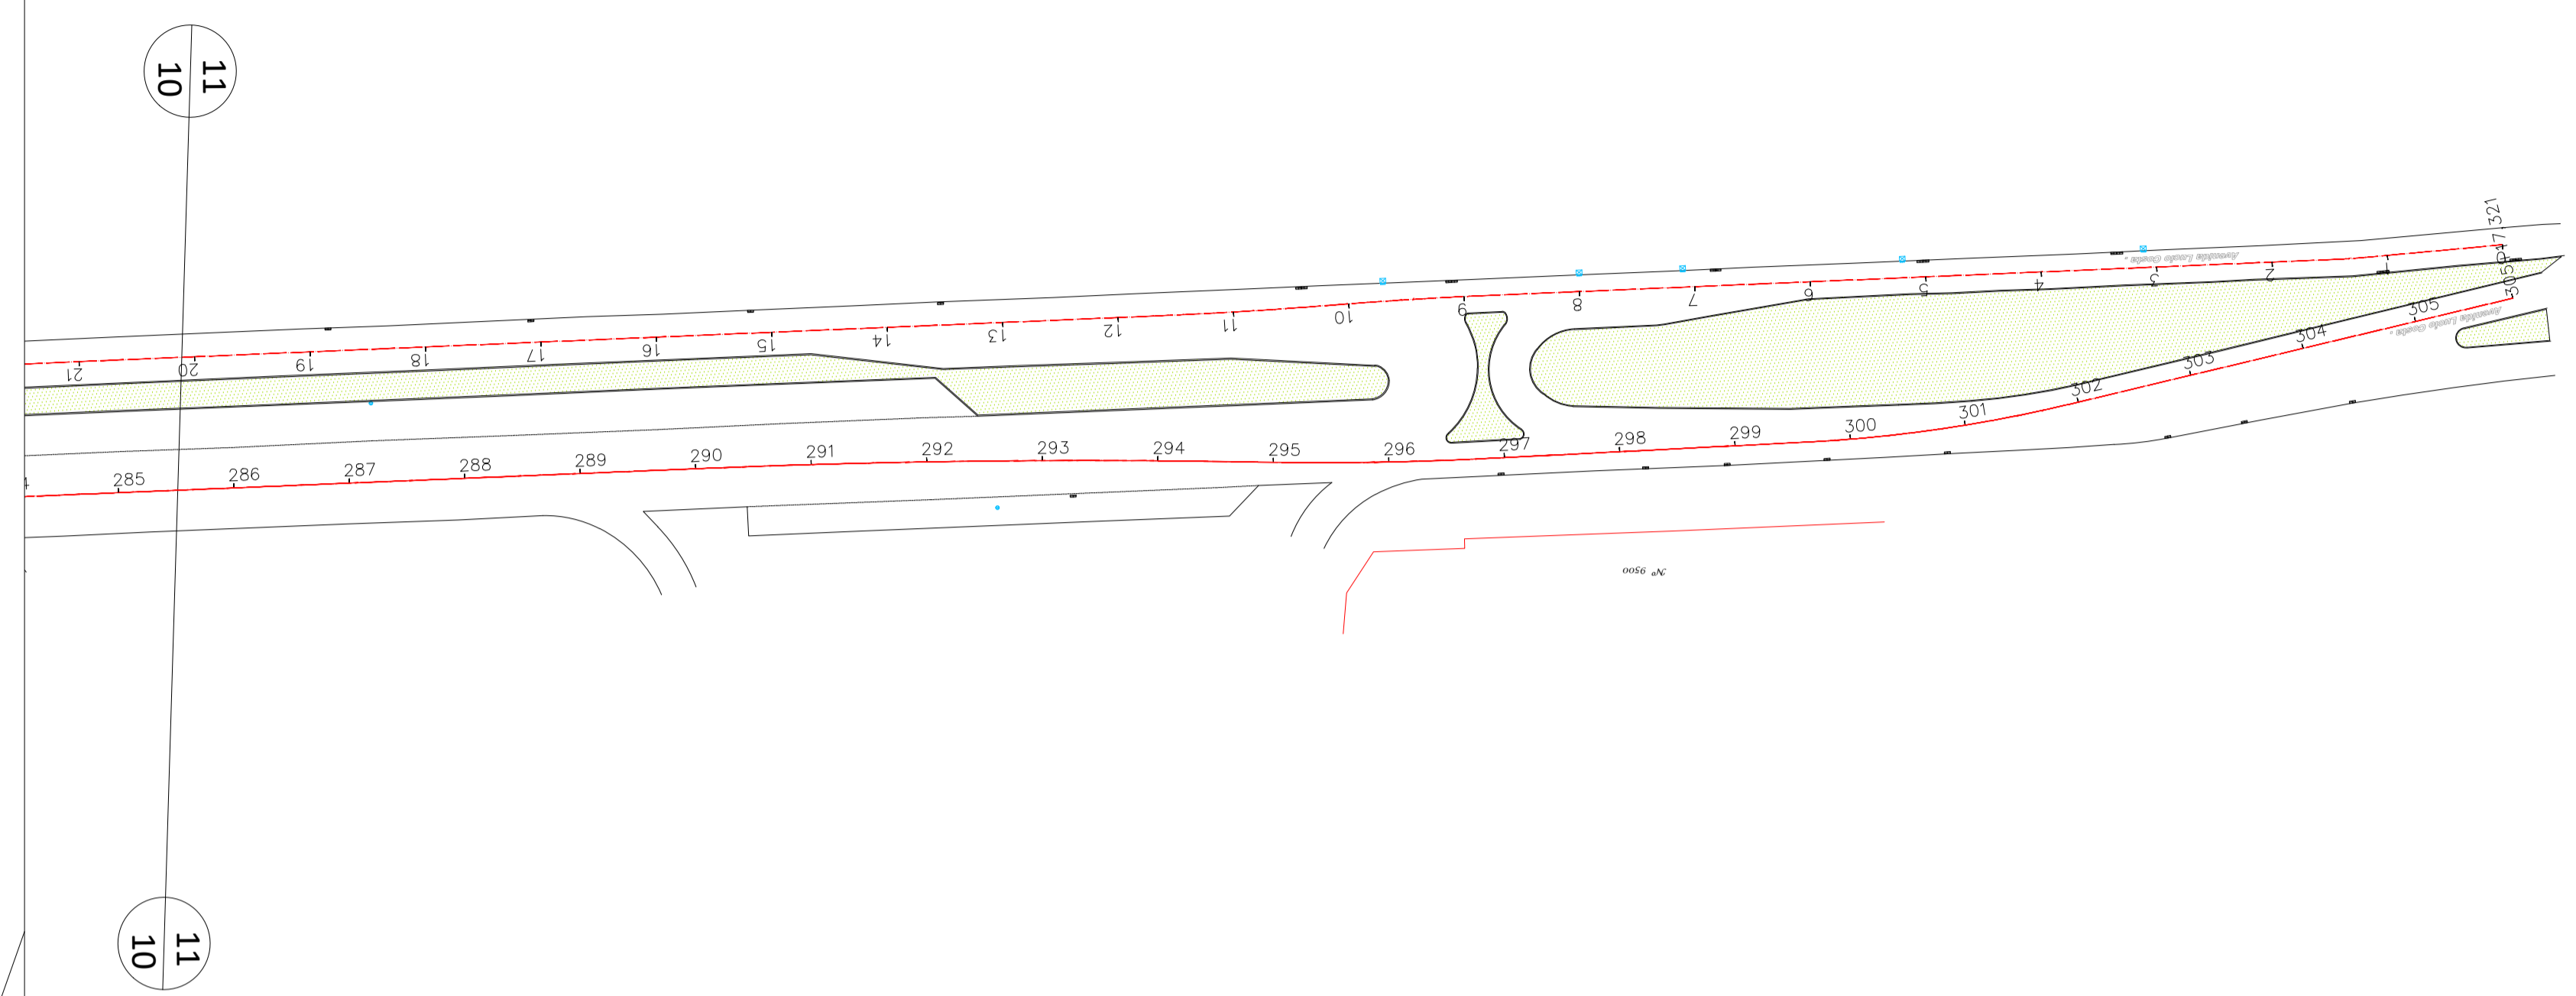

LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
FRESAGEM				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	2,13	18.687,77
	9ª MEDIÇÃO	2,13	3,47	11.415,83
<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b>				<b>30.103,60</b>

Revisão	Data	DPA	Emissão	Descrição
00	10/10/2020			Emissão Inicial

**Empresa:** **DIMENSIONAL ENGENHARIA**  
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

**Identificação:** 00.211      **Contratante:** SMIHC

**Empreendimento:** PAVIMENTA RIO AP - 4

**Endereço:** ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

**Setor:**      **Profissionais responsáveis:**  
 Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

**Etapas:** PROJETO EXECUTIVO      **Disciplina:** PAVIMENTAÇÃO URBANA      **Escala:** 1/1000

**Conteúdo da prancha:** APROPRIAÇÃO DE FRESAGEM - AVENIDA LUCIO COSTA      **Nº da Prancha:** 06/06  
**Nome da prancha:** MED-00211-FR-PE-09-F06-R00

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR.





PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO


AV. LUCIO COSTA - 1ª CAMADA





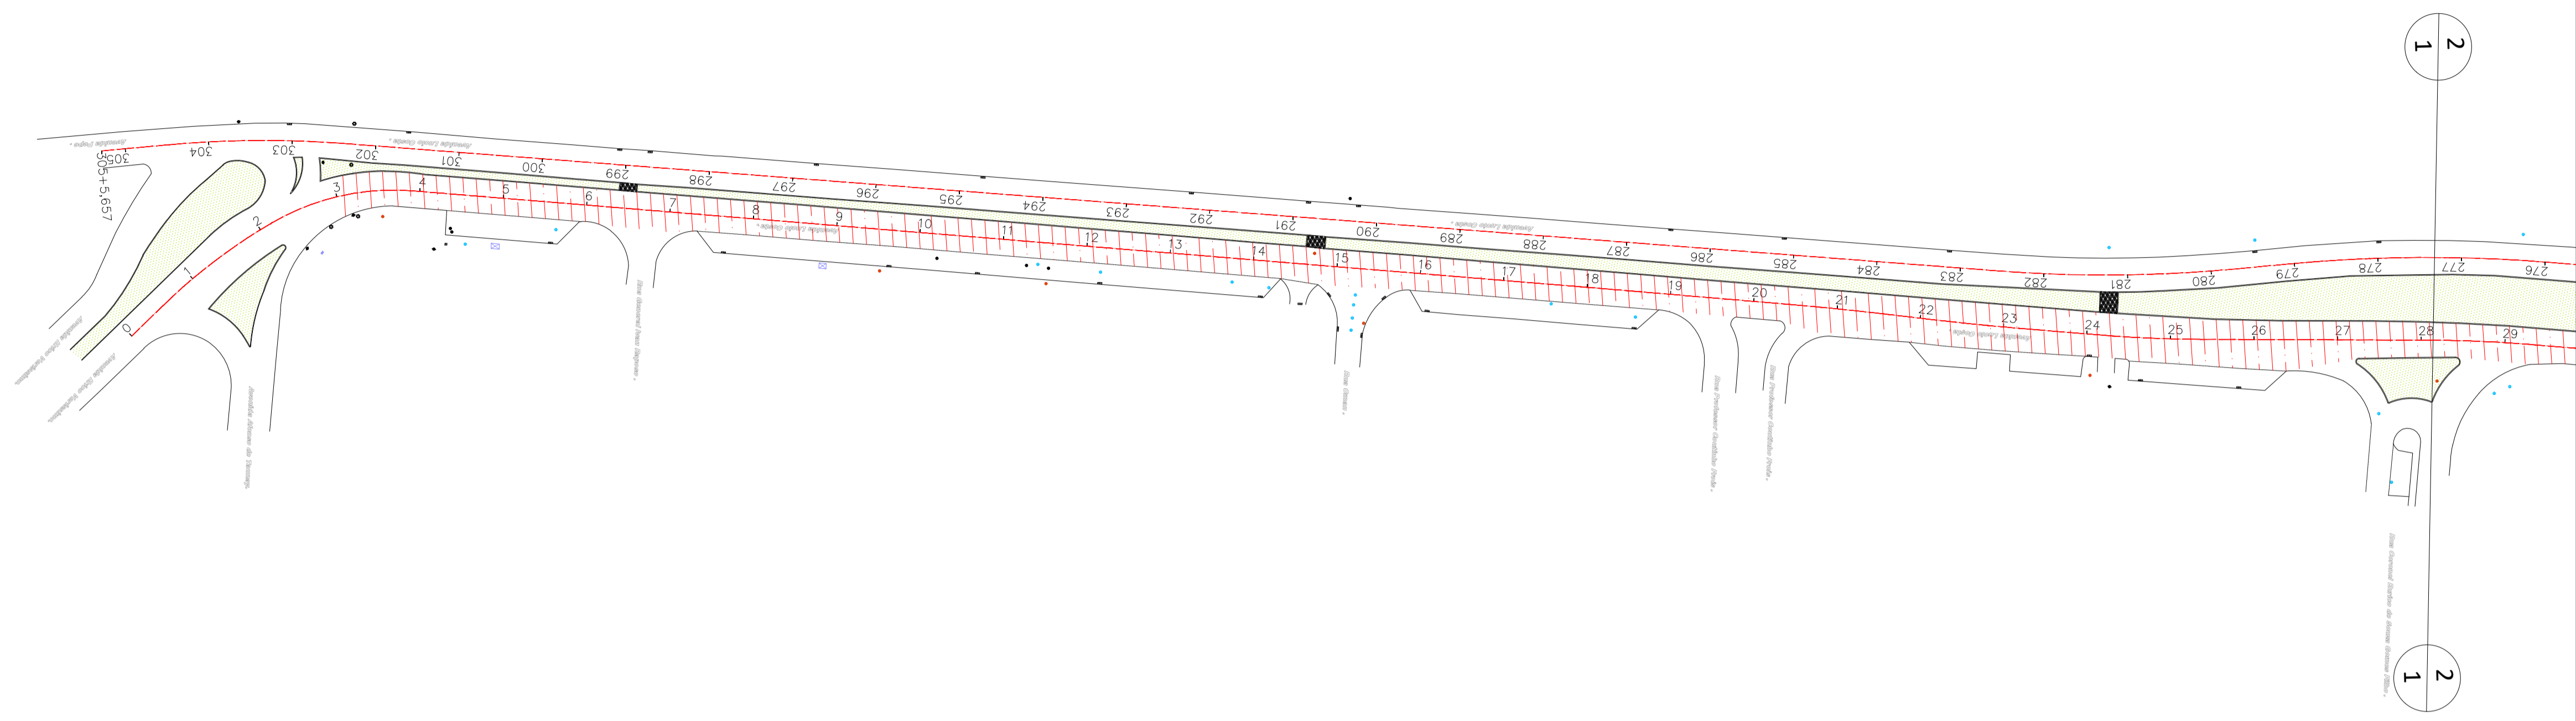

LOCAL:		AV. LUCIO COSTA		
MASSA ASFÁLTICA (BINDER)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	1,51	12.810,94
	9ª MEDIÇÃO	1,51	3,23	15.410,08
TOTAL ACUMULADO (M2)				28.221,02

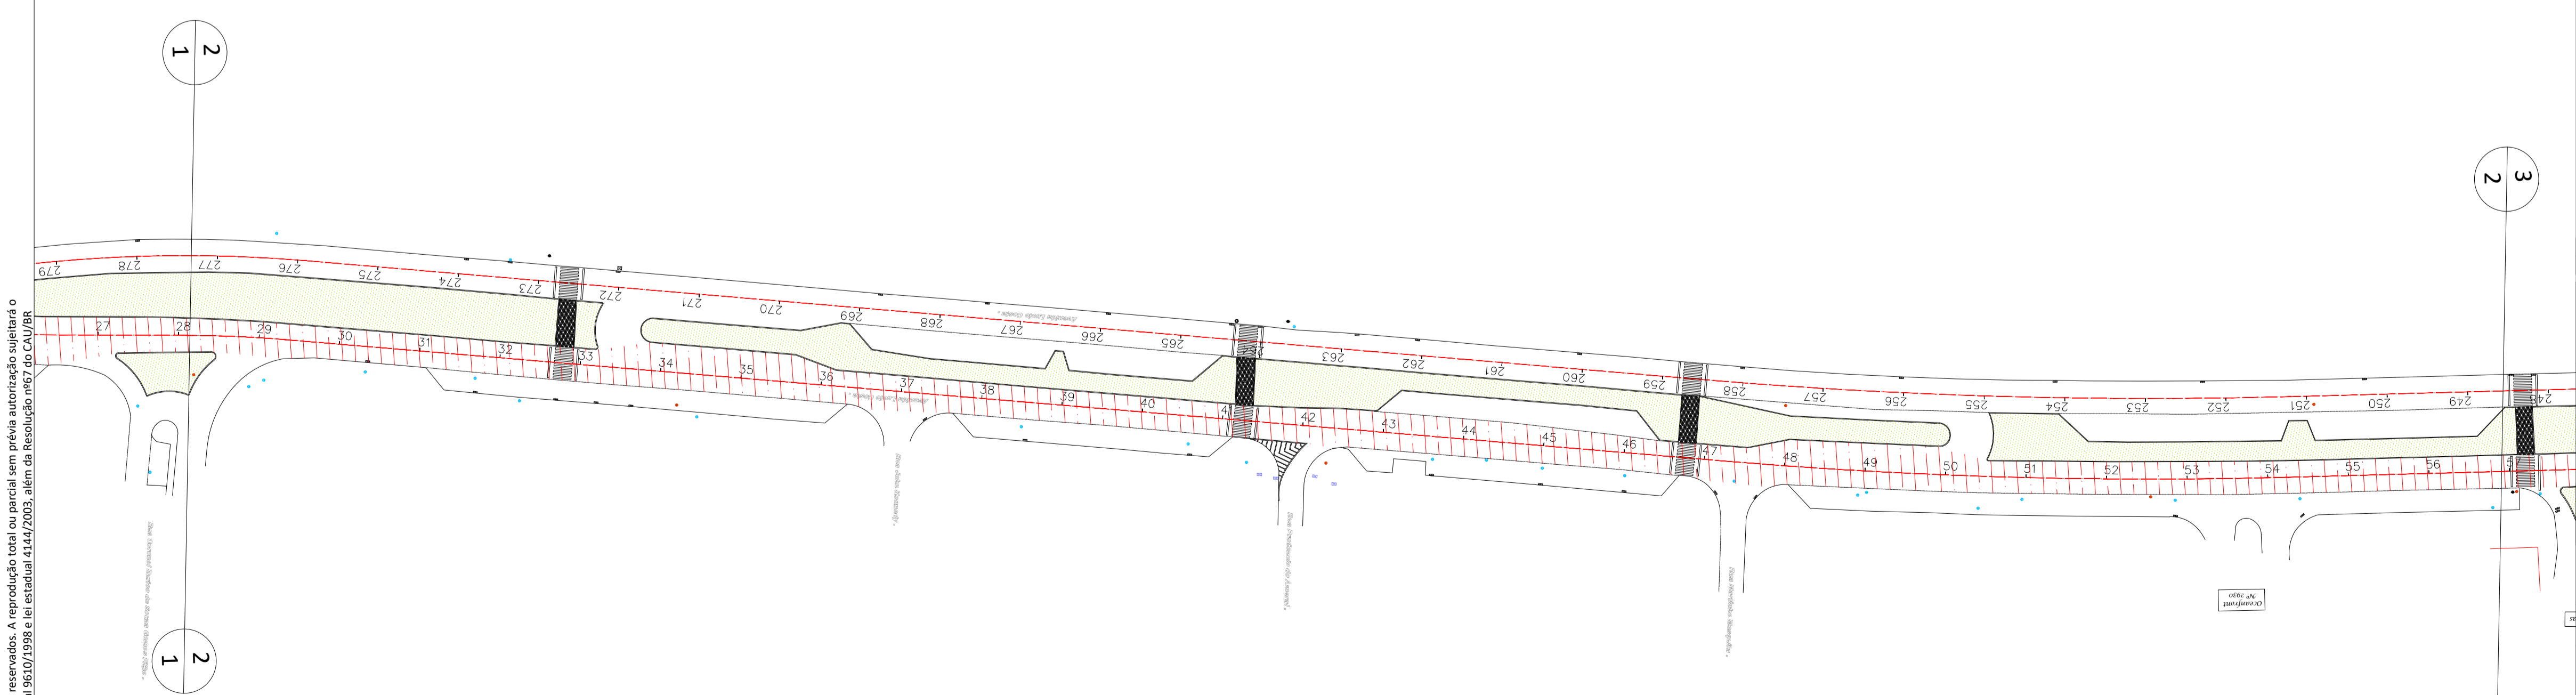

Revisão	Data	DPA	Emissão	Descrição
00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial	

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA  
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

Identificação:	Contratante:
00.211	SMIHC

**Empreendimento:**  
 PAVIMENTA RIO AP - 4

**Endereço:**  
 ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ



**Setor:**

**Profissionais responsáveis:**  
 Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

Etapa:	Disciplina:	Escala:
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/1000
Conteúdo da prancha:		Nº da Prancha:
APROPRIAÇÃO DE 1ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA		01/06
Nome da prancha:		
MED-00211-ACB-PE-09-F01-R00		

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2009, além da Resolução nº67 do CAU/BR





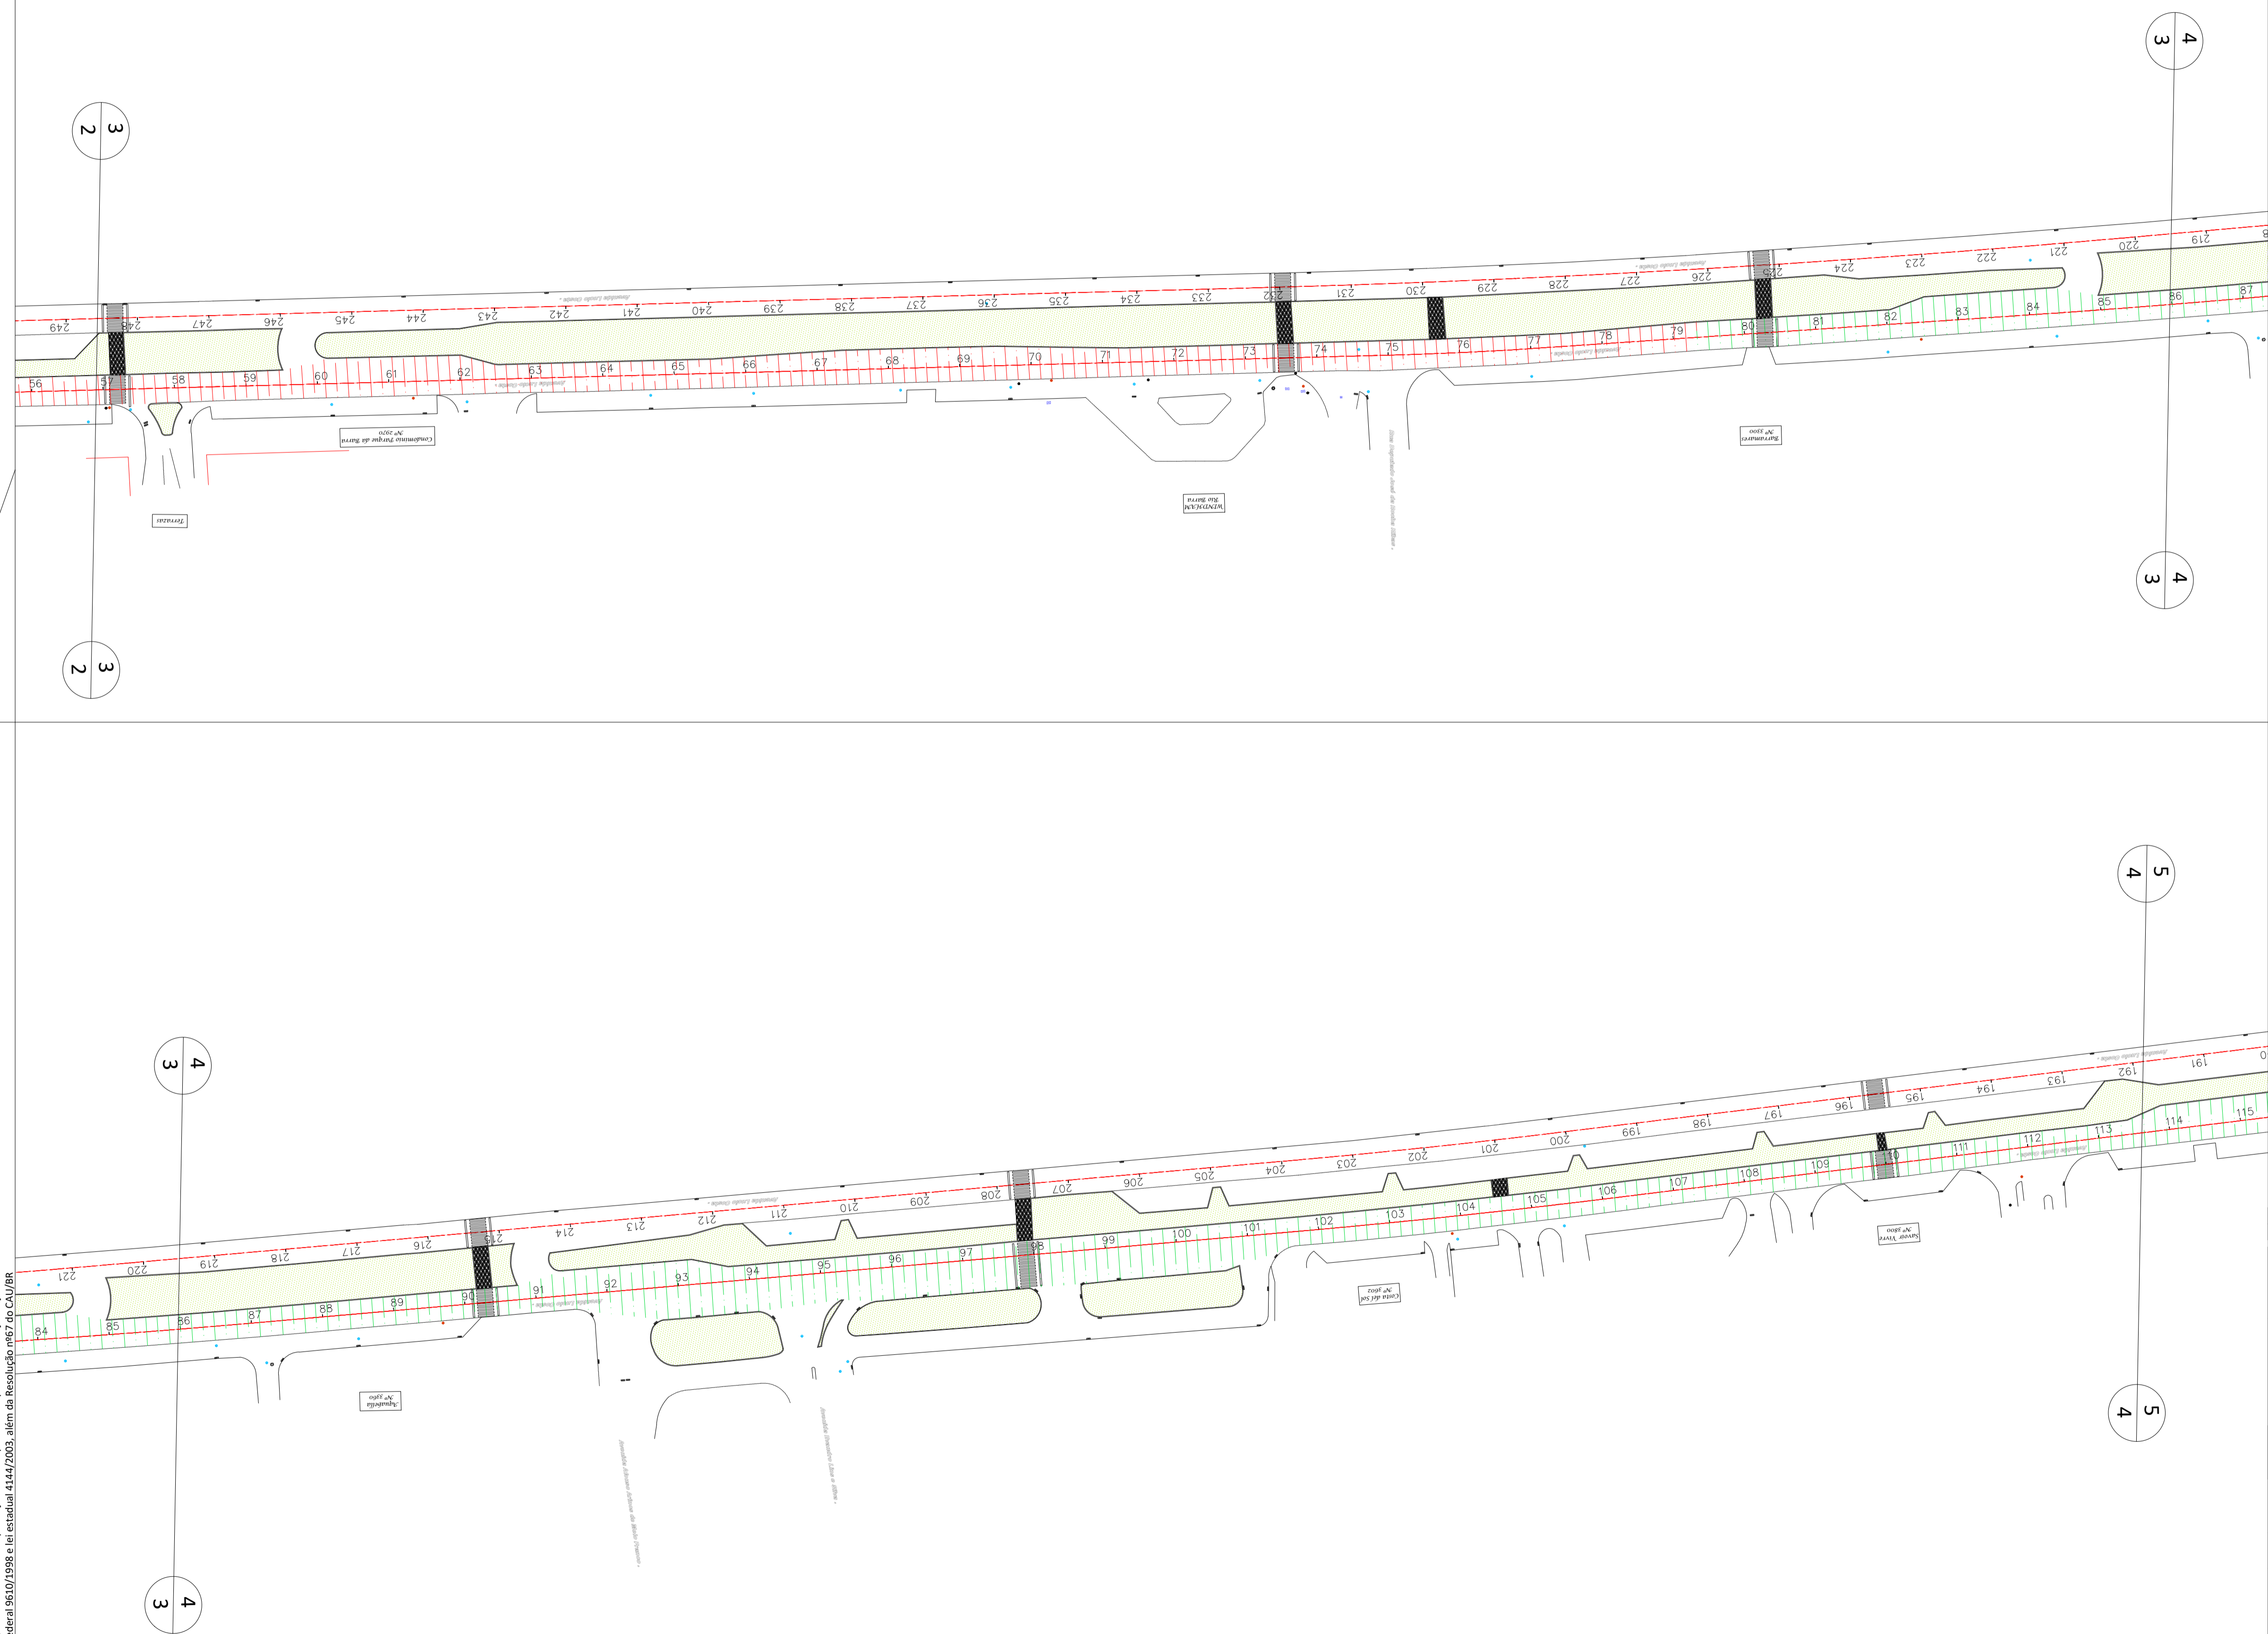


LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
MASSA ASFÁLTICA (BINDER)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	1,51	12.810,94
	9ª MEDIÇÃO	1,51	3,23	15.410,08
TOTAL ACUMULADO (M2)				28.221,02

00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa: <b>DIMENSIONAL</b> ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com				
Certificações:				
Identificação:		Contratante:		
00.211		SMIHC		
Empreendimento:				
PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço:				
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis:		
		Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Etapa:		Disciplina:		Escala:
PROJETO EXECUTIVO		PAVIMENTAÇÃO URBANA		1/1000
Conteúdo da prancha:		Nome da prancha:		02/06
APROPRIAÇÃO DE 1ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA		MED-00211-ACB-PE-09-F02-R00		

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº 67 do CAU/BR.




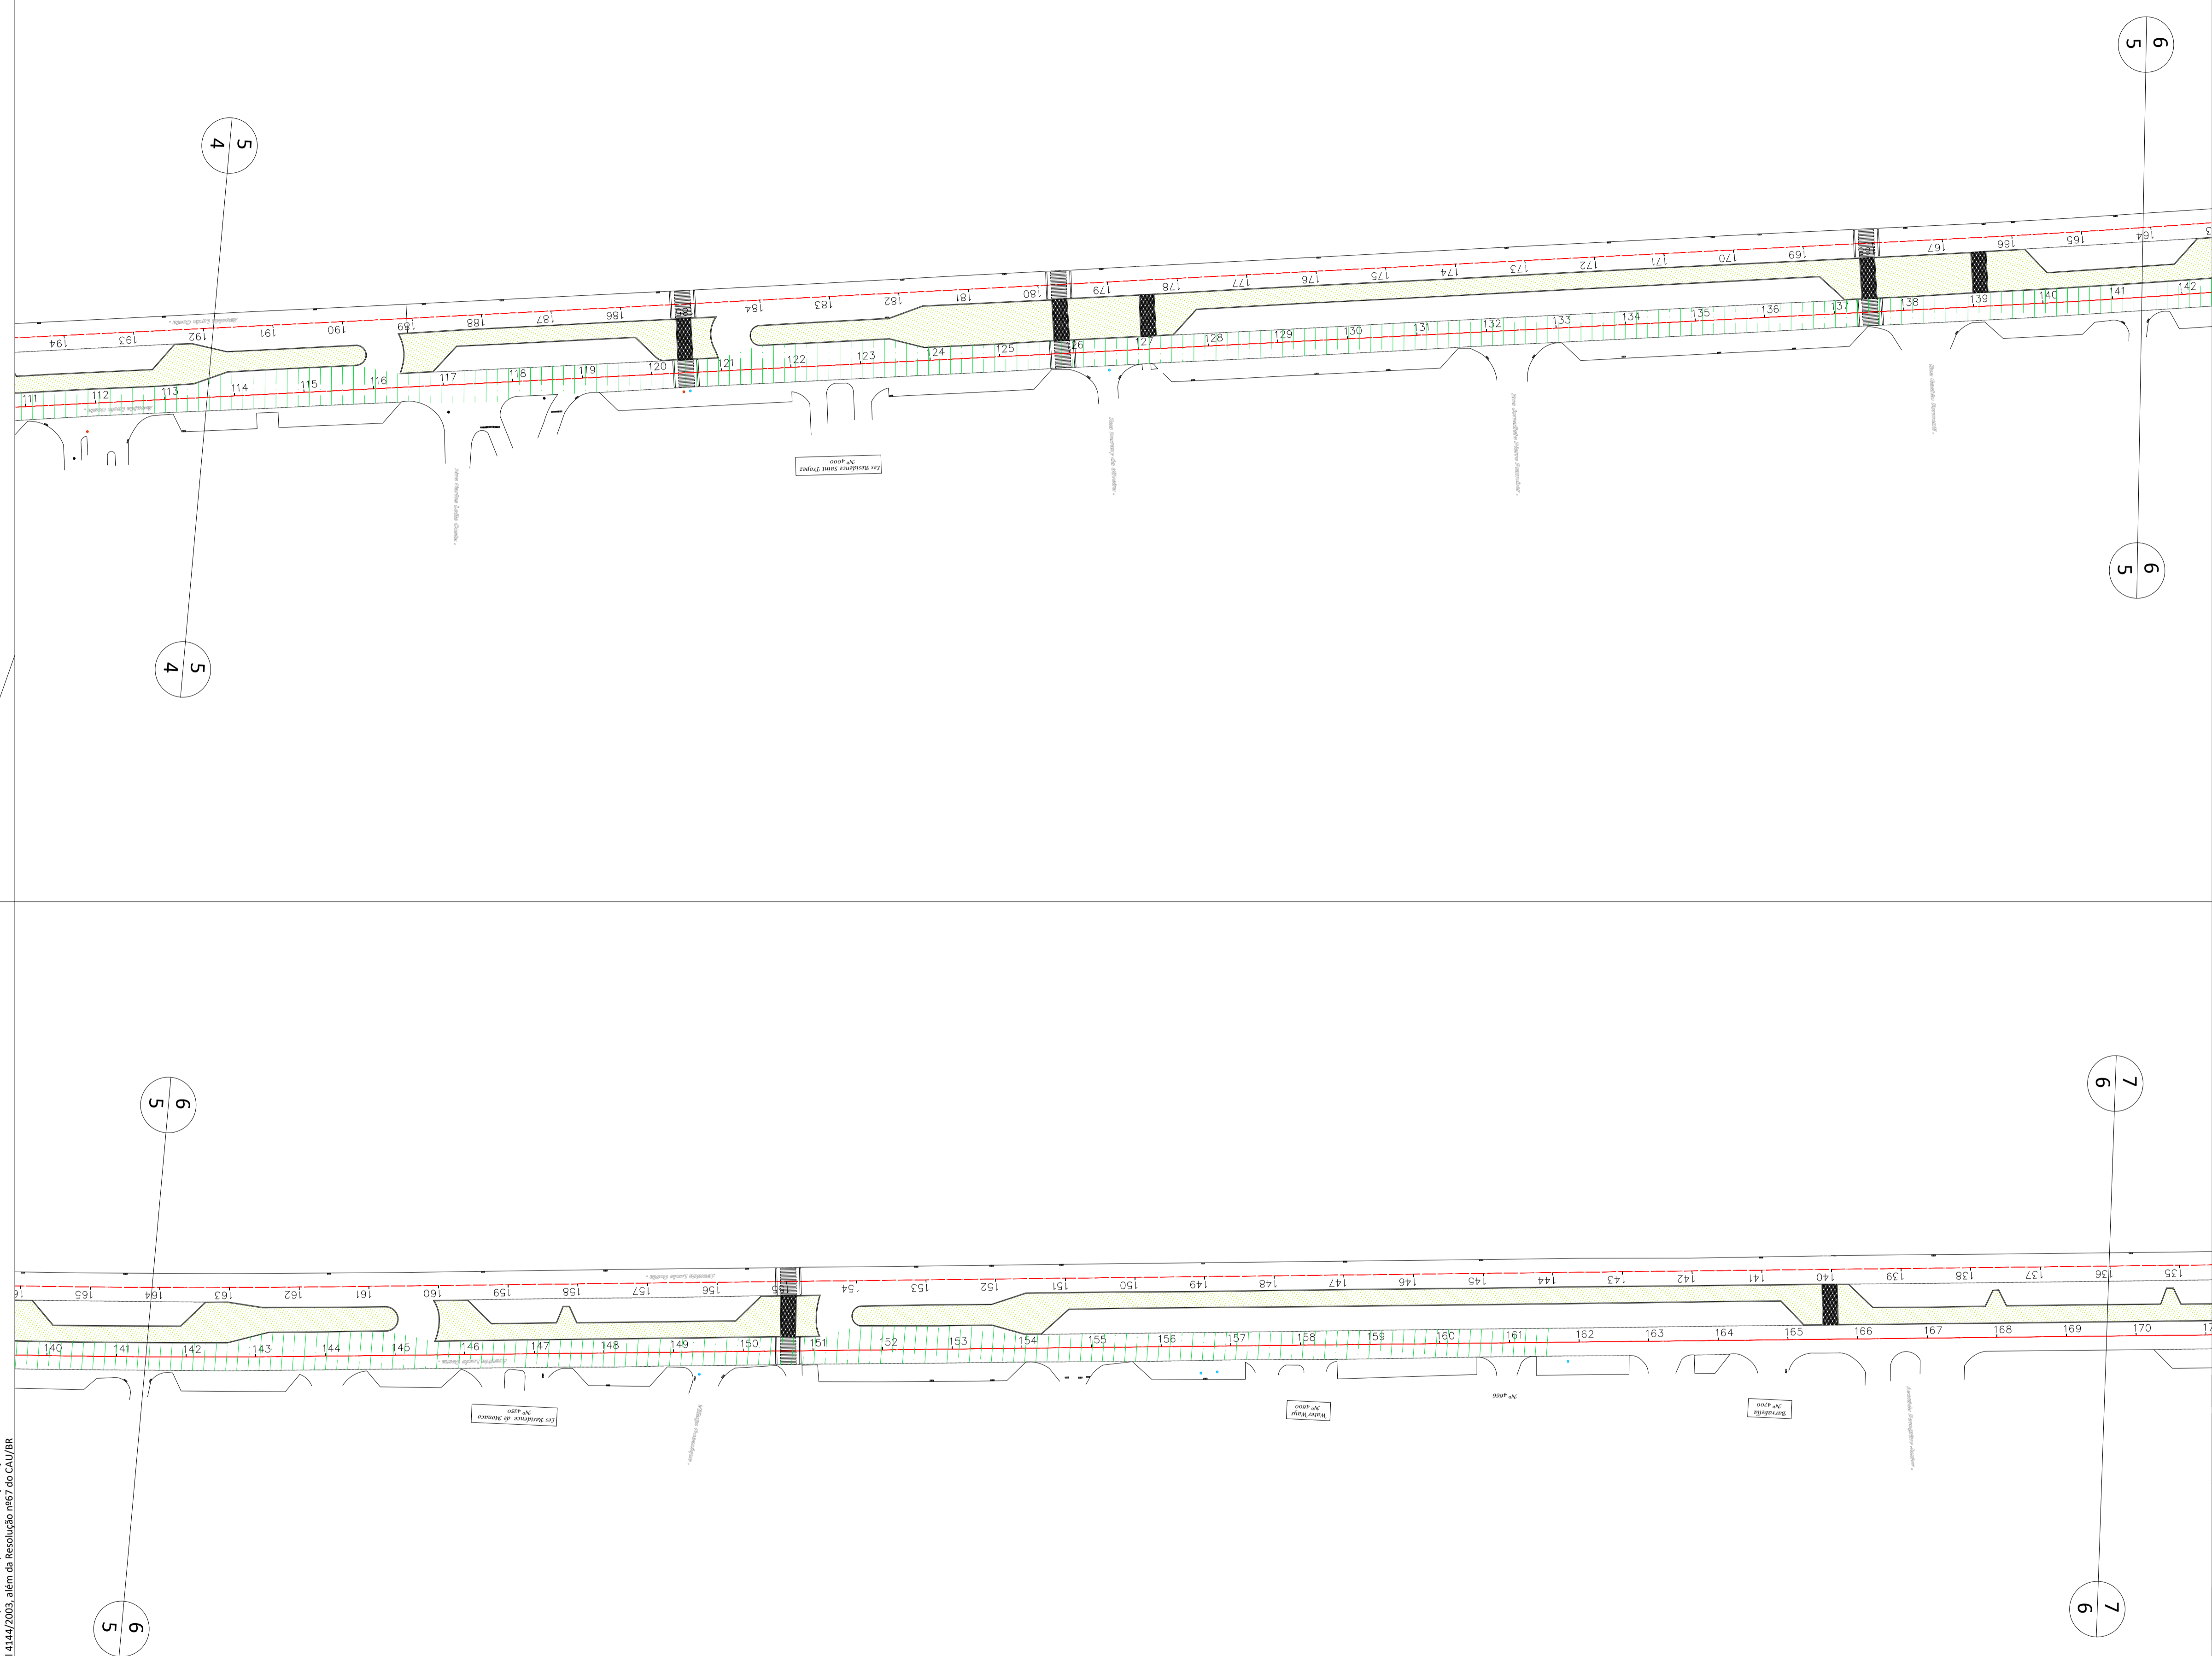


LOCAL:		AV. LUCIO COSTA		
MASSA ASFÁLTICA (BINDER)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	1,51	12.810,94
	9ª MEDIÇÃO	1,51	3,23	15.410,08
TOTAL ACUMULADO (M2)				28.221,02

00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa:  Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com				
Certificações:				
Identificação: 00.211		Contratante: SMHIC		
Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis: Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Etapa: PROJETO EXECUTIVO		Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA		Escala: 1/1000
Conteúdo da prancha: APROPRIAÇÃO DE 1ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA				Nº da Prancha: 03/06
Nome da prancha: MED-00211-ACB-PE-09-F03-R00				

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.



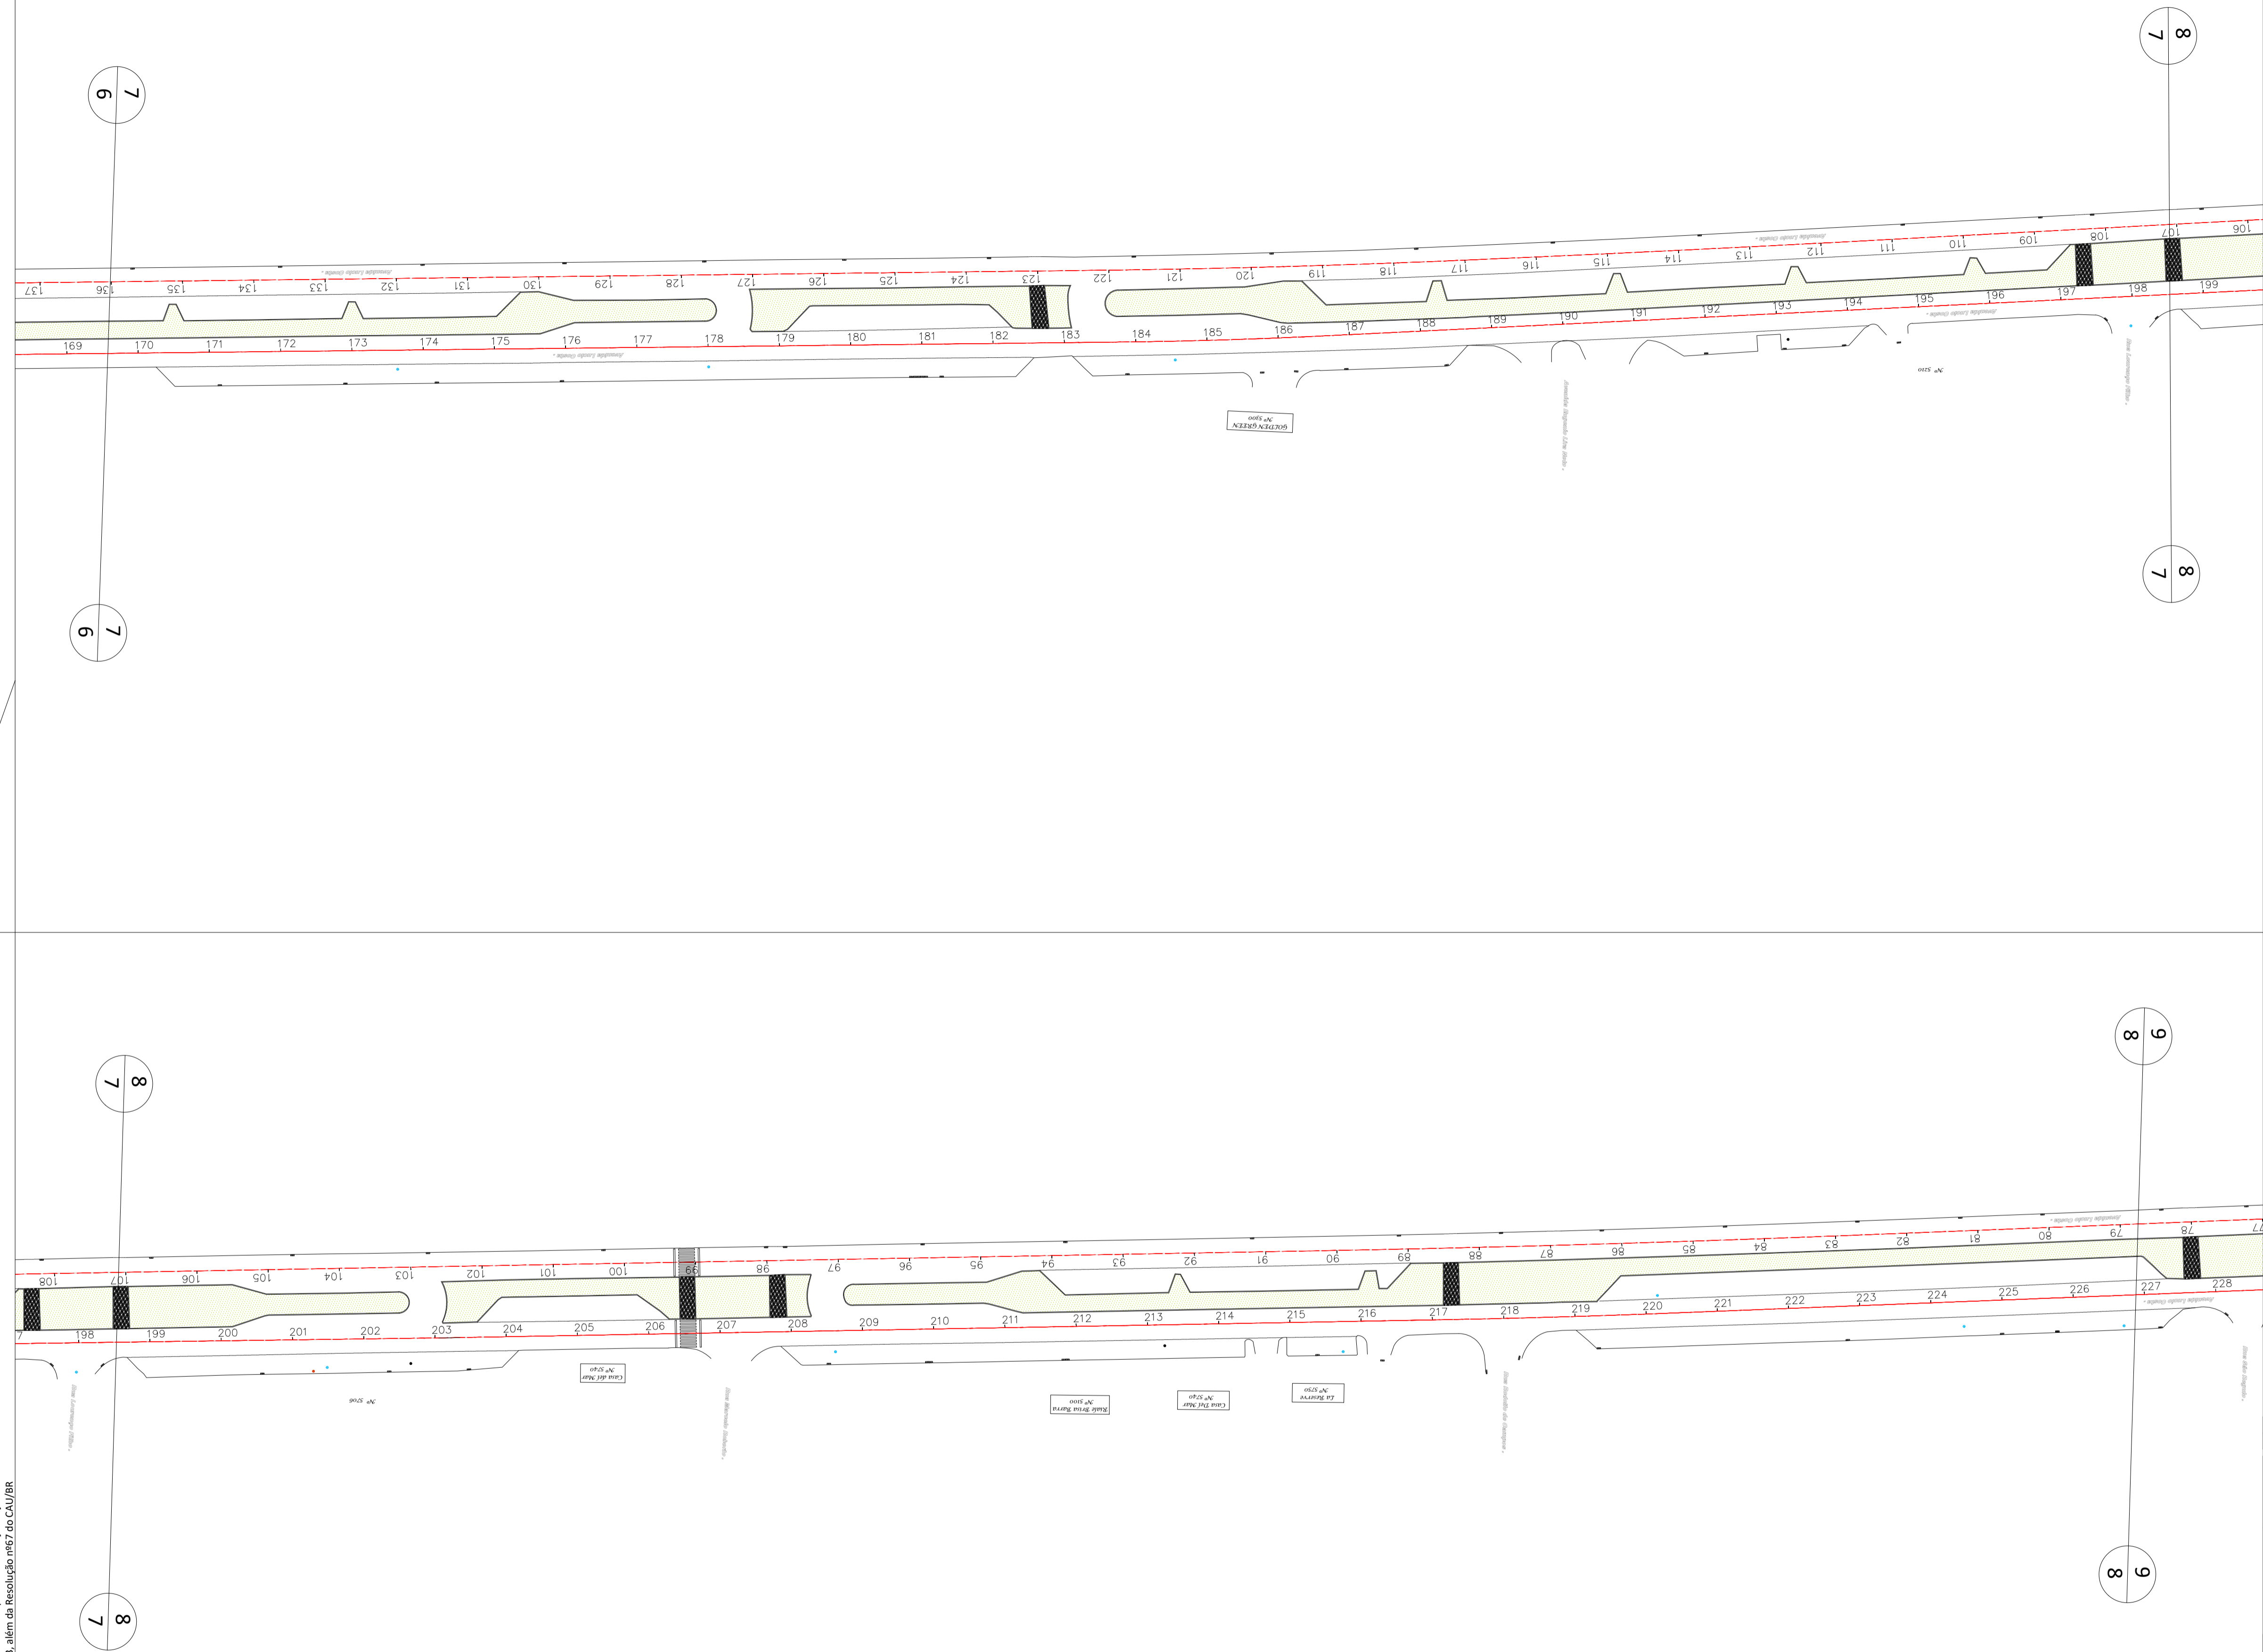

LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
<b>MASSA ASFÁLTICA (BINDER)</b>				
<b>LEGENDA</b>	<b>MEDIÇÃO</b>	<b>INICIO (KM)</b>	<b>FINAL (KM)</b>	<b>ÁREA (M2)</b>
	8ª MEDIÇÃO	-	1,51	12.810,94
	9ª MEDIÇÃO	1,51	3,23	15.410,08
<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b>				<b>28.221,02</b>

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	10/10/2020	DPA	Emissão inicial

**Empresa:** **DIMENSIONAL ENGENHARIA**  
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

**Identificação:** 00.211      **Contratante:** SMHIC

**Empreendimento:**  
**PAVIMENTA RIO AP - 4**


**Endereço:**  
 ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ



**Setor:**      **Profissionais responsáveis:**  
 Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

**Etapa:** PROJETO EXECUTIVO      **Disciplina:** PAVIMENTAÇÃO URBANA      **Escala:** 1/1000

**Conteúdo da prancha:**  
 APROPRIAÇÃO DE 1ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA      **Nº da Prancha:** 04/06  
**Nome da prancha:** MED-00211-ACB-PE-09-F04-R00

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2009, além da Resolução nº67 do CAU/BR.



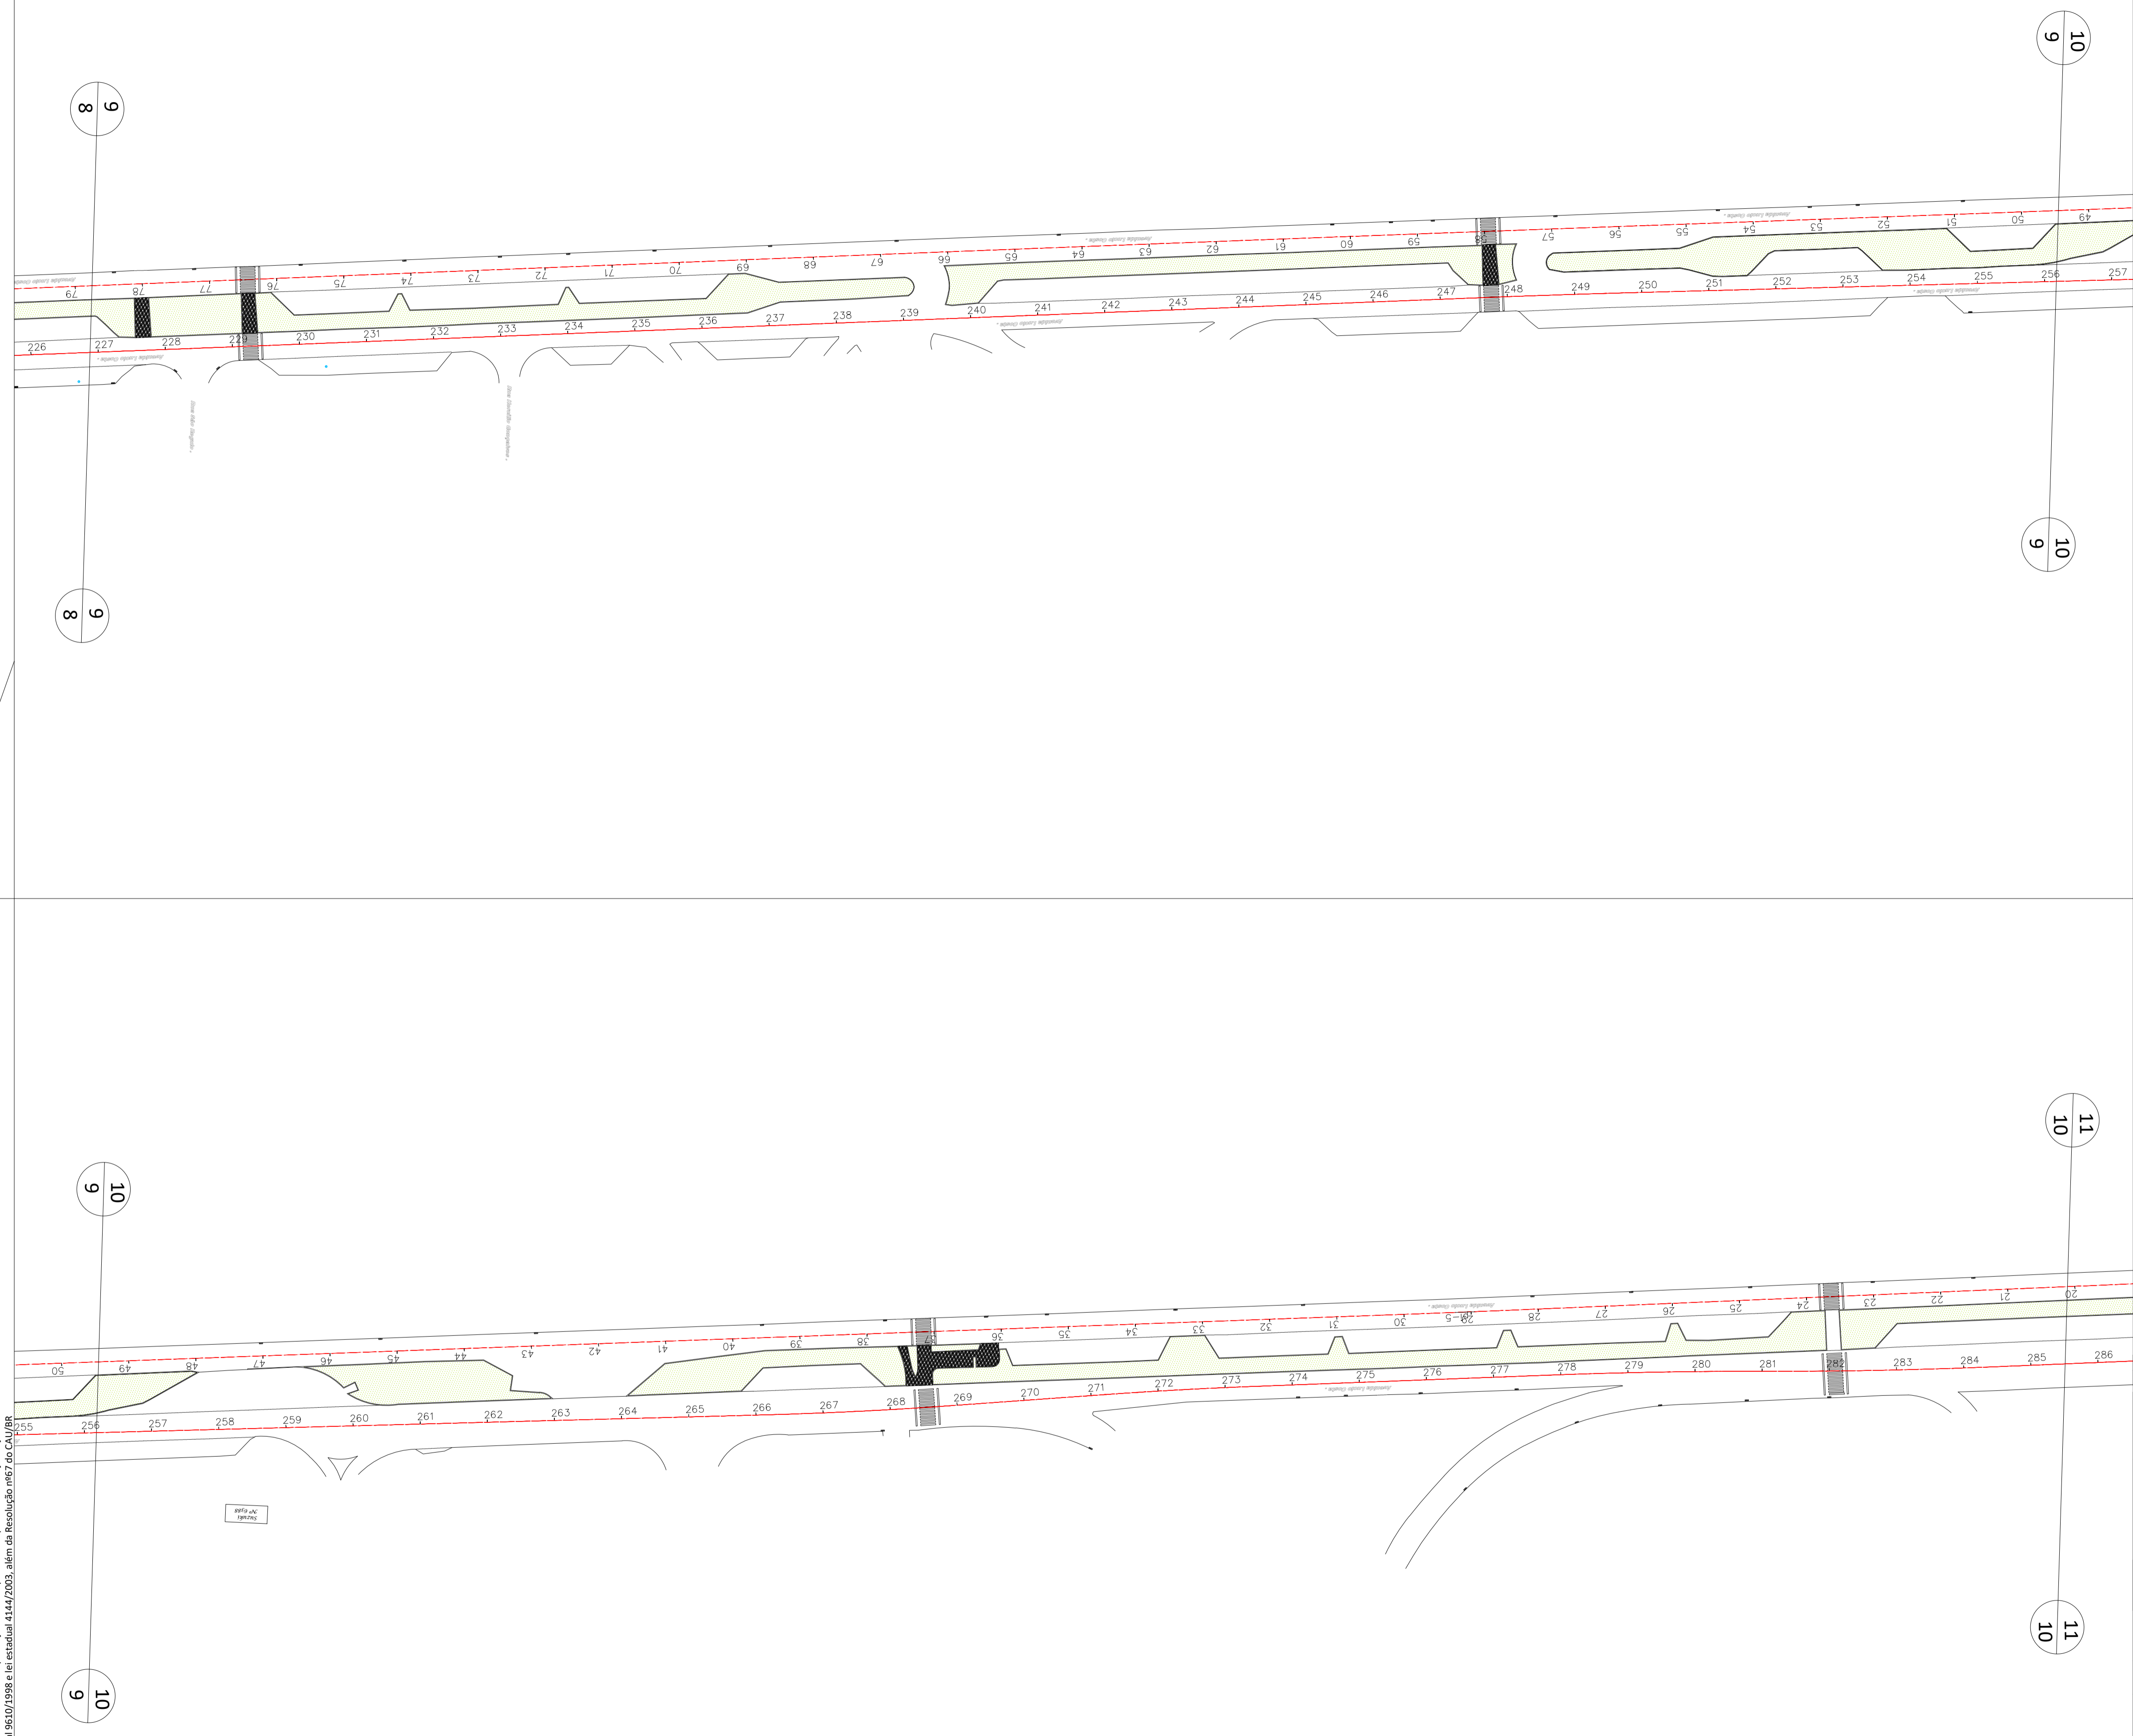

LOCAL:		AV. LUCIO COSTA		
MASSA ASFÁLTICA (BINDER)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	1,51	12.810,94
	9ª MEDIÇÃO	1,51	3,23	15.410,08
<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b>				<b>28.221,02</b>

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	10/10/2020	DPA	Emissão inicial

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA  
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

**Identificação:** 00.211      **Contratante:** SMIHC

**Empreendimento:**  
 PAVIMENTA RIO AP - 4

**Endereço:**  
 ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ



**Setor:**      **Profissionais responsáveis:**  
 Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

**Etapa:** PROJETO EXECUTIVO      **Disciplina:** PAVIMENTAÇÃO URBANA      **Escala:** 1/1000

**Conteúdo da prancha:**  
 APROPRIAÇÃO DE 1ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA      **Nº da Prancha:** 05/06  
**Nome da prancha:** MED-00211-ACB-PE-09-F05-R00

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR



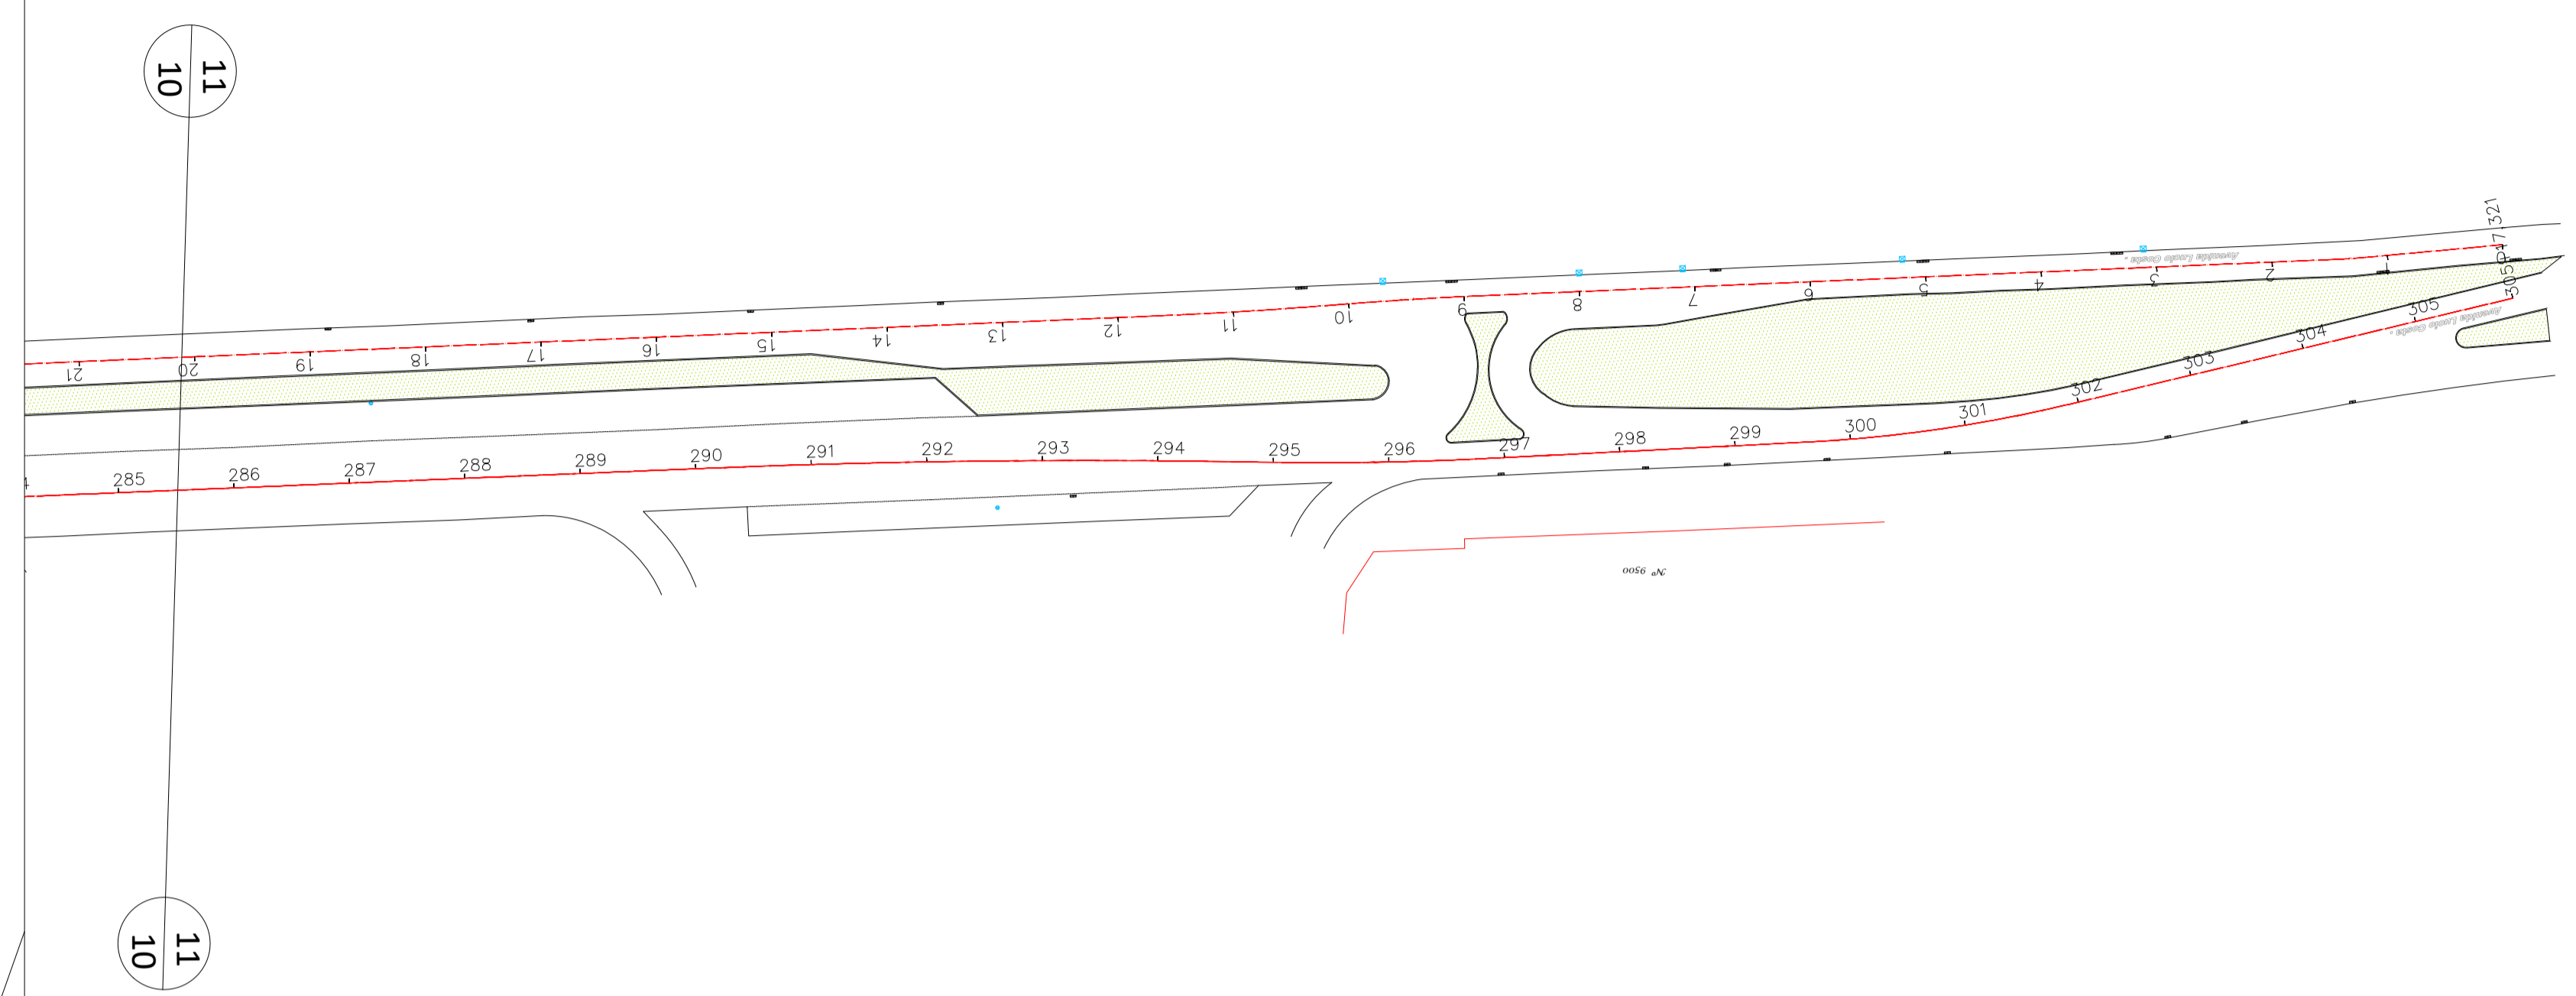

LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
MASSA ASFÁLTICA (BINDER)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	1,51	12.810,94
	9ª MEDIÇÃO	1,51	3,23	15.410,08
<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b>				<b>28.221,02</b>

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial

**Empresa:** Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

**Identificação:** 00.211      **Contratante:** SMIHC

**Empreendimento:** PAVIMENTA RIO AP - 4

**Endereço:** ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

**Setor:**      **Profissionais responsáveis:**  
 Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

**Escala:** 1/1000  
**Conteúdo da prancha:** PAVIMENTAÇÃO URBANA

**Nome da prancha:** APROPRIAÇÃO DE 1ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA  
**Identificação:** MED-00211-ACB-PE-09-F06-R00      **Nº da Prancha:** 06/06

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR.





PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO


# PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO

AV. LUCIO COSTA - 2ª CAMADA



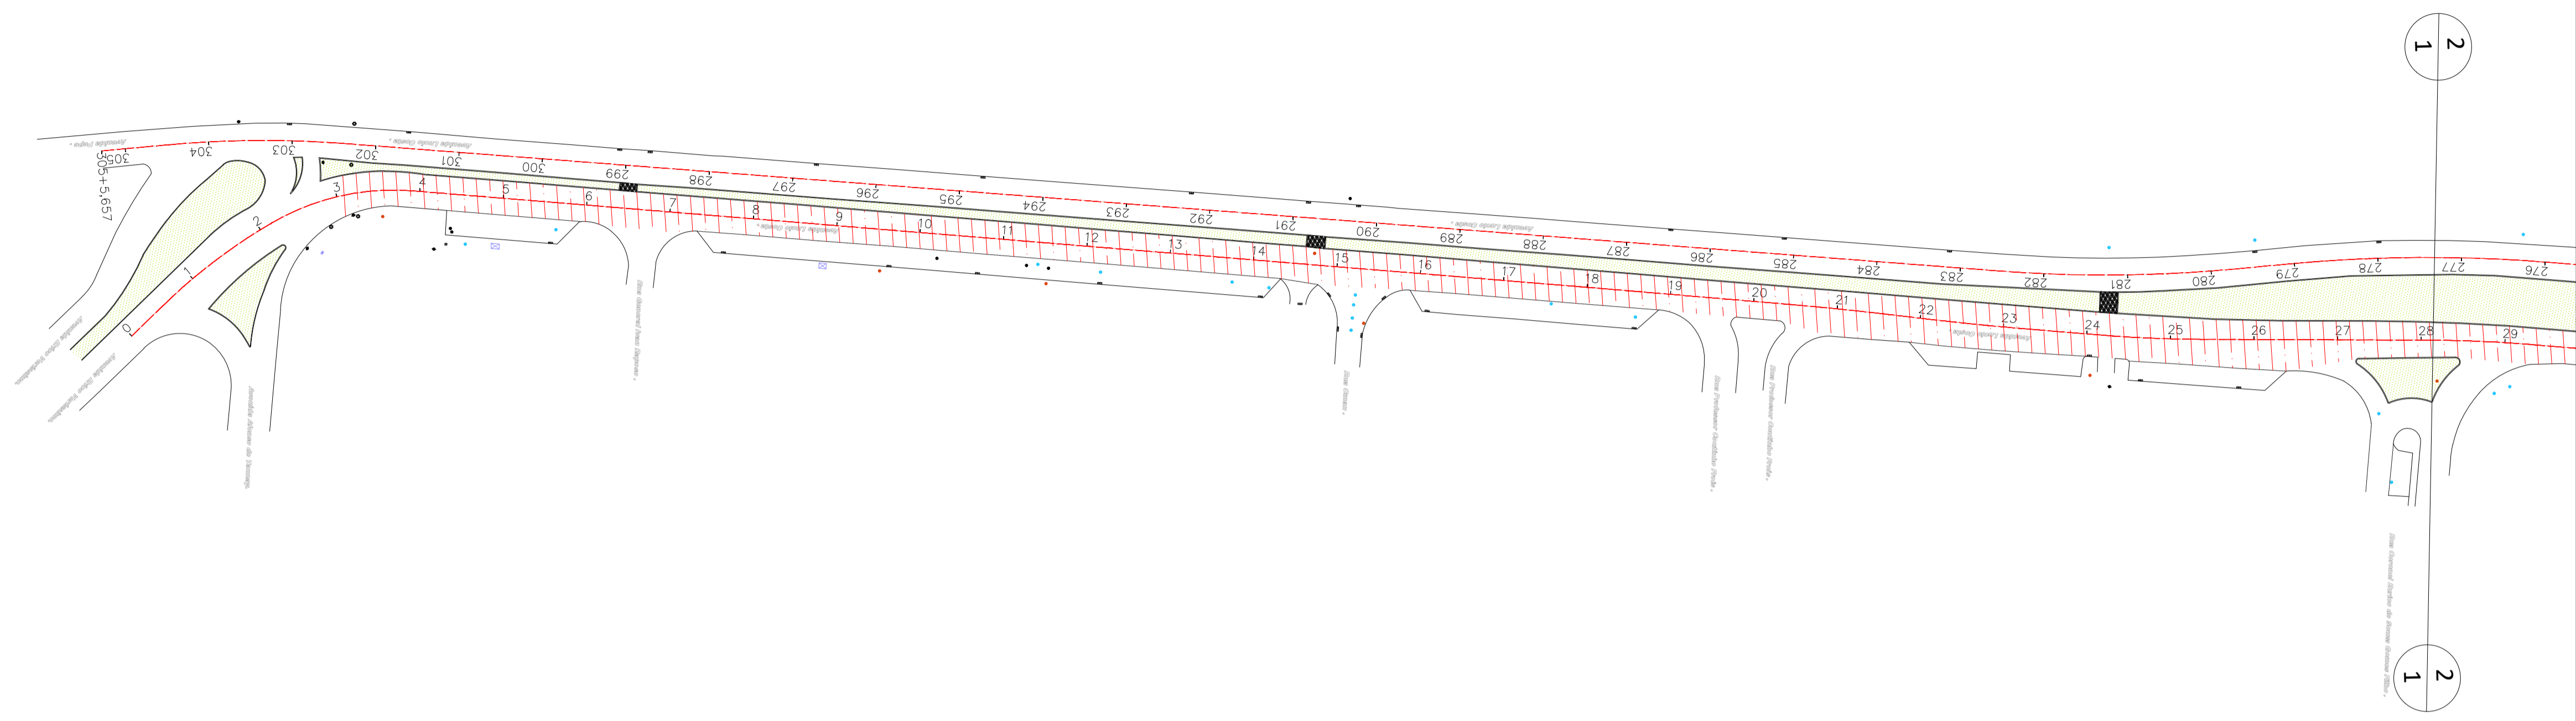

LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
MASSA ASFÁLTICA (POLIMERO)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	0,75	6.352,00
	9ª MEDIÇÃO	0,75	2,03	11.782,93
TOTAL ACUMULADO (M2)				18.134,93


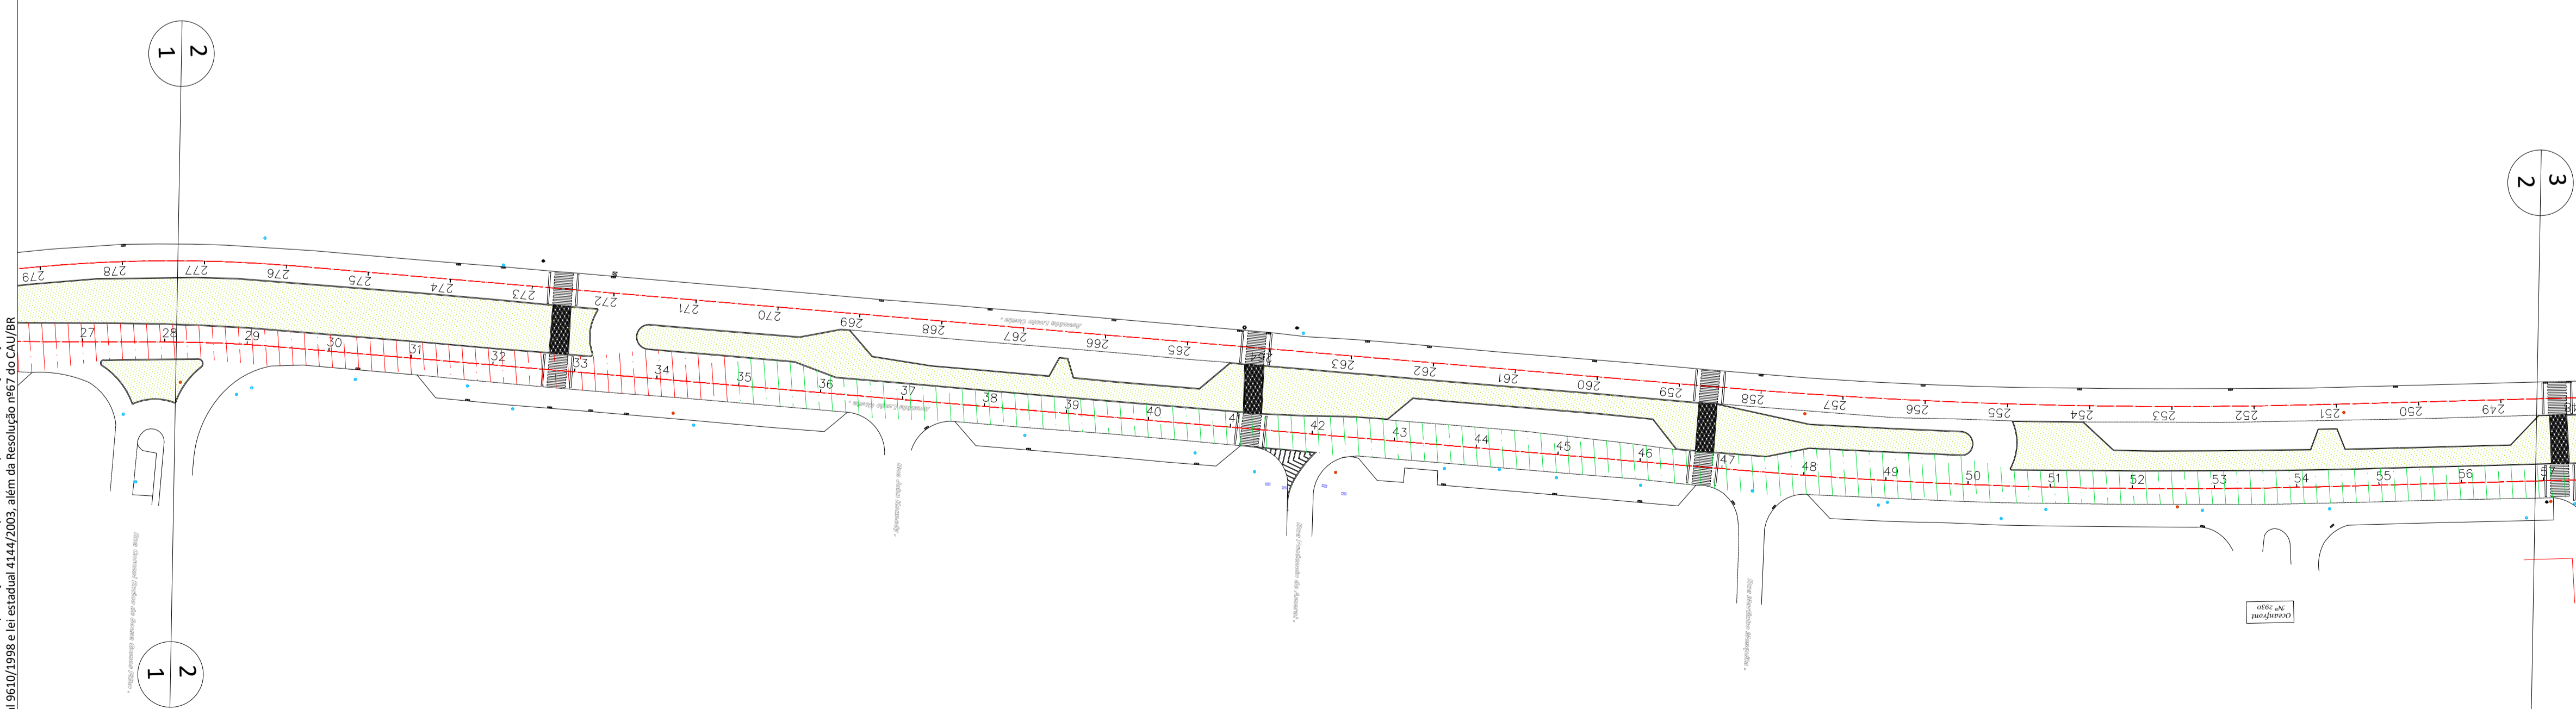


00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa:  Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com				
Certificações:				
Identificação: 00.211		Contratante: SMHC		
Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis: Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Etapa: PROJETO EXECUTIVO		Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA		Escala: 1/1000
Conteúdo da prancha: APROPRIAÇÃO DE 2ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA				Nº da Prancha: 01/06
Nome da prancha: MED-00211-ACP-PE-09-F01-R00				

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR






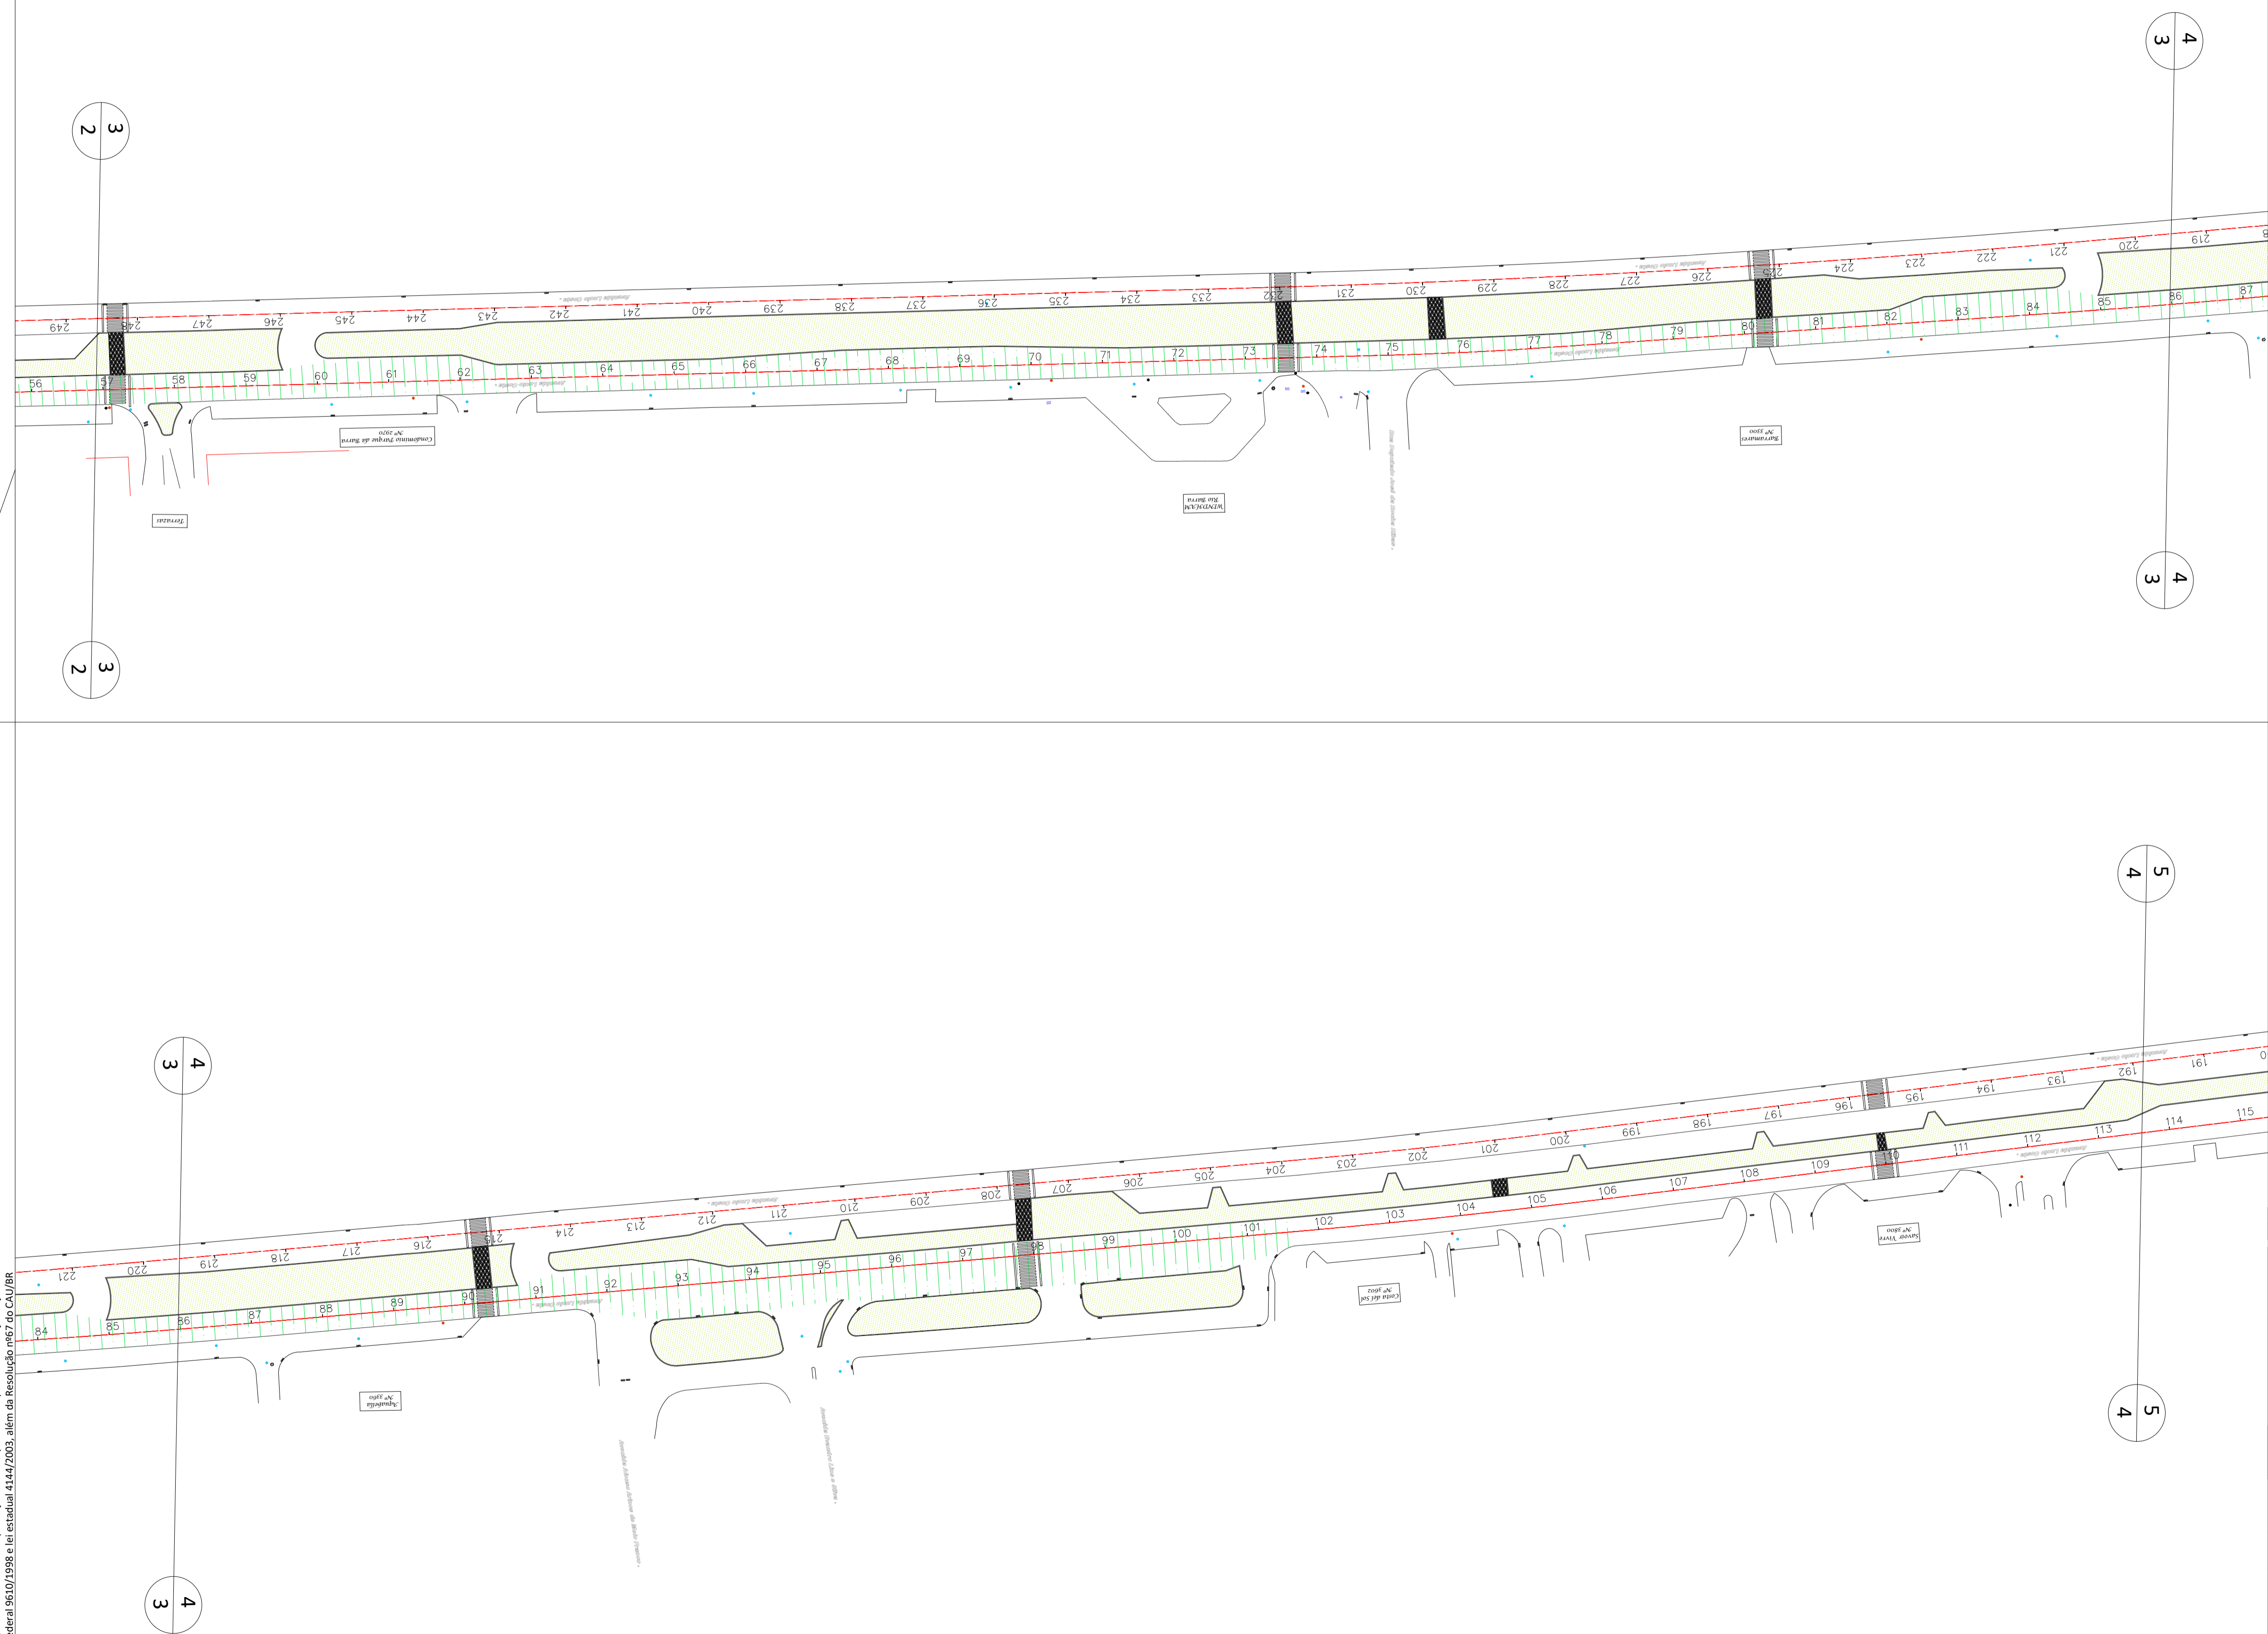


LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
MASSA ASFÁLTICA (POLIMERO)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	0,75	6.352,00
	9ª MEDIÇÃO	0,75	2,03	11.782,93
TOTAL ACUMULADO (M2)				18.134,93

00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa:  NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com				
Certificações:  Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção Nível A				
Identificação:		Contratante:		
00.211		SMIHC		
Empreendimento:				
PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço:				
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis:		
		Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Escala:		Disciplina:		Escala:
1/1000		PAVIMENTAÇÃO URBANA		1/1000
Conteúdo da prancha:				Nº da Prancha:
APROPRIAÇÃO DE 2ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA				02/06
Nome da prancha:				
MED-00211-ACP-PE-09-F02-R00				

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR





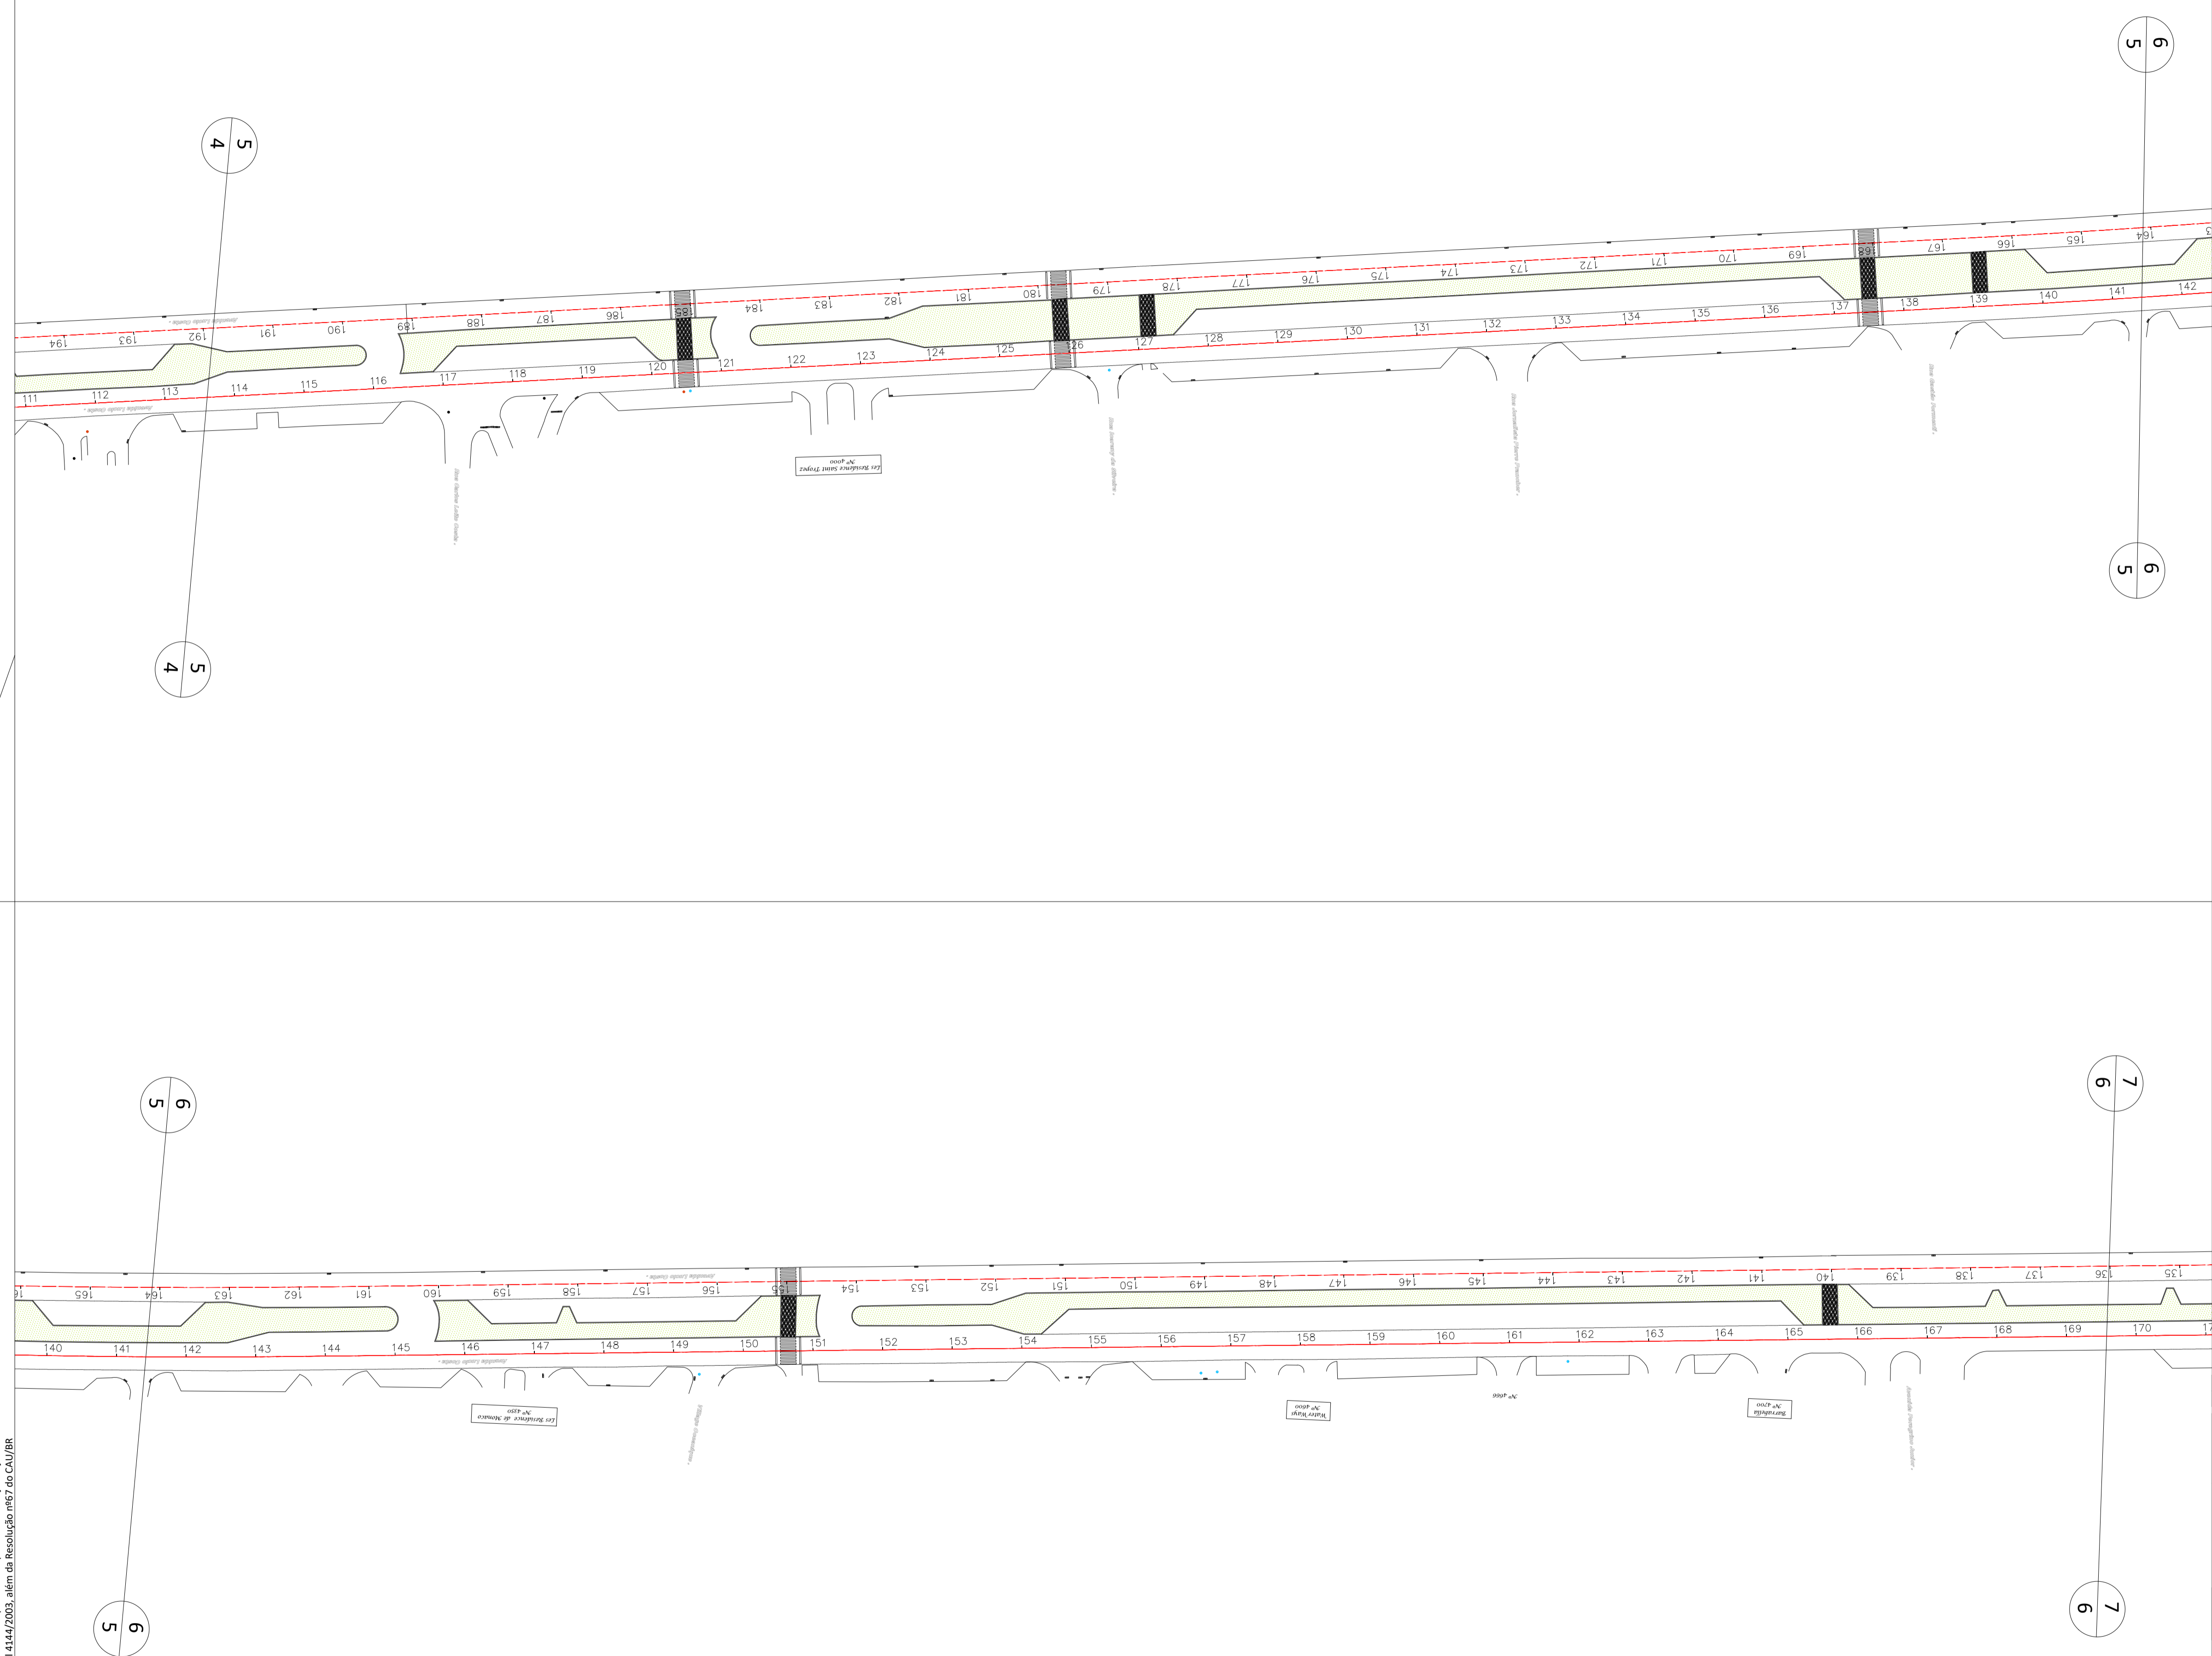


LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
MASSA ASFÁLTICA (POLIMERO)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	0,75	6.352,00
	9ª MEDIÇÃO	0,75	2,03	11.782,93
TOTAL ACUMULADO (M2)				18.134,93

00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa:  Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com				
Certificações:				
Identificação:	Contratante:			
00.211	SMIHC			
Empreendimento:				
PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço:				
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:			Profissionais responsáveis:	
			Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos	
Etapa:	Disciplina:	Escala:		
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/1000		
Conteúdo da prancha:				Nº da Prancha:
APROPRIAÇÃO DE 2ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA				03/06
Nome da prancha:				
MED-00211-ACP-PE-09-F03-R00				

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.




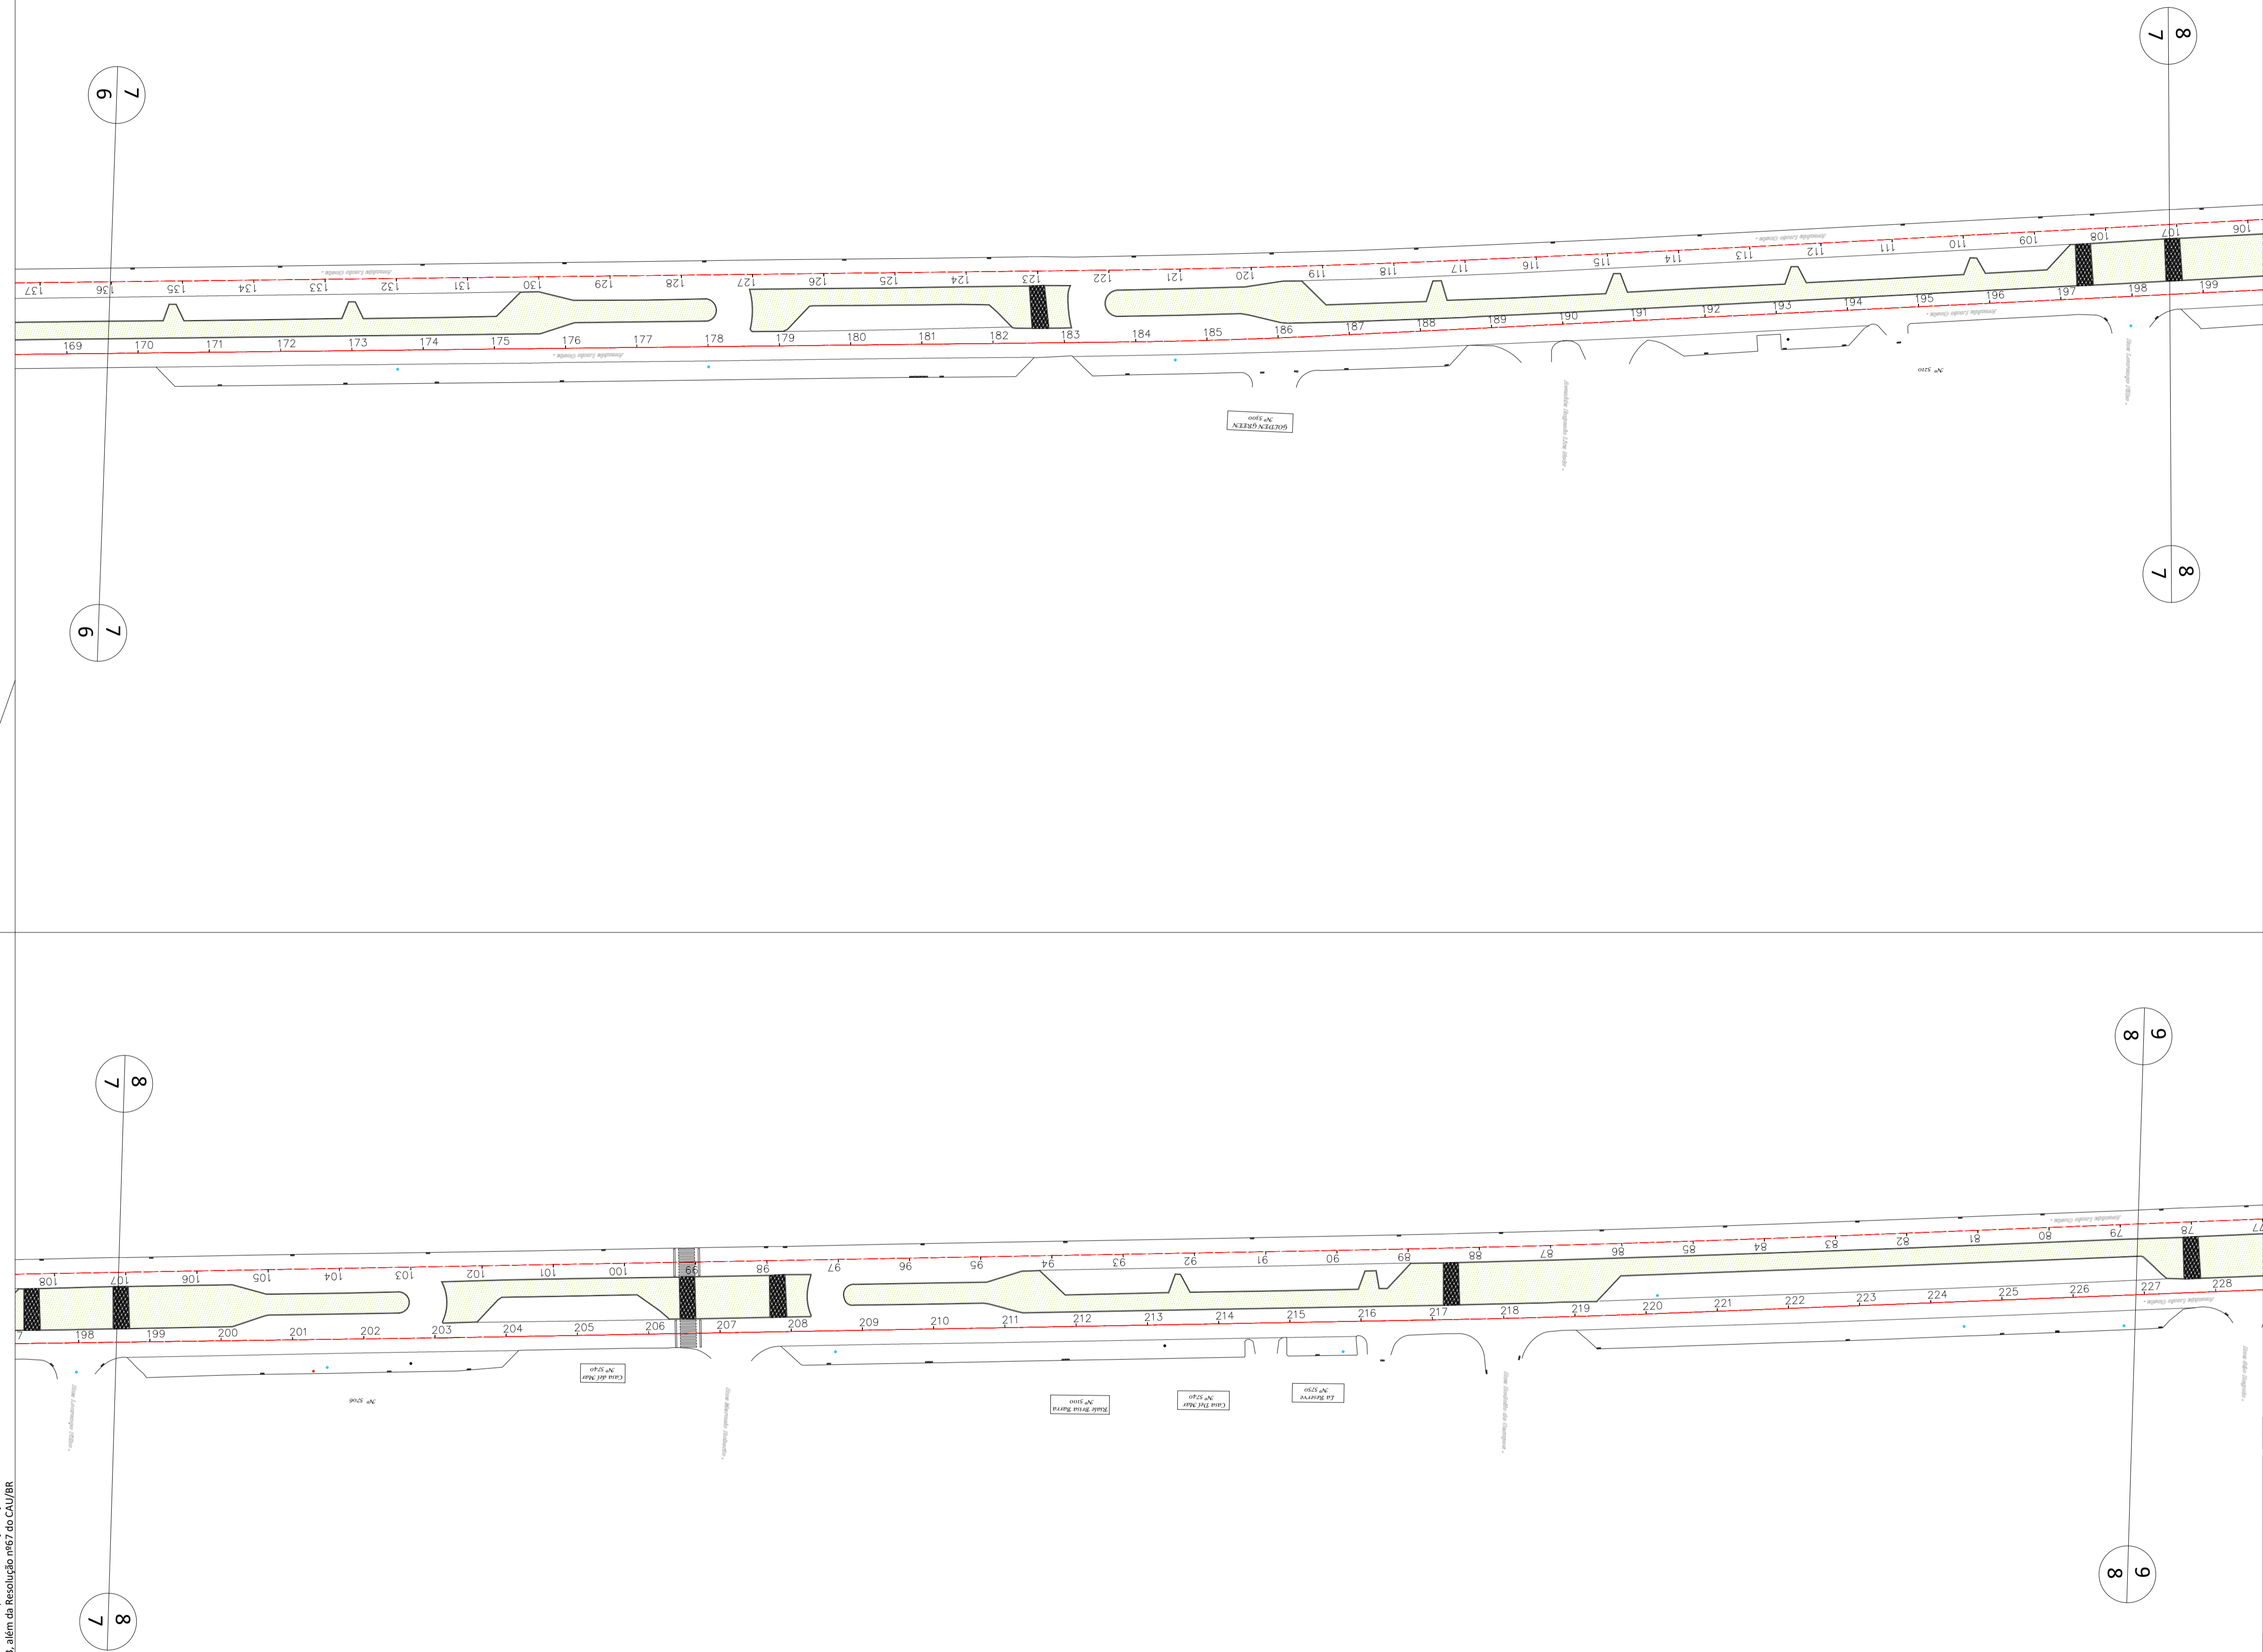


LOCAL:		AV. LUCIO COSTA		
MASSA ASFÁLTICA (POLIMERO)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	0,75	6.352,00
	9ª MEDIÇÃO	0,75	2,03	11.782,93
TOTAL ACUMULADO (M2)				18.134,93

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e lei estadual 4144/2009, além da Resolução nº67 do CAU/BR.

00	10/10/2020	DPA	Emissão inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa:		Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com		
Certificações:                                  Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção                                    Nível A				
Identificação:		Contratante:		
00.211		SMIHC		
Empreendimento:				
PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço:				
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis:		
		Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Escala:		Disciplina:		Escala:
1/1000		PAVIMENTAÇÃO URBANA		1/1000
Conteúdo da prancha:				Nº da Prancha:
APROPRIAÇÃO DE 2ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA				04/06
Nome da prancha:				
MED-00211-ACP-PE-09-F04-R00				



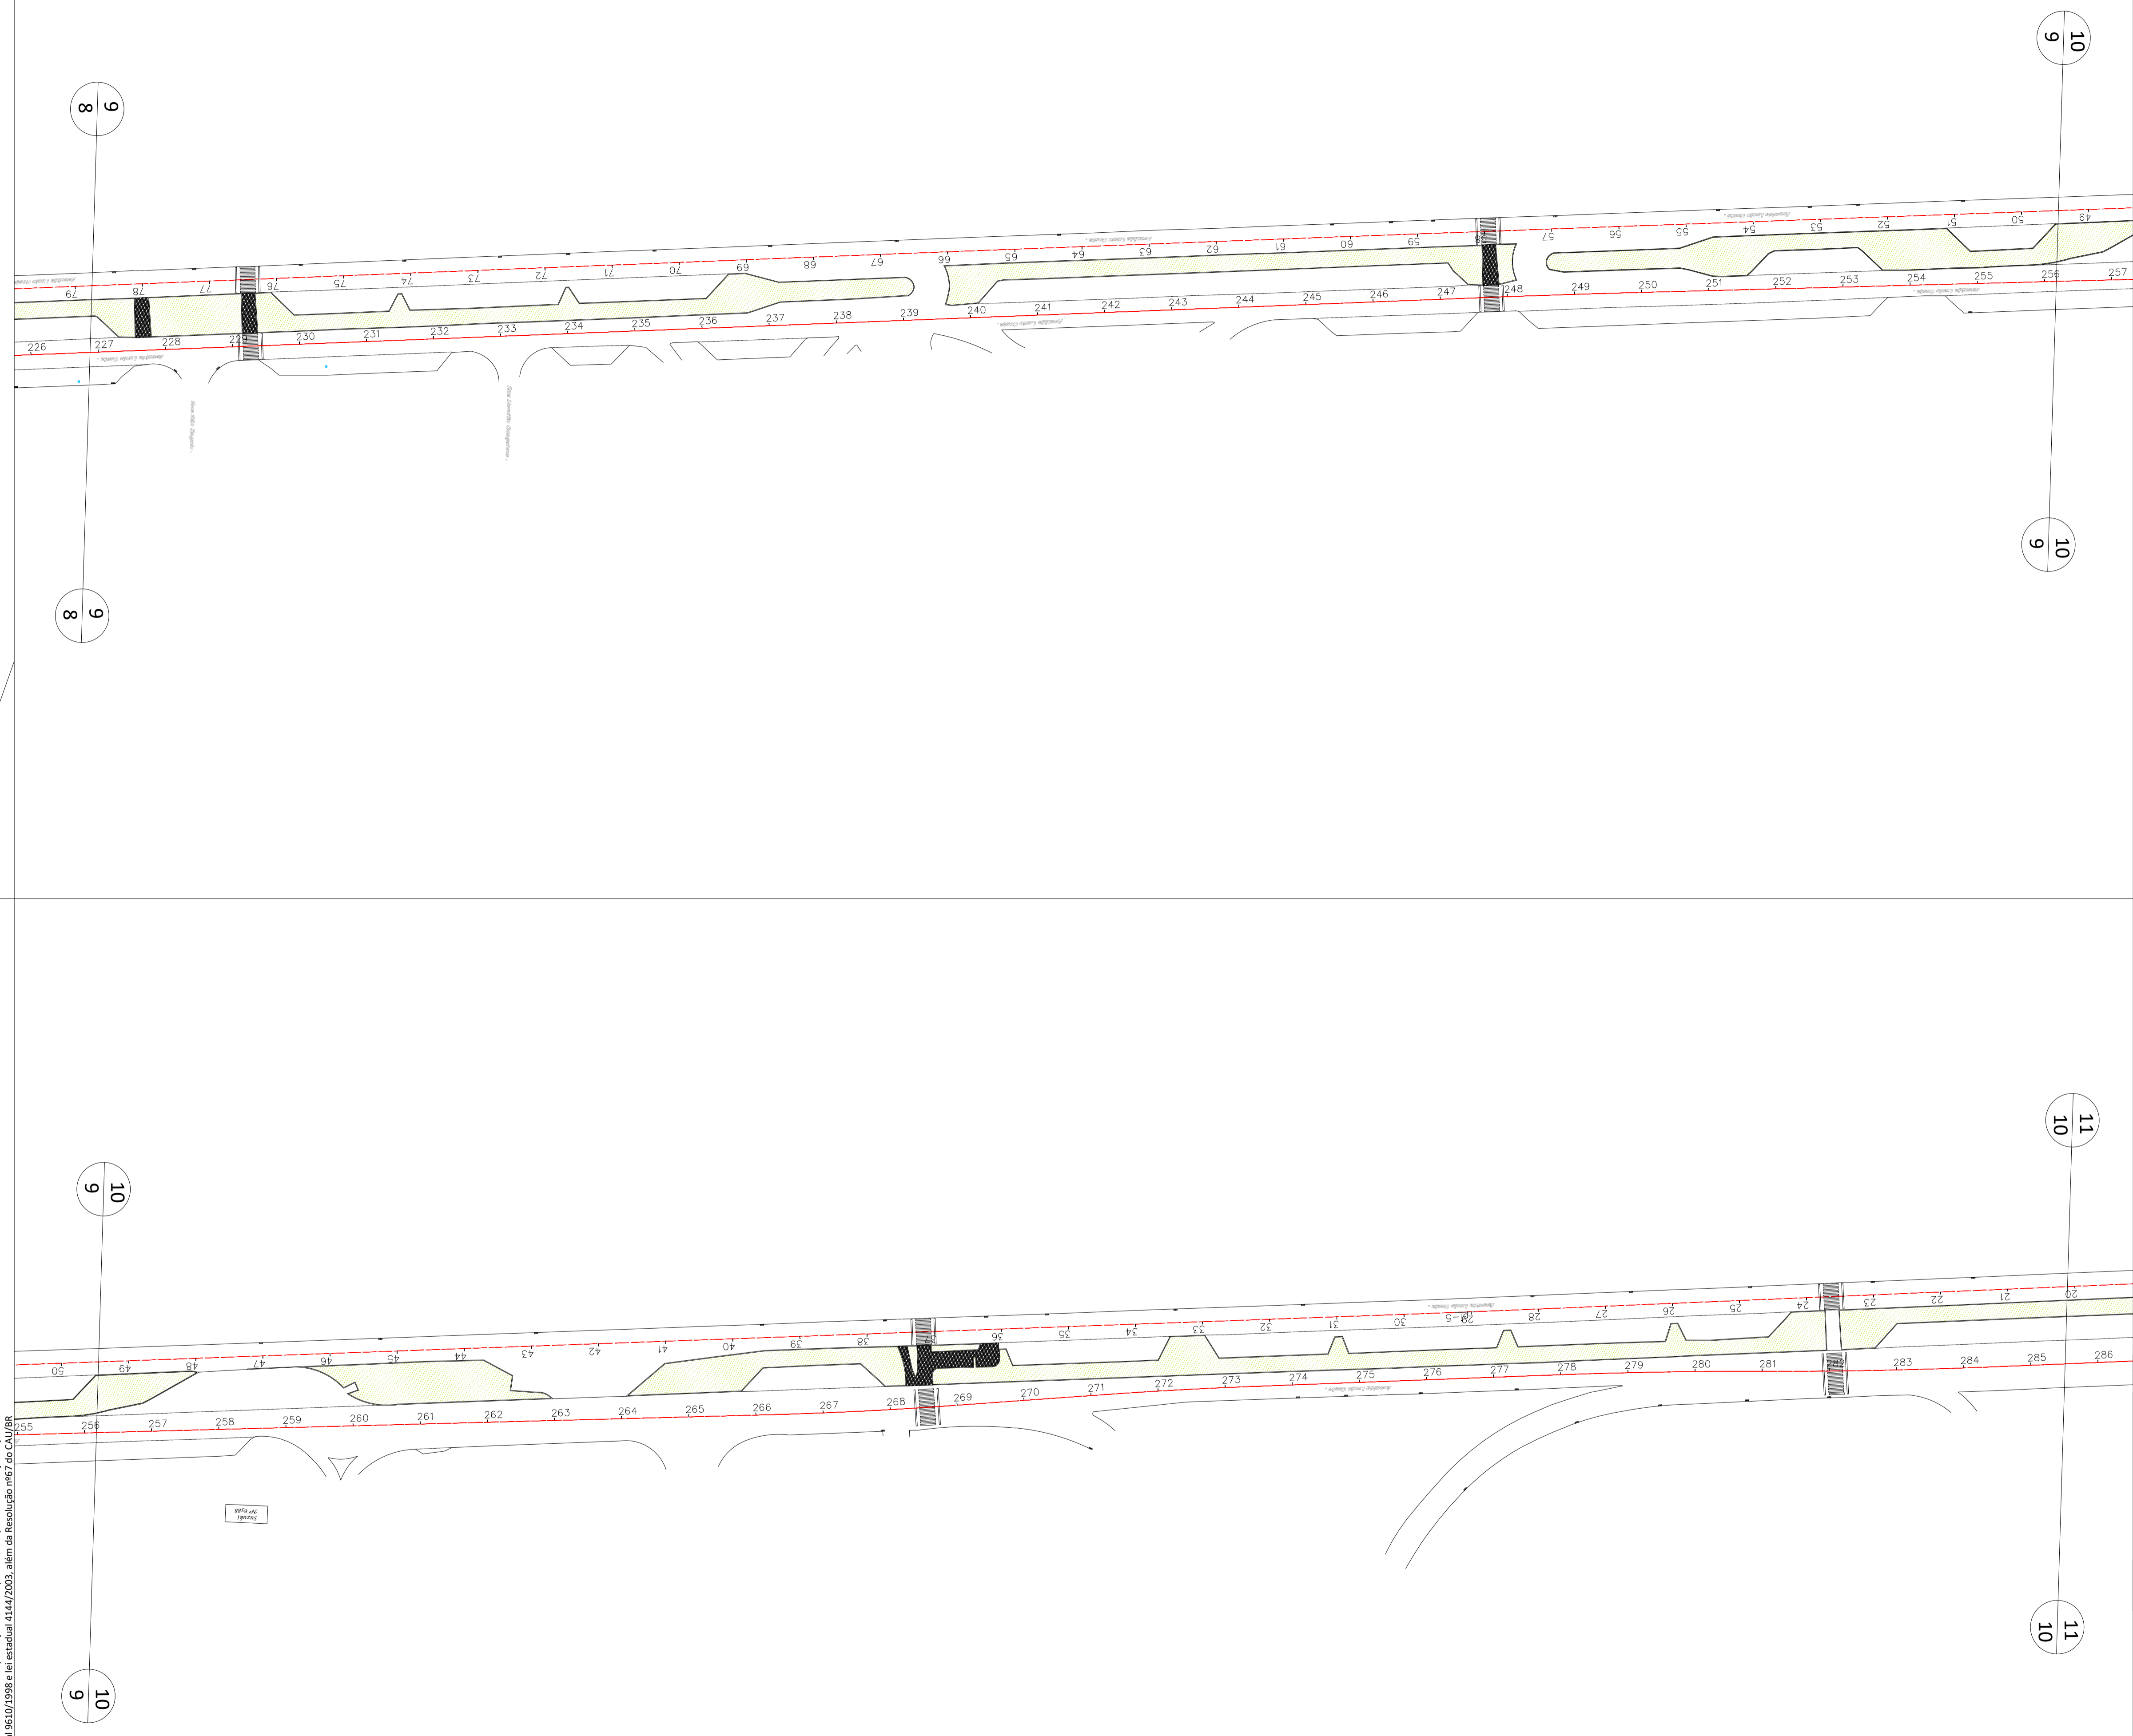

LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
MASSA ASFÁLTICA (POLIMERO)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	0,75	6.352,00
	9ª MEDIÇÃO	0,75	2,03	11.782,93
TOTAL ACUMULADO (M2)				18.134,93

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR.

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	10/10/2020	DPA	Emissão inicial

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA  
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

**Identificação:** 00.211      **Contratante:** SMHIC

**Empreendimento:** PAVIMENTA RIO AP - 4


**Endereço:** ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

**Setor:**      **Profissionais responsáveis:**  
 Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

**Etapa:** PROJETO EXECUTIVO      **Disciplina:** PAVIMENTAÇÃO URBANA      **Escala:** 1/1000

**Conteúdo da prancha:** APROPRIAÇÃO DE 2ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA      **Nº da Prancha:** 05/06  
**Nome da prancha:** MED-00211-ACP-PE-09-F05-R00



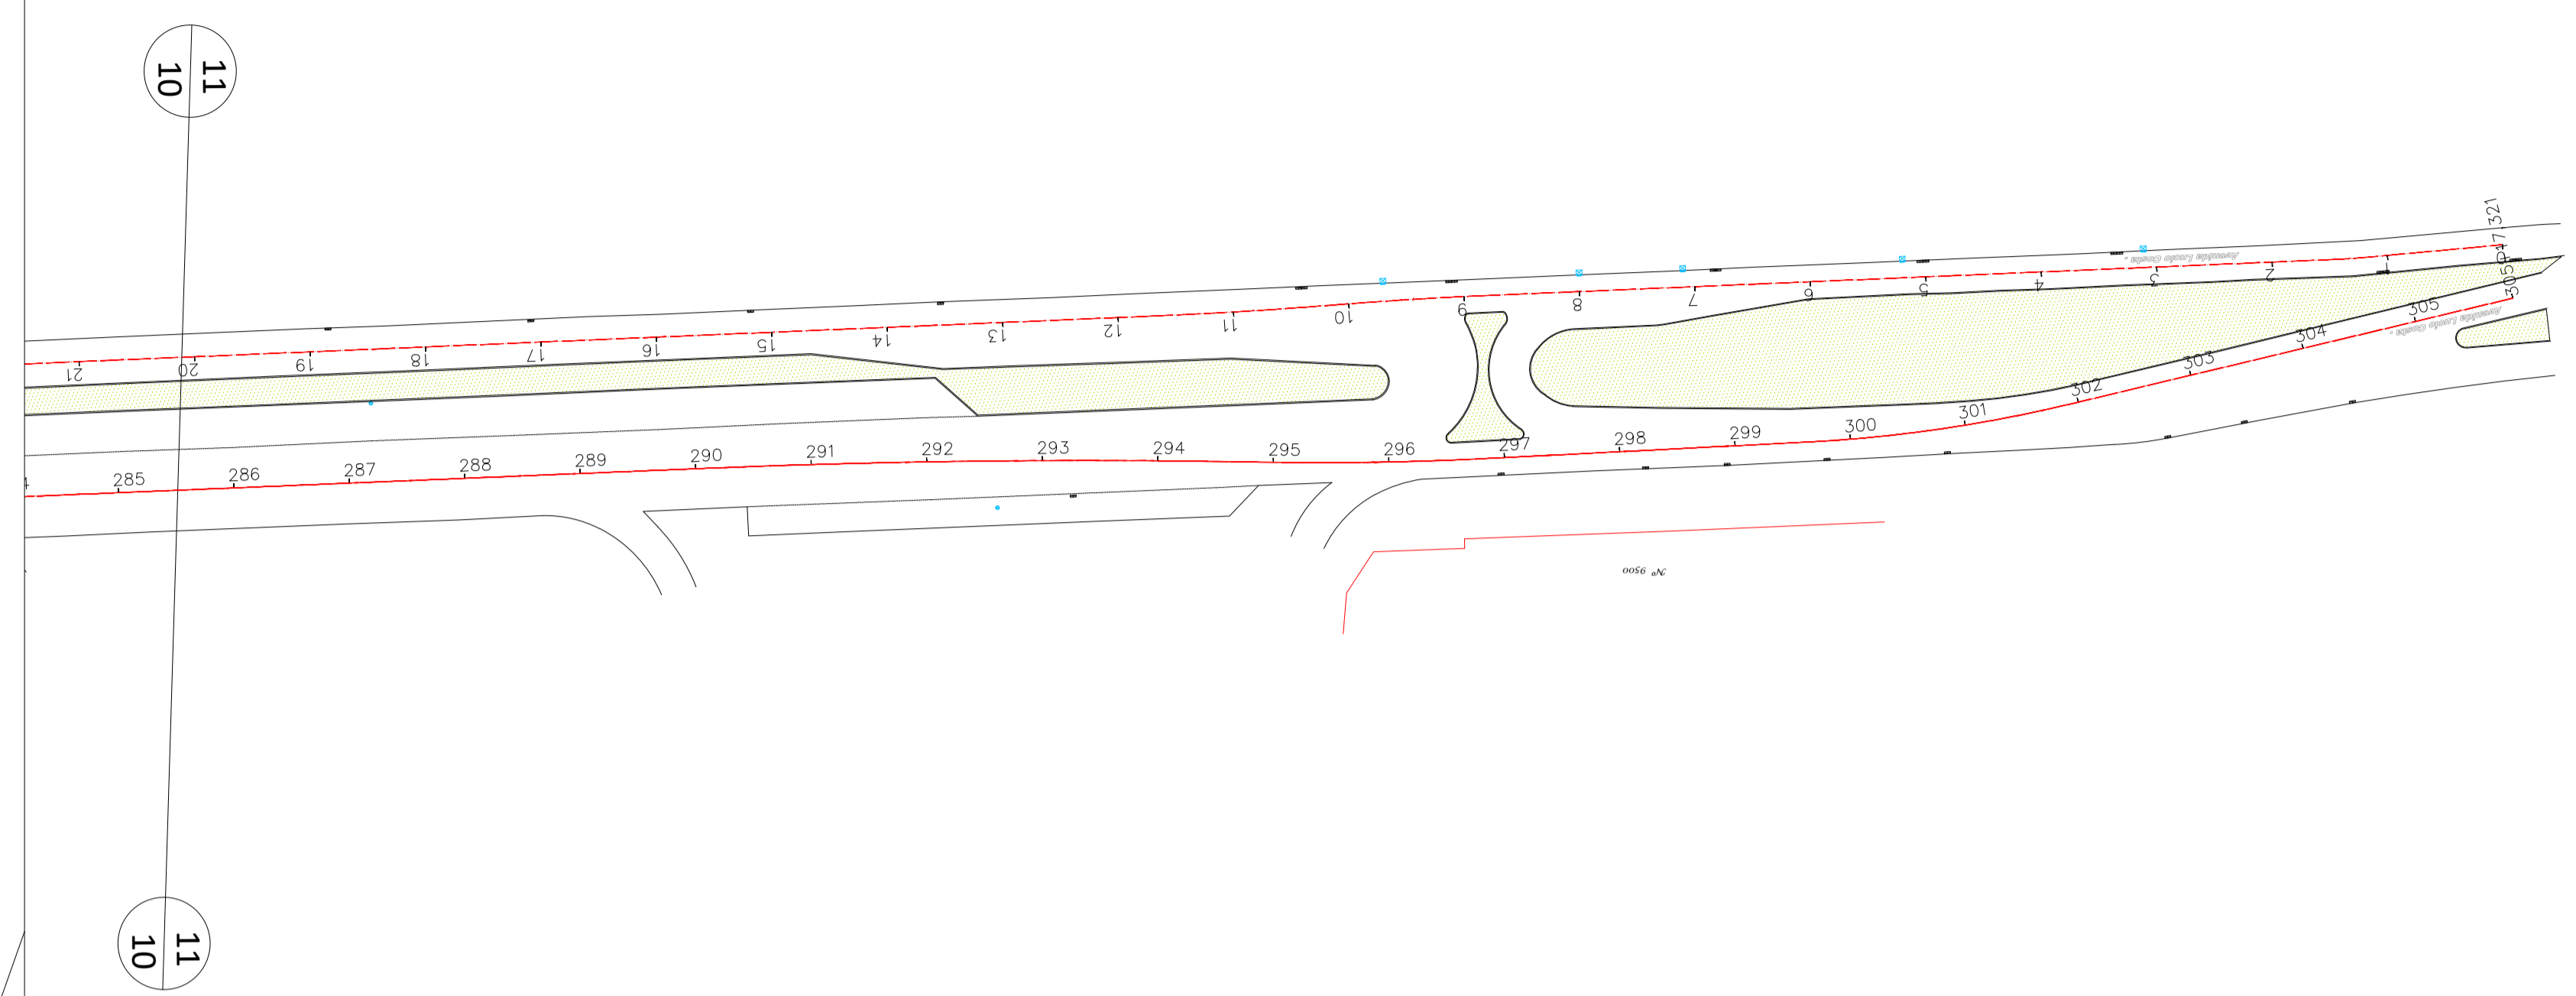

LOCAL:	AV. LUCIO COSTA			
MASSA ASFÁLTICA (POLIMERO)				
LEGENDA	MEDIÇÃO	INICIO (KM)	FINAL (KM)	ÁREA (M2)
	8ª MEDIÇÃO	-	0,75	6.352,00
	9ª MEDIÇÃO	0,75	2,03	11.782,93
<b>TOTAL ACUMULADO (M2)</b>				<b>18.134,93</b>

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	10/10/2020	DPA	Emissão Inicial

**Empresa:** Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002  
 Tel.: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

**Certificações:**

**Identificação:** 00.211      **Contratante:** SMIHC

**Empreendimento:** PAVIMENTA RIO AP - 4

**Endereço:** ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

**Setor:**      **Profissionais responsáveis:**  
 Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

**Escala:** 1/1000  
**Conteúdo da prancha:** PAVIMENTAÇÃO URBANA

**Nome da prancha:** APROPRIAÇÃO DE 2ª CAMADA - AVENIDA LUCIO COSTA  
**Nº da Prancha:** 06/06  
**Nome da prancha:** MED-00211-ACP-PE-09-F06-R00

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR.



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. –  
PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.

PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

SERVIÇOS REFERENTE A 09ª MEDIÇÃO 06ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/09/2020 A 09/10/2020

NOME	FUNÇÃO
Adauto Leal da Silva	Motorista de Caminhão I
Adauto Leal da Silva Junior	Motorista de Caminhão I
Adenilson Silva Reis Candido	Servente
Adjailton Alves da Silva	Servente
Adjailton Alves da Silva	Vigia
Adriano Oliveira da Silva	Motorista de Caminhão I
Airton Goncalves dos Santos	Encarregado Administrativo III
Alecio Guimaraes	Estagiário
Alexandre da Conceicao Marques	Servente
Alexandre Nobrega do Vale	Servente
Alexandre Nobrega do Vale	Vigia
Alexssande Silva Barreto de Freitas	Vigia
Amauri Severino de Menezes	Pedreiro
Antonio Henrique Neto	Servente
Arivaldo Reis Ferreira	Motorista de Caminhão I
Artur Alberto Paula Da Silva	Operador de Rolo Compactador
Bruno de Oliveira Silva	Servente
Bruno Humelino Machado	Operador de Rolo Compactador
Bruno Miranda dos Santos	Operador de Máquinas Pesadas I
Caio Marcio Joia da Silva	Vigia
Carlos Antonio da Fonseca	Pedreiro
Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho	Servente
Carlos Eduardo Santos do Carmo	Operador de Espargidor
Celso Alves da Costa	Operador de Fresadora II
Cristiano Nascimento Da Silva	Motorista de Caminhão I
David Batista Nardoto Carvalho	Laboratorista I
Denis Bezerra da Silva	Apontador
Devayr Pedro Luciano	Vigia
Fabio Henrique Fernandes	Sinaleiro
Fabricio Aurelio da Silva Barros	Pedreiro
Felipe Medeiros Santos Pinhal	Servente
Fernando Jose Azevedo dos Santos	Arquiteto
Filipe Sales da Costa	Servente
Francisco Joaquim Pereira	Encarregado de Pavimentação I
Geroncio de Jesus Cardial	Rastilheiro
Gilberto Augusto Ferro Costa Assumpcao	Engenheiro de Segurança do Trabalho
Givanildo Santos Andrade	Apontador
Glaucio Dias Guimaraes Manco	Servente
Guilherme Dias de Oliveira	Servente
Higor Souza Muniz	Servente
Hugo Ricardo Leite Vieira	Servente
Hurciel de Sousa Barbosa	Operador de Bob Cat
Ivanilza Nunes dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais
Jailson Tomas da Silva	Rastilheiro
Jesus Afonso dos Santos	Servente
João Santos Gonçalves Barbosa	Servente
Jorge Luiz de Barros Tortura	Motorista de Caminhão I
Jose Renato Maia Tavares	Engenheiro Civil
Juarez Almeida Goncalves Junior	Assistente Administrativo I
Julio Cesar dos Santos da Silva	Pedreiro
Julio Cesar Vieira de Paula	Motorista de Caminhão Espargidor
Lohan Antunes Eduardo da Silva	Técnico em Edificações
Luiz Alberto Lemos Correa	Operador de Rolo Compactador
Luiz Claudio Ferrari Campos	Servente
Luiz Henrique Costa da Silva	Servente
Magno Santos da Silva	Operador de Rolo Compactador
Marcelo Reis Luiz	Motorista de Caminhão I
Marcelo Vidal de Negreiros	Pedreiro
Marcio da Silva de Souza	Servente
Marcio Ribeiro Bento	Servente
Marcio Santos	Motorista de Caminhão I



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO


SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. –  
PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.

PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

SERVIÇOS REFERENTE A 09ª MEDIÇÃO 06ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/09/2020 A 09/10/2020

NOME	FUNÇÃO
Marcos Soares do Nascimento	Motorista de Caminhão I
Marcos Vinicius Singello Patrocínio	Auxiliar de Engenharia
Matheus Cordeiro Soares Silva	Servente
Matheus Gomes Mariano	Servente
Osvaldo Manoel Rodrigues Da Silva	Motorista de Caminhão I
Osvaldo Pecanha Sobrinho	Engenheiro Civil
Pedro Ivo Basilio Alves	Técnico em Segurança no Trabalho
Rafael Da Anunciacao Barros	Auxiliar de Engenharia
Rafael das Neves Alves	Servente
Rafael Martins da Silva	Servente
Rafael Romao Rosa	Vigia
Regis Antonio Julio de Souza	Apropriador
Reinaldo Rangel Soares	Vigia
Renato Oliveira de Azevedo Silva	Laboratorista II
Renato Pereira	Operador de Acabadora I
Roberto Carlos de Oliveira	Rastilheiro
Roberto Cordeiro	Encarregado de Pavimentação I
Rodrigo de Oliveira Pinto	Encarregado de Obras II
Rogerio Martins	Motorista de Caminhão I
Romildo Herminio dos Santos	Servente
Ronaldo Alves da Costa	Servente
Samuel Jose Acioli	Encarregado de Obras II
Samuel Marcos Alves	Servente
Sandro Leandro Batista de Mattos	Motorista de Caminhão I
Thiago Lucindo Ferreira	Auxiliar de Laboratório
Valdir dos Santos	Motorista de Caminhão I
Vanderlei das Neves Rogerio	Motorista de Caminhão I
Victor Hugo Marques da Silva	Motorista de Caminhão I
Vinicius Martingil Pereira	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho
Vitoriano Oliveira de Vale	Motorista de Caminhão I
Waldeci Luis Piannta	Servente
Waldeci Luis Piannta	Vigia
Wallace Armando De Campos Pessoa	Motorista de Caminhão I
Wallace Martins Bispo Santos	Motorista de Caminhão I
Wanderson Silva Pinto	Apropriador
Wellington de Souza	Operador de Espargidor
Weverson da Silva Luiz	Vigia
Willians Goncalves Martins	Servente

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CC82935E12544E5C90B46AF4675DCD52	Status: Concluído
Assunto: DocuSign: 00 - Carta Encaminhamento 9a Med -6a Et. Interm.docx, 01.01 capa de fatura.,pdf, 02 -...	
Obra: 211-Pavimenta Rio AP4	
Origem do Envelope:	
Qtde Págs Documento: 247	Assinaturas: 9
Qtde Págs Certificado: 5	Rubrica: 310
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com ID do Envelope: Ativado	Paulo Oliveira
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília	R Sete De Setembro, 98
	Sala 605, Centro
	RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 20050-002
	pauloo@dimensionalengenharia.com
	Endereço IP: 200.201.189.182

## Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Paulo Oliveira	Local: DocuSign
28/10/2020 16:28:07	pauloo@dimensionalengenharia.com	

## Eventos de Signatários

Edson Macedo  
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Enviado: 28/10/2020 17:05:25  
Visualizado: 28/10/2020 17:08:05  
Assinado: 28/10/2020 17:09:32

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 200.201.189.182

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/10/2020 17:08:05  
ID: df046290-d53b-47e2-b715-88f8a4f737f6

Fabio Trigo  
fabiot@dimensionalengenharia.com  
Advogado

Enviado: 28/10/2020 17:09:59  
Visualizado: 28/10/2020 17:11:55  
Assinado: 28/10/2020 17:12:25

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
Usando endereço IP: 200.179.23.39

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/12/2019 17:41:57  
ID: 014315e1-1a87-41a3-94b7-037c7f201a0e

Fernando Santos  
fernandos@dimensionalengenharia.com  
Dimensional Engenharia Ltda

Enviado: 28/10/2020 17:12:50  
Visualizado: 28/10/2020 17:17:14  
Assinado: 28/10/2020 17:34:45

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
Usando endereço IP: 179.170.158.85


### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/07/2020 15:17:43  
ID: cd1731e4-456d-4d62-9516-6c392dcbebf6



Eventos de Signatários	Assinatura	Data/Hora
Vinicius Benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.201.189.182	Enviado: 28/10/2020 17:35:18 Visualizado: 28/10/2020 17:46:18 Assinado: 28/10/2020 17:49:25
<b>Detalhes do provedor de assinatura:</b> Tipo de assinatura: DS Electronic		
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não disponível através do DocuSign		

Eventos de Signatários Presenciais	Assinatura	Data/Hora
------------------------------------	------------	-----------

Eventos de Editores	Status	Data/Hora
---------------------	--------	-----------

Eventos de Agentes	Status	Data/Hora
--------------------	--------	-----------

Eventos de Destinatários Intermediários	Status	Data/Hora
---	--------	-----------

Eventos de entrega certificados	Status	Data/Hora
---------------------------------	--------	-----------

Eventos de cópia	Status	Data/Hora
------------------	--------	-----------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Data/Hora
-------------------------	------------	-----------

Eventos do tabelião	Assinatura	Data/Hora
---------------------	------------	-----------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28/10/2020 17:05:25
Entrega certificada	Segurança verificada	28/10/2020 17:46:18
Assinatura concluída	Segurança verificada	28/10/2020 17:49:25
Concluído	Segurança verificada	28/10/2020 17:49:25

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact dimensional:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com)

### **To advise dimensional of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from dimensional**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with dimensional**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.
